




Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 238 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 12 AGO 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:


El Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021; el Informe Técnico N° 570-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de agosto del 2021; el Informe N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de fecha 05 de agosto del 2021; el Acta de Reinicio de Obra, de fecha 28 de junio del 2021; la Resolución Gerencial General Regional N° 145-2021-GRJ/GGR, de fecha 26 de julio del 2021; el Memorando N° 2431-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 04 de agosto del 2021; Carta N° 059-2021-HJBG-RO, de fecha 14 de julio del 2021; Informe N° 020-2021-HJBG-R.O, del mes de julio del 2021; Cuaderno de Obra; Informe Legal N° 298-2021-GRJ/ORAJ, y;

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el Artículo 191 de nuestra Carta Magna en concordancia con el Artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, el Gobierno Regional Junín viene ejecutando la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN", por la modalidad de administración directa con un presupuesto de S/. 2'868,144.40 Soles, con un plazo de ejecución de ciento veinte (120) días calendarios;

Que, el artículo 5.3.5.3 de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, establece que toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución, en los casos siguientes:





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

- Problemas en la efectiva disponibilidad de recursos presupuestales.
- Desabastecimiento de los materiales e insumos requeridos por causas ajenas al proceso de adquisición de la entidad.
- Demoras en la absolución de consultas por modificaciones sustanciales del expediente técnico que afecten el cronograma de ejecución de avance de obra.
- Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, se debe documentar con fotografías, pruebas de campo, etc.
- De autorizarse ampliaciones de plazo se actualizará el cronograma de obra y se sustentará los gastos generales que resulten necesarios.

Que, el artículo 6.5.4 de la mencionada directiva menciona lo siguiente:  
**Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.** El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente las causales y éstas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

- Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.
- Atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad.
- Por caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobados.

Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable), incluir además panel fotográfico.

Que, por otro lado se ha establecido como requisitos para solicitar la ampliación del plazo, los siguientes:

- a) Que las causales estén anotadas en el Cuaderno de Obra dentro del plazo contractual;
- b) Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de Obra. El Supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM;
- c) Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva.





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

Que, estando al Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021, suscrito por el Gerente Regional de Infraestructura, se advierte objetivamente lo siguiente:

## 1. ANÁLISIS:

### 4.1 DE LA SOLICITUD DEL RESIDENTE DE OBRA:

Mediante CARTA N° 059-2021-HJBG-Ro fecha 30 de julio de 2021 que contiene el informe N° 020-2021-HJBG-R.O, el Residente de Obra: ING. Herbert Jorge Bravo Gálvez solicita ampliación de plazo N° 08 por un plazo de 14 días calendarios, señalando lo siguiente:

#### RESPECTO A LA CAUSAL

... (...) Se realizó la paralización de la obra mediante el causal descrito en el asiento N° 242 del cuaderno de obra N° 3, en el folio 53, teniendo como circunstancias a la **falta de contratación del servicio de colocación de concreto que afecten la ruta crítica del cronograma de obra por modificaciones al expediente técnico aprobada** en ese sentido se efectúa el **REINICIO DE OBRA** con fecha 20 de julio del 2021 en vista que se cuenta subsanado la causal mediante orden de servicio 3457, contratación del servicio de construcción de muro de contención cunetas y otros aprobado la paralización de obra con RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 145-2021-GRJ-JUNIN/GGR, siendo desde el 20/06/20 21 hasta el 19 /07/2021.

... (...)

El plazo solicitado se contabiliza de la siguiente manera:

PARALIZACIÓN DE OBRA	FECHA DE REINICIO DE OBRA	TIEMPO AFECTADO
Desde el mismo 28 de junio del 2021	20 de julio de 2021	Del 28 de junio de 2021 al 11 de julio de 2021
TOTAL		14 DÍAS CALENDARIOS

Se tiene el siguiente cronograma a la afectación en la ruta crítica:

**CRONOGRAMA CONTRACTUAL:** **Afecta a la ruta crítica** en obras de concreto para la ejecución de obra, teniendo como resistencia de 175 y 210, para el **ADICIONAL N° 01, MAYORES METRADOS Y NUEVAS PARTIDAS:** **afecta a todo el cronograma del adicional, se tiene el cronograma donde afecta y una línea de tiempo para visualizar la afectación del cronograma si no se paralizaba la obra.**

... (...)

Así mismo argumenta y concluye lo siguiente:

(...)

Se solicita la ampliación de plazo N° 08, por 14 días calendarios en conformidad con la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN. – VI. Disposiciones específicas. – 6.5. presentación de informes durante la ejecución de obra. – 6.5.4. Otros Informes Eventuales. -

- Informes Sustentatorios de Ampliación de Plazo N° 08. – El plazo pactado solo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente, las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

... (...)

#### **Por atrasos o paralizaciones de obra ajenas a la voluntad del ejecutor.**

Del mismo modo mencionar que se cumple con:

- o Que la causal modifique el calendario valorizado vigente de avance de obra y que afecten la ruta crítica de obra. El supervisor o Inspector deberá presentar un informe detallado de cómo afecta la ruta crítica del Diagrama PERT-CPM.
- o Deberá estar acompañado de los documentos sustentatorios y ser presentado oportunamente, de acuerdo a los plazos de la presente directiva



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

#### CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 08, por la causal a la falta de contratación del servicio de colocación de concreto, para la conformación y/o ejecución de partidas que son de componentes de concreto, que afectan la ruta crítica, por un plazo de ejecución de 14 días calendarios a partir del 20 de julio del 2021 al 02 de agosto del 2021 por la afectación del cronograma valorizado y del cronograma de ejecución de obra y existiendo partidas afectadas por la falta de material e insumo para los trabajos de ejecución de las partidas (desabastecimiento de material y/o bien), y a la fecha se tiene los desfases en la ejecución de la obra adicional de obra N° 01, mayores metrados y nuevas partidas.
- Así mismo, se solicita la aprobación y formalización de la ampliación de plazo N° 08, mediante resolución de acuerdo a la directiva N° 05-2009-GR-JUNIN.

....(....)

#### 4.2 DE LA REVISIÓN, EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DEL INSPECTOR

En atención al MEMORANDO N° 2431-2021-GRJ/GRI/SGSLO y la Carta N° 059-2021-HJBG-RO, el Inspector de Obra remite el Informe N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de fecha 05 de agosto de 2021, señalando lo siguiente:

....(....)

Como es de conocimiento la obra tuvo una paralización del plazo de ejecución el día 28 de junio del 2021, por la causal como caso fortuito o de fuerza mayor, se debe a la ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto masivo en pavimento rígido.

El día **20 de julio del 2021** se reinicia la ejecución de la obra, debido a la orden de servicio N° 3457, se realiza la contratación de servicio de Construcción de Muro de Contención (el mismo que comprende la reparación y colocación de concreto), es así que se tiene **paralizado 22 días calendarios**, de acuerdo a la siguiente línea de tiempo:



Así mismo se tienen las siguientes partidas afectadas que debieron de ser ejecutadas desde el 28 de junio 2021 hasta el 11 de julio del 2021 de acuerdo al cronograma de ejecución de obra aprobado y la afectación de ruta crítica:






Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

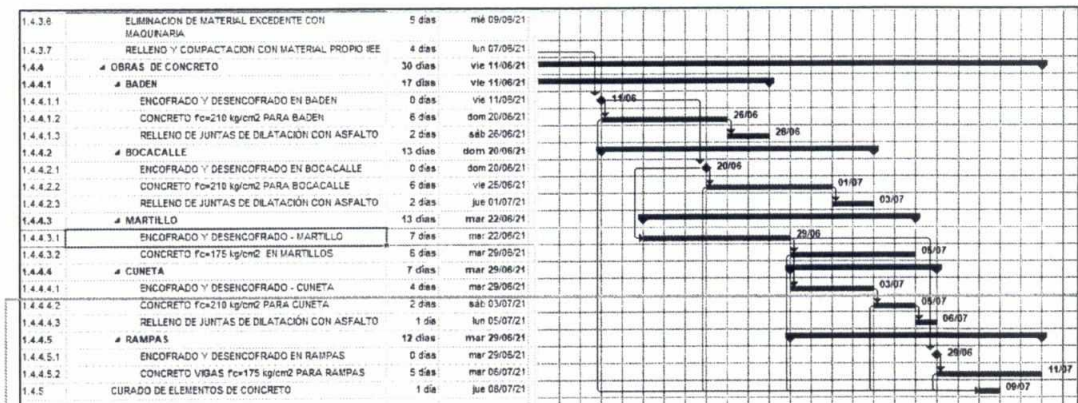

Entre las partidas afectadas por la falta de contratación de Reparación y colocación de concreto se tiene lo siguiente:

#### LAS PARTIDAS DEL ADICIONAL DE OBRA:

- BADEN, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2
- BOCACALLES, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2
- MARTILLOS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2
- CUNETAS, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2
- RAMPAS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2

La inspección realiza la evaluación de la Ampliación de Plazo N° 08 por 22 días calendarios, contabilizado de la siguiente manera:

PARALIZACIÓN DE OBRA	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA	FECHA DE REINICIO DE OBRA	TIEMPO AFECTADO
28 de junio del 2021	11 de julio del 2021	20 de julio de 2021	Del 28 de junio de 2021 al 20 de julio de 2021
TOTAL			22 DÍAS CALENDARIOS

Esta inspección de obra ha realizado la evaluación de los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica del cronograma vigente, encontrando que se produce afectación a la ruta crítica de la obra a partir del **28 de junio del 2021 hasta el día 20 de julio del 2021**, que debido a la **paralización de obra debido a la causal de caso fortuito o de fuerza mayor, se debe a la ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto**, suscitada el día 28 de junio del 2021, la cual está en mérito a la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN** ("NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN"), en el ítem 6.5.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO, que dice a la letra:

**6.5.5.5. ACTIVIDADES DE CARÁCTER NO ORDINARIO.** - Subsanación de observaciones paralizaciones y reinicio de trabajos, solicitud de modificaciones al expediente técnico, coordinaciones extraordinarias, por el carácter o tipo de obra.

❖ **PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS.** - El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las siguientes circunstancias, las que deben ser puestas de conocimiento del supervisor o inspector y



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

este luego de evaluar anotaré en el cuaderno de obra y solicitaré el resolutivo por la Resolución Gerencial General Regional.

- Se entiende como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible, fuera del control del Gobierno Regional de Junín y del Residente de Obra que no le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Esta situación podrá deberse a:

- ↓ La ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos o afecten significativamente los rendimientos establecido en el expediente técnico aprobado.



De acuerdo a lo citado en el párrafo anterior, el residente de obra mediante anotación de cuaderno de obra, **asiento N° 242 de fecha 28 de junio del 2021**, quien comunica que en cumplimiento de la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN, se procede a paralizar la obra caso fortuito o de fuerza mayor, se debe a la ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto la que afecta la ruta crítica del cronograma de obra.

Por lo tanto, se tomó conocimiento y se realizó la paralización de obra el día 28 de junio del 2021, por la causal ausencia de insumos y/o materiales por demora de contratación de servicio de preparación y colocación de concreto. Se reinició la obra el día 20 de julio del 2021, con el residente Ing. Herbert Jorge Bravo Gálvez, durante el periodo de paralización se vio afectado el cronograma de ejecución de obra aprobado, teniendo la afectación de la ruta crítica desde el 28 de junio del 2021 al 11 de julio del 2021, al no cumplir con lo programado en la ejecución de la obra.

Dentro de lo analizado, tanto en fundamentos de hecho y de derecho, la Inspección de Obra declara **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 **por 22 días calendarios** a partir del **12 de julio del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021**; por paralización de obra, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas durante el tiempo de paralización de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente.

#### CONCLUSIONES:

El residente de obra solicita la ampliación de plazo debido a causal: Por paralización de obra (paralizada el 28 de junio de 2021) por un plazo de **22 días calendarios** por la **afectación del cronograma valorizado y del cronograma de ejecución de obra y existiendo partidas afectadas por la paralización de obra**, la cual fue por la causal de falta de contratación del servicio de preparación y colocación de concreto, para la conformación y/o ejecución de partidas que son de componente de concreto, que afectan la ruta crítica, y que a la fecha se reinicia los trabajos en Obra en conformidad con el ACTA DE REINICIO DE OBRA de fecha 20 de julio del 2021.

La Inspección de Obra OPINA FAVORABLEMENTE LA APROBACION la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 **por 22 días calendarios** a partir del **12 DE JULIO 2021 hasta el 02 DE AGOSTO 2021**; por paralización de obra, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra y las partidas afectadas durante el tiempo de paralización de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente.

#### 4.3 SOBRE LA EVALUACIÓN Y PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN

Se observa de la solicitud de ampliación de plazo presentada por el residente de obra con Carta N° 059-2021-HJBG-RO, de 30 de julio 2021, contenido en 15 folios, el mismo que fue derivado por el Sub Gerente de obra, a través del Memorando N° 1131-2021-GRJ/GRJ/SGO, de 03 de agosto 2021, donde solicita







Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"


aprobación de la ampliación de plazo N° 08, a consecuencia de la paralización; por lo que, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación a través del MEMORANDO N° 2431-2021-GRJ/GRI/SGSLO, comunica al Inspector de obra dicha solicitud, y en atención al mismo, el inspector remite el Informe N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, de 05 de agosto de 2021, donde concluye; "...**OPINA FAVORABLEMENTE LA APROBACION la solicitud de Ampliación de Plazo N° 08 por 22 días calendarios a partir del 12 DE JULIO 2021 hasta el 02 DE AGOSTO 2021...**"

#### 4.3.1 SOBRE LA CAUSAL

En la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN"** en su ITEM **6.5.4 OTROS INFORMES EVENTUALES, Informes sustentatorios de Ampliación de plazo.** - menciona como una de las causales: **Por Atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor.**

La obra tuvo una paralización del plazo de ejecución el día 28 de junio del 2021, por la causal como caso fortuito o de fuerza mayor, debido a la ausencia de materiales o herramientas de manera que imposibiliten la ejecución de los trabajos, en nuestro caso es la demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto.

El día **20 de julio del 2021** se reinicia la ejecución de la obra, al terminar el evento generador de la paralización, al obtener la orden de servicio N° 3457, es así que se tiene **paralizado 22 días calendarios**, de acuerdo a la siguiente línea de tiempo:

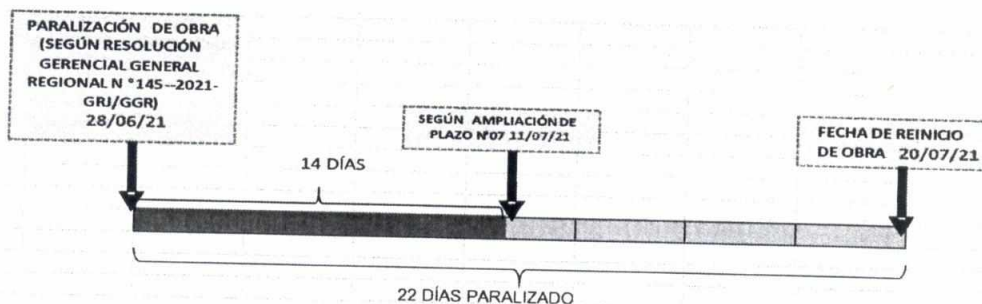

#### 4.3.2. SOBRE LOS REQUISITOS:

##### ANOTACIONES DEL CUADERNO DE OBRA.

##### ACTA DE PARALIZACIÓN DE OBRA

En la oficina de la obra en ejecución ubicado en el Distrito de Coviriali, Provincia de Satipo, siendo las 8:00 horas del día 28 de junio del 2021, los Responsables del Órgano Ejecutor el Ingeniero Herbert Jorge BRAVO GÁLVEZ, y el Inspector de obra, el Ingeniero David Abel ZURITA PUENTE, se encuentran reunidos en el lugar donde se ejecuta la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO -JUNÍN"- IV ETAPA", contando con los que suscriben en líneas abajo, se procedió a tomar los siguientes acuerdos según la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN, "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTIVA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN", según el ítem 6.5.5.5. actividades de carácter no ordinario, PARALIZACIÓN Y REINICIO DE LOS TRABAJOS. El Residente de Obra podrá solicitar la paralización de los trabajos cuando se produzca cualquier de las circunstancias, las que deben ser puestas del conocimiento del Supervisor y/o Inspector de Obra, teniendo **como caso fortuito o de fuerza mayor a una situación extraordinaria e imprevisible, fuera de control del Gobierno Regional de Junín** y del Residente de Obra que le sea atribuible, o que puedan ser atribuibles a hechos naturales. Siendo el caso de la obra en mención la falta de contratación de servicios de preparación y colocación de concreto y otros para el abastecimiento masivo en el pavimento rígido de la obra en ejecución, lo cual afecta a los avances y a la ruta crítica



Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

del cronograma de ejecución, considerando que no se tiene ninguna contratación de preparación y colocación de concreto y otros.

La paralización de obra se inicia desde el 28 de junio del 2021

#### ACTA DE REINICIO DE OBRA


El día de hoy 20 de julio del 2021, a horas 8:00 am, se da reinicio a la ejecución de la obra **MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN** - IV ETAPA, mediante orden de servicio N° 3457, contratación del servicio construcción de muro de contención, cunetas y otros, y según orden de servicio n° 3278, contratación del servicio de residente de obra. Lo cual se notifica al ing. HERBERT JORGE BRAVO GALVEZ, como residente de obra, para llevar la dirección técnica y administrativa según DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR-JUNÍN.

Reunidos por parte del Gobierno Regional el Inspector de obra Ing. David zurita puente, y el residente de obra Ing. HERBERT JORGE BRAVO GALVEZ, suscriben el acta de reinicio. Debido a que en la Resolución gerencial general regional N° 145-2021-G.R.-JUNIN/GGR con fecha 26 de julio 2021, resuelve dar la aprobación de la paralización desde el 28 de junio del 2021 hasta la culminación de eventos que generen esta paralización.

#### AFECTACIÓN DE LA RUTA CRITICA.

Conforme a lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR-JUNÍN "NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN" en su ítem 5.3.5.3 Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución.

En ese sentido, de acuerdo al cronograma de ejecución vigente, se tiene que las únicas partidas que forman parte de la ruta crítica, son las partidas de concreto para Martillos, Cunetas y Rampas, debido a la falta de servicios de preparación y colocación de concreto y otros.

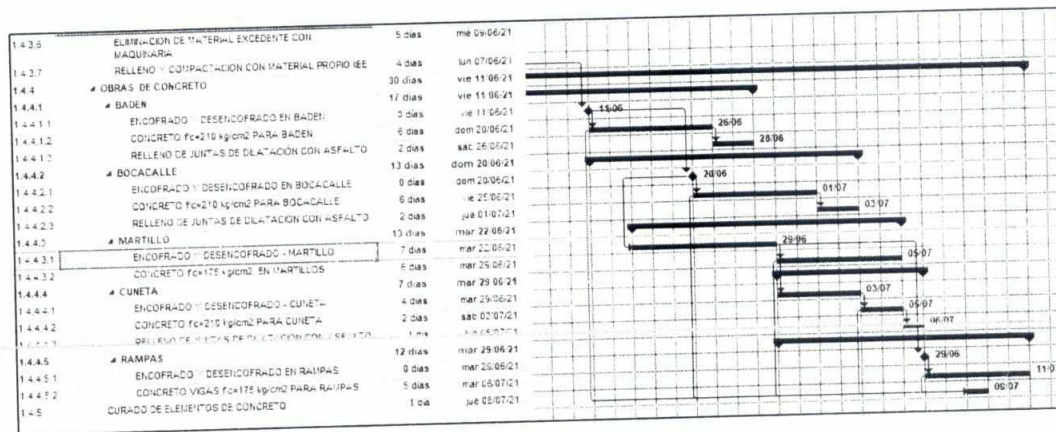

Dichas partidas, se muestran en la imagen anterior en **resaltado y encuadrado**, que se da, por ser consecutivas; quiere decir, tiene que concluir la partida de concreto F'c= 175 kg/cm² para Martillos, para en lo posterior dar inicio con los trabajos de Concreto F'c= 175 kg/cm² para Rampas y finalmente los trabajos de Concreto F'c= 210 kg/cm² para cunetas.

El cuadro siguiente muestra la obtención de los 22 días:





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

PARALIZACION DE OBRA	FECHA DE TERMINO DE OBRA	FECHA DE REINICIO DE OBRA	TIEMPO AFECTADO
28 de junio del 2021	11 de julio del 2021	20 de julio de 2021	Del 28 de junio de 2021 hasta 19 de julio de 2021
TOTAL			22 DÍAS CALENDARIOS

#### SOBRE LA DOCUMENTACIÓN SUSTENTATORIA.

El residente de obra, mediante CARTA N° 059-2021-HJBG-RO, de 30 de julio de 2021, remite la solicitud de ampliación de plazo N° 8, adjuntando la siguiente documentación:

- Copias del cuaderno de obra, donde se evidencia el origen, ocurrencia y termino de la causal de ampliación de plazo.
- Diagrama PERT-CPM de obra en el que se demuestre la afectación de la ruta crítica producida por la causal invocada.
- Memoria descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
- Justificación técnica y legal
- Panel fotográfico (No corresponde, toda vez que estaba paralizado la obra)
- Conclusiones y recomendaciones.
- Otros documentos que ayuden a sustentar el pedido de ampliación.

#### SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUD.

En concordancia con el Ítem 6.5.5 de la Directiva N° 005-2009-GR-Junín, del procedimiento: Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el ejecutor mediante su residente de obra, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Dentro de los quince (15) días naturales de concluido en hecho invocado, el ejecutor solicitará, cuantificará y sustentará la solicitud de ampliación de plazo ante el supervisor o inspector presentado un expediente de ampliación de plazo.

En ese sentido, conforme se analiza de la causal de atrasos o **paralizaciones** ajenos a la voluntad del ejecutor, contabilizado del 28 de junio de 2021 al 20 de julio de 2021, conforme a la directiva establece; el residente contaba con 15 días naturales para la presentación de su solicitud de ampliación de plazo, contados a partir de culminado el hecho generador; en ese sentido; el desabastecimiento culminó el día 20 de julio de 2021, el plazo para presentar la solicitud vencía el 03 de agosto del presente año.

Ahora bien, el residente de obra a través de Carta N° 059-2021-HJBG-RO, de 30 de julio 2021, presenta solicitud de ampliación de plazo y considerando que este tenía como plazo máximo el día 03 de agosto de 2021, esta **SOLICITUD SE PRESENTO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.**

Asimismo, respecto a los plazos para el pronunciamiento de la supervisión, la Sub Gerencia de Obras a través del MEMORANDO N° 1131-2021-GRJ/GRI/SGO de 03 de agosto de 2021 y MEMORANDO N° 2431-2021-GRJ/GRI/SGSLO de 04 de agosto de 2021 de la Sub Gerencia de Supervisión, se remite la solicitud de ampliación al Inspector de obra; el cual conforme al INFORME N° 161-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP de 05 de agosto de 2021; en ese sentido, respecto a los plazos establecidos para su pronunciamiento, la directiva mencionada establece que esta se pronunciará en un plazo máximo de 07 días naturales, este contaba para emitir su pronunciamiento hasta el 06 de agosto de 2021, no obstante, este fue remitido a esta Sub Gerencia el día 05 de agosto de 2021, es decir **EL INFORME FUE PRESENTADO DENTRO DEL PLAZO ESTABLECIDO.**

Por otra parte, respecto a los plazos establecidos para que la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obras eleve su informe emitiendo opinión a la Gerencia Regional de Infraestructura, la Directiva establece que este será realizado dentro de los (3) días naturales de recibido el informe del inspector; en esa lógica este debería ser realizado hasta el día 09 de agosto de 2021 (primer día hábil).

En esa lógica, teniendo en cuenta que la causal concluyó el 20 de julio de 2021, con la suscripción de la Orden de Servicio N° 3457; y estando a lo solicitado por el Residente y revisado y aprobado por el Inspector asimismo por la Sub Gerencia de supervisión y liquidación de obras a través del INFORME TÉCNICO N° 570-2021-GRJ/GRI/SGSLO con fecha 07 de agosto del 2021, donde habiendo revisado que esta ampliación cumpla con los requisitos establecidos en la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNÍN, como el señalamiento de la causal, el





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

cumplimiento del proceso administrativo, así como la afectación de la ruta crítica, esta Gerencia Regional De Infraestructura considera PROCEDENTE la aprobación de la ampliación de plazo N° 08, el cual deberá contabilizarse desde el 12 de julio de 2021 hasta el 02 de agosto de 2021.

## 2. CONCLUSIONES:

Por lo descrito líneas arriba, esta Gerencia Regional de Infraestructura concluye:

- Dar la **PROCEDENCIA TÉCNICA** para la **APROBACIÓN** de la **Ampliación de Plazo N° 08 DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO - JUNÍN"**, ejecutada a través de la modalidad de Administración Directa por un periodo de 22 días calendarios, el cual deberá ser contabilizado desde el 12 de julio de 2021 hasta el 02 de agosto de 2021.

Que, estando al informe precedentemente analizado y con sustento técnico y suscrito por la Gerencia Regional de Infraestructura, se puede apreciar que dio la procedencia técnica a la ampliación de plazo N° 08, por un periodo de 22 días calendarios, precisando que deberá ser contabilizado desde el 12 de julio de 2021 hasta el 02 de agosto de 2021, el mismo que se encuentra también respaldado por el Informe Técnico N° 570-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 06 de agosto del 2021, suscrito por el Ing. Augusto Paredes Taipe, pues en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras (e), quien también analizó técnicamente y concluyó dando la procedencia a la ampliación del plazo N° 08, por 22 días calendarios, precisando además que deberá contabilizarse desde el 12 de julio del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021, por la causal de atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor, en la que se habrían afectado las partidas: BADEN, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2, BOCACALLES, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2, MARTILLOS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2, CUNETAS, CONCRETO F'c=210Kg/Cm2, RAMPAS, CONCRETO F'c=175Kg/Cm2, pues existiría una demora en concretar el servicio de preparación y colocación de concreto, siendo así, debe declararse procedente lo solicitado por el Residente de Obra en cuanto a la ampliación de Plazo N° 08.

Que, en consecuencia, estando a los sustentos positivos, justificación técnica expuesta por el Gerente Regional de Infraestructura, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, es procedente aprobar la solicitud de Ampliación de Plazo N° 06, por un periodo de 21 días calendarios, el cual se contabilizará desde el 28 de mayo del 2021 al 17 de junio del 2021;

Con la visación de la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021- GR-JUNIN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021, a favor del Gerente Regional de Infraestructura;





Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"


## SE RESUELVE:

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR** la ampliación del plazo N° 08, solicitado por el Residente de Obra, en la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNÍN", y formalizada mediante Informe Técnico N° 206-2021-GRJ/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021, por un periodo de 22 días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 12 de julio del 2021 hasta el 02 de agosto del 2021.

**ARTICULO SEGUNDO. – NOTIFICAR**, el presente acto resolutivo a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, Inspector de Obra, Residente de Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para los fines pertinentes.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**



  
Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 13 AGO 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL

