



Gobierno Regional Junín

G.R.I.	
REG. N°	
EXP. N°	6312244



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 414 -2025-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo,

04 JUL 2025

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 324-2025-GRJ/GRI de fecha de emisión 03 de julio de 2025; Informe Técnico N° 1633-2025-GRJ/GRI/SGSLO de fecha de recepción 26 de junio de 2025; Informe Técnico N° 23-2025-GRJ/GRI/SGSLO-JJMA de fecha de recepción 23 de junio de 2025; Carta N° 047-2025/CI-RJCF/RC de fecha de recepción 13 de junio de 2025; Informe N° 016-2025/CONSORCIO INTI/S.O.-A.CH.C de fecha de recepción 12 de junio de 2025; Carta N° 036-2025/CONSORCIO SATIPO/RC/RMS de fecha de recepción 06 de junio de 2025; Informe N° 023-2025/CJMB/RO-CONSORCIO SATIPO de fecha de recepción 06 de junio de 2025; y demás documentación que forma parte integrante de la presente Resolución, y,

#### CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo establecido en los artículos 191 y 192 de la Constitución Política del Perú, los Gobiernos Regionales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la misión de promover el desarrollo y la economía regional, fomentar las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, y garantizar el pleno ejercicio de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes. En este marco competencial, y en estricta observancia del artículo 35, apartado d) de la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, y del artículo 4 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, se faculta a los Gobiernos Regionales a promover y ejecutar inversiones públicas de ámbito regional, incluyendo proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos, con el fin de asegurar un desarrollo integral sostenible, la competitividad y la dinamización de mercados;

Que, la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley, el Texto Único Ordenado aprobado mediante Decreto Supremo N° 082-2019-EF y su reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF, y modificatorias, en adelante el Reglamento, los cuales resultan aplicables al presente procedimiento al haberse iniciado con anterioridad a la entrada en vigencia de la Nueva Ley de Contrataciones y su Reglamento. Los cuales constituyen cuerpos normativos que contienen las disposiciones y lineamientos que deben observar las Entidades en el Sector Público, en los procesos de contrataciones de bienes, servicios u obras, así como regula las obligaciones y derechos que se derivan de los mismos;

Que, al respecto los artículos 197 y 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, establecen sobre la ampliación de plazo lo siguiente:





Gobierno Regional Junín

#### **Artículo 197. Causales de Ampliación de Plazo**

*El contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajenas a su voluntad, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente al momento de la solicitud de ampliación:*

- a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista.
- b) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista amplía el plazo de las garantías que hubiere otorgado.
- c) Cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, en contratos a precios unitarios.

#### **Artículo 198.- Procedimiento de Ampliación de Plazo**

198.1. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos. Tratándose de mayores metrados en contratos a precios unitarios, el residente anota en el cuaderno de obra el inicio de la causal, luego de la conformidad emitida por el supervisor, y el final de ésta a la culminación de los trabajos. Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor, según corresponda, con copia a la Entidad, siempre que la demora afecte la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente.

198.2. El inspector o supervisor emite un informe que sustenta técnicamente su opinión sobre la solicitud de ampliación de plazo y lo remite a la Entidad y el contratista en un plazo no mayor de cinco (5) días hábiles, contados desde el día siguiente de presentada la solicitud. La Entidad resuelve sobre dicha ampliación y notifica, a través del SEACE, su decisión al contratista en un plazo máximo de quince (15) días hábiles, contados desde el día siguiente de la recepción del indicado informe o del vencimiento del plazo, bajo responsabilidad. De no emitirse pronunciamiento alguno dentro del plazo señalado, se tiene por aprobado lo indicado por el inspector o supervisor en su informe".

Que, el Gobierno Regional de Junín y el Consorcio Satipo, con fecha 13 de diciembre del 2023, suscribieron el Contrato N° 131-2023/GRJ/ORAF, para la contratación de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – REGIÓN JUNÍN" con CUI N° 2345383, por el monto de S/ 40,758,809.66 y con un plazo de ejecución de 360 días calendario;

Que, mediante Carta N°036-2025/CONSORCIO SATIPO/RC/RMS de fecha de recepción 06 de junio de 2025; el Representante Común de Consorcio Satipo, remite a la Supervisión la solicitud de ampliación de plazo N° 06, y remite el Informe N° 023-2025/CJMB/RO-CONSORCIO SATIPO, suscrito por el Residente de Obra, en el que indica que la obra fue suspendida, por acuerdo de las partes desde el 03 de enero de 2025, por un plazo indefinido hasta que cese la causal invocada, siendo por caso fortuito o fuerza mayor, situaciones climatológicas que reducen el normal avance de obra, por efectos negativos de las fuertes precipitaciones. Asimismo mediante Resolución de Dirección General N° D000023-2025-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS, se otorga la autorización de desbosque por 09 meses al Gobierno Regional Junín, para la ejecución de la obra en mención, siendo que con fecha 23 de mayo de 2025 se suscribe el acta de reinicio, por ello se solicita la ampliación de plazo por 101 días calendario cuantificada y sustentada, consignando nueva fecha de culminación de obra el 09 de enero de 2026;

Que mediante Carta N° 047-2025/CI-RJCF/RC de fecha de recepción 13 de junio de 2025; el Representante Común de Consorcio Inti, remite a la Entidad, el Informe N° 016-2025/CONSORCIO INTI/S.O.-A.CH.C, suscrito por el Jefe de Supervisión en el cual indica





Gobierno Regional Junín

que al análisis comparativo entre la afectación de la ruta crítica del calendario originalmente contratado por afecto de la no ejecución de las partidas señaladas, a razón que no se contaba de manera oportuna con las autorizaciones y/o permisos relacionados con: autorización para el desboque en el tramo de muros, progresiva Km 0+750 al Km 3+750 y tramo de espigones de una superficie de 7.403 ha, por lo que aprueba la ampliación de plazo N° 06 de 101 días calendario de la partida 4.2.2 Desbroce y Limpieza y este es predecesora para la ejecución las partidas 4.2.3. Corte de Terreno Normal, 4.2.4 Corte en Roca Suelta, 4.2.5 Conformación de Relleno Controlado, 4.3.1 Concreto  $F'C=140 \text{ Kg/CM}^2$  para solados, 4.4.1.1 Concreto Premezclado C/Bomba  $F'C=210 \text{ G/CM}^2$ , 4.4.1.2 Acero de Refuerzo  $FY=4200 \text{ KG/CM}^2$ , el contratista no tendrá reconocimiento de gastos generales;

Que, con Informe Técnico N° 1633-2025-GRJ/GRI/SGSLO recepcionado con fecha 26 de junio de 2025, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en referencia al Informe Técnico N° 23-2025-GRJ/GRI/SGSLO-JJMA suscrito por el Coordinado de Obra; emite Opinión técnica favorable y aprueba la Ampliación de Plazo N° 06 por 95 días calendario, determinando lo siguiente:

"(...)

#### ANÁLISIS:

#### 4.1. DEL EXPEDIENTE ADJUNTO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06

**PRIMERO.** - De acuerdo a lo expuesto por el contratista; señala en el asiento de cuaderno de obra digital N° 190 del Residente titulado INICIO DE CAUSAL ABIERTA, se indica que; (...) Se presentó a la supervisión de Obra la carta N° 063-2024/CONSORCIO SATIPO/RC/RMS, donde se solicita procedan con el trámite para la obtención de la autorización del Plan de desbosque, ante el servicio nacional forestal y de fauna silvestre. El carácter de esta autorización del SERFOR, que es de responsabilidad única y estrictamente del GORE JUNÍN, afecta el desarrollo de la ejecución de las actividades que se encuentran en la Ruta Crítica: Partidas que conforman la defensa ribereña – Partida 4.0, a partir de la progresiva km 0+750 en adelante: partida 4.2 – Movimiento de tierras, Partida 4.3 – Concreto Simple; Partida 4.4 – Muros de Contención, Partida 4.5 – Enrocado de uña, establecidas en nuestro cronograma de ejecución de obra – diagrama Gantt aprobadas por el GORE JUNÍN, y se vean imposibilitadas de poder ejecutarlas, lo cual definitivamente constituye retraso en la ejecución de la obra (...), según asiento de cuaderno de obra el residente de obra indica que ello es el INICIO DE CAUSAL, sobre lo explicado en el asiento del Residente, es necesario mencionar lo siguiente:

- El permiso de SERFOR se refiere a la autorización para realizar los trabajos de desbosque, lo cual estos trabajos se encuentran dentro de la partida de 4.2.2 DESBROCE Y LIMPIEZA, por ello, al no contar con dicho documento no se podía realizar dichos trabajos. Asimismo, se informa que para la ejecución de la partida 4.2.2, solo se tuvo como frente de trabajo habilitado desde la progresiva 0+000 hasta el 0+750, tal y como se evidencia en el asiento de cuaderno de obra N° 190, por parte del residente de obra.


**SEGUNDO** – Sobre el Análisis de la causal de ampliación plazo N° 06, es de acuerdo a lo establecido en la Ley de Contrataciones y su Reglamento, en su artículo 197 – Causales de Ampliación de plazo - Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista. En ese sentido, la solicitud de la presente ampliación de plazo N° 06 es a raíz de la falta de autorización de desbosque por un total de 7,403 hectáreas, ya que, este documento debió haberse tramitado durante la elaboración del expediente técnico elaborado por la Sub Gerencia de Estudios, donde se debieron de adjuntar los permisos y autorizaciones correspondientes, garantizando así la libre disponibilidad de terreno para los trabajos programados, por ello, al no contar con el permiso de SERFOR, el contratista no tuvo frente de trabajo.

La falta de la autorización de desbosque afectó a la ejecución de la partida 4.2.2 DESBROCE Y LIMPIEZA, y esta se encuentra dentro de la ruta crítica, como se muestra a continuación:





Gobierno Regional Junín

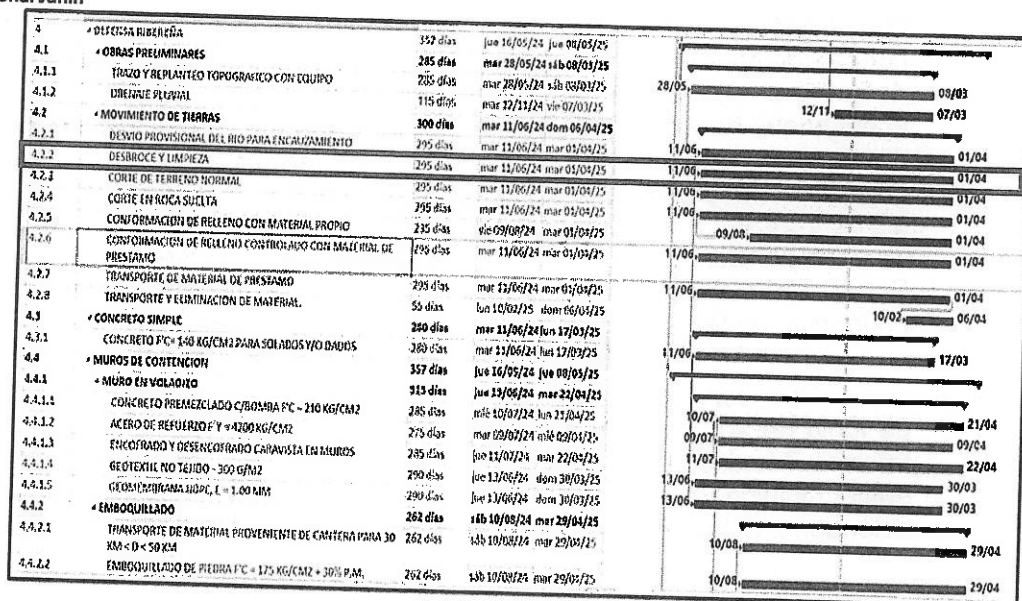

Asimismo, el metrado total según expediente técnico para la ejecución de la partida 4.2.2 DESBROCE Y LIMPIEZA es de 67,488.00 metros cuadrados (m2), para un plazo total de 295 días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

4.2 MOVIMIENTO DE TIERRAS					2,120,777.54
4.2.1	DESvío PROVISIONAL DEL RIO PARA ENCAUZAMIENTO	M3	45,900.00	7.15	328,185.00
4.2.2	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	67,488.00	0.17	11,472.96
4.2.3	CORTE DE TERRENO NORMAL	M3	47,858.41	5.82	278,535.96
4.2.4	CORTE EN ROCA SUELTA	M3	71,787.62	5.91	424,264.83
4.2.5	CONFORMACION DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	23,712.10	10.05	238,306.61

Asimismo, de acuerdo a la valorización N° 10 del mes de mayo de 2025, el supervisor de obra aprobó la valorización, en la cual se informa que la partida 4.2.2 DESBROCE Y LIMPIEZA tiene un metrado acumulado de 16451.50 metros cuadrados (m2), como se muestra a continuación:

04.02 MOVIMIENTO DE TIERRAS						
04.02.01	DESvío PROVISIONAL DEL RIO PARA ENCAUZAMIENTO	M3	45,900.00	7.15	328,185.00	100.00%
04.02.02	DESBROCE Y LIMPIEZA	M2	67,488.00	0.17	11,472.96	24.39%
04.02.03	CORTE DE TERRENO NORMAL	M3	40,534.10	5.82	235,908.46	40.29%
04.02.04	CORTE EN ROCA SUELTA	M3	61,047.61	5.91	360,791.38	37.69%
04.02.05	CONFORMACION DE RELLENO CON MATERIAL PROPIO	M3	26,586.58	10.05	267,185.08	2,062.75

Por estos considerandos, el CONSORCIO SATIPO ejecuto la partida 04.02.02. DESBROCE Y LIMPIEZA en un plazo de 72 días calendarios., por lo cual los plazos quedan configurados de la siguiente manera:

Descripción	Fecha de inicio	Fecha de término programado	Duración total	Duración ejecutada	Plazo pendiente
04.02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA	11/06/2024	01/04/2025	295 d.c	72 d.c.	223 d.c

De lo expuesto en el cuadro precedente, se puede afirmar que, el plazo de la ejecución de la partida 04.02.02, solo se ejecutó 72 días calendarios, quedando un saldo de plazo por ejecutar de 223 días calendarios, asimismo mediante CARTA N° 1084-2025-GR/JGRI/SGSLO de fecha 11.04.2025 se remite el OFICIO N° D000357-2025-MIDAGRI-SERFOR-DGGSPFFS de fecha 02.02.2025, en la cual se autoriza el desbrosque, por lo cual, la partida 04.02.02 tiene frentes de trabajos habilitados, lo cual se iniciaron desde el reinicio de obra, siendo el día 26.05.2025, sin embargo, es necesario precisar que, la obra inició su ejecución el día 16.05.2024 y teniendo una






Gobierno Regional Junín

suspensión de plazo N° 01 el día 03.01.2025 (de acuerdo al acta de suspensión de plazo N° 01), por ello los trabajos se ejecutaron hasta el día 02.01.2025, por lo cual el plazo ejecutado es de 232 días calendarios, por ello, el saldo del plazo que se tiene por ejecutar es de 128 días calendarios, de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción	Plazo de ejecución (16.05.24 – 10.05.25)	Plazo ejecutado (16.05.24 – 02.01.2025)	Saldo de plazo por ejecutar
Obra Contractual	360 d.c.	232 d.c.	128 d.c.

Por lo expuesto en el cuadro precedente, el saldo del plazo para la ejecución de las partidas contractuales es de 128 días calendarios, a partir del reinicio del plazo de ejecución N° 01, asimismo, el plazo para la ejecución de la partida 04.02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA (partida en ruta crítica) es de 223 días calendarios a partir del reinicio de la obra, por lo cual existe un plazo adicional para la ejecución de la misma de 95 días calendarios, como se detalla a continuación:

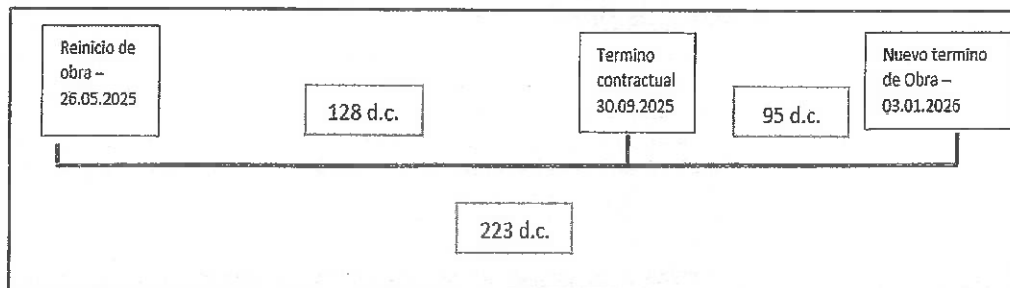

Por lo expuesto párrafos arriba la causal para la ampliación de plazo N° 06 solicitado por el Consorcio Satipo es por causas no atribuibles al contratista (por falta de autorización de desbosque – SERFOR) – para la ejecución de la partida 04.02.02 DESBROCE Y LIMPIEZA por lo cual, correspondería un plazo adicional para ejecutar dicha partida programada, en ese sentido correspondería al consorcio Satipo una ampliación de plazo por 95 días calendarios, desde el 01.10.2025 hasta el 03.01.2026, siendo este último la nueva fecha de culminación de obra, ello en concordancia al sustento presentado por el residente de obra y supervisor de obra, siendo este último quien representa a la entidad en obra y tiene la responsabilidad técnica, legal y administrativa de su ejecución.

TERCERO. - Ahora de la revisión a la documentación y en virtud al marco normativo, se tiene con la justificación correspondiente para la presente solicitud de ampliación de Plazo N° 06 por cumplir con lo estipulado en la Ley de Contrataciones del Estado, en su artículo 198.5 Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el contratista, por intermedio de su residente anota en el cuaderno de obra, el inicio y el final de las circunstancias que a su criterio determinen ampliación de plazo y de ser el caso, el detalle del riesgo no previsto, señalando su efecto y los hitos afectados o no cumplidos, ya que el Residente de obra mediante Asiento N° 190 de cuaderno de obra digital, indica que es el INICIO DE CAUSAL ABIERTO, indicando que se carece de la autorización del SERFOR para el desbosque, seguido, con asiento N° 524 de fecha 26.05.2025, indica que, se emitió el pronunciamiento sobre la autorización de desbosque, siendo este asiento del FIN DE CAUSAL, por ello el FIN de causal se dio el día 26.05.2025..

Ahora bien, de acuerdo a la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 198.1 (...) Dentro de los quince (15) días siguientes de concluida la circunstancia invocada, el contratista o su representante legal solicita, cuantifica y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor (...), tomando en consideración ello, la fecha de concluida la circunstancia fue el 26.05.2025, el contratista tuvo como plazo máximo para solicitar la ampliación de plazo a la supervisión el día 10.05.2025, sin embargo, la fecha presentación de la CARTA N° 036-2025/CONSORCIO SATIPO/RC/RMS, donde el Representante Legal del Consorcio Satipo solicita la ampliación de plazo N° 06 a la supervisión de obra fue el día 06.06.2025, en ese sentido la solicitud de ampliación de plazo por (95) días calendarios ha cumplido con los plazos administrativos que señala el RLCE – artículo 198.

De lo expuesto párrafos arriba, se tiene la justificación por la cual se emite la PROCEDENCIA a la presente solicitud de ampliación de Plazo N° 06 por (95) días calendarios, ya que el contratista cumplió con los procedimientos establecidos en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del





Gobierno Regional Junín



estado, por consiguiente tanto el contratista como la supervisión de obra cumplieron con presentar la solicitud de ampliación de plazo, en los plazos establecidos de la Ley de Contrataciones del Estado en su artículo 198.1 y 198.2, asimismo en el INFORME N° 023-2025/CJMB/RO-CONSORCIO SATIPO en su ítem 5.5.3 Causal Invocada, indica que la ampliación de plazo será sin reconocimiento de gastos generales.

Es necesario informar que; la solicitud de ampliación de plazo N° 06, solicitada por el Consorcio Satipo, es por causas no atribuibles al mismo, debido a las deficiencias del expediente técnico, ya que en él no se realizó y gestiona los trámites y la autorización de desbosque por parte de SERFOR, por el cual es una deficiencia y será responsabilidad absoluta del Sub Gerente de Estudios – Ing. Frank Gonzales Quispe, por la elaboración del expediente técnico deficiente, sin los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de la obra, generando atrasos en la culminación de la obra y posible perjuicio a la entidad.

#### V. CONCLUSIONES

- En mérito al sustento documentario que forma parte del presente expediente y visto el análisis de la presente, en la cual se detalla que la presente ampliación solicitada cuenta con los requisitos mínimos válidos para ser aprobada, en mi condición de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, DECLARO PROCEDENTE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 por un plazo de (95) días calendarios, solicitada por el ejecutor CONSORCIO SATIPO, Residente de Obra y Supervisor de Obra, toda vez que se cumplieron los procedimientos para ser considerada válida la presente ampliación, la cual se computa desde el 01.10.2025 hasta el 03.01.2026.
- La solicitud de ampliación de plazo N° 06, solicitada por el Consorcio Satipo, es por causas no atribuibles al mismo, debido a las deficiencias del expediente técnico, ya que en él no se realizó y gestiona los trámites y la autorización de desbosque por parte de SERFOR, por el cual es una deficiencia y será responsabilidad absoluta del Sub Gerente de Estudios – Ing. Frank Gonzales Quispe, por la aprobación del expediente técnico deficiente, sin los permisos y autorizaciones necesarios para la ejecución de la obra, generando atrasos en la culminación de la obra y posible perjuicio a la entidad.

(...)"

Que, mediante Informe Técnico N° 324-2025-GRJ/GRI emitido con fecha 03 de julio de 2025, la Gerencia Regional de Infraestructura, considera procedente la solicitud de ampliación de plazo N° 06, solicitada por el ejecutor de obra, concluyendo que:

"En ese sentido, de conformidad con el informe emitido por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, esta Gerencia considera procedente la ampliación de plazo N° 06 por 95 días calendarios solicitado por el CONSORCIO SATIPO de la Obra "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – REGIÓN JUNÍN" con CUI N° 2345383, al haberse demostrado la afectación de la ruta crítica y siendo que se cumple con lo señalado en los artículos 197° y 198° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado mediante D.S N° 344-2018-EF; de conformidad a los fundamentos del Informe Técnico N° 1633-2025-GRJ/GRI/SGSLO".

Que, el CONSORCIO SATIPO solicitó ampliación de plazo N° 06 por ciento uno (101) días calendario, invocando la causal del literal a) del artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, argumentando la necesidad de un plazo adicional debido a causas no atribuibles al contratista, específicamente la falta de la autorización de desbosque por parte de SERFOR. En respuesta, la Supervisión de Obra, tras su evaluación, concluyó que esta situación afectaba la ruta crítica y propuso el otorgamiento de ciento uno (101) días calendario de ampliación de plazo. Por su parte, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, al analizar tanto la solicitud del contratista como el informe de la Supervisión, y considerando los asientos del cuaderno de obra (inicio de la causal anotado en el Asiento N° 190 del Residente y fin de la causal en el Asiento N° 524 de fecha 26 de mayo de 2025, con la emisión de la autorización de desbosque), así como la efectiva afectación de la ruta crítica del







Gobierno Regional Junín

programa de ejecución de obra vigente, determinó que la ampliación de plazo N° 06 es procedente por noventa y cinco (95) días calendario. Esta determinación se basó en que, si bien la partida de Desbroce y Limpieza (4.2.2) requería 223 días calendario para su ejecución remanente, el saldo del plazo de ejecución de las partidas contractuales era de 128 días calendario, generando una diferencia de 95 días adicionales necesarios para completar dicha partida crítica. Esta determinación es ratificada por esta Gerencia;

Estando a los considerandos precedentes y contando con la visación favorable de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, y la Oficina Regional de Asesoría Jurídica, en observancia de los Principios Jurídicos de Buena Fe Procedimental, Verdad Material y Principio de Confianza. En ejercicio de las facultades conferidas por la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, y de conformidad con la delegación establecida en la Resolución Ejecutiva Regional N° 0333-2023-GRJ/GR del 25 de setiembre de 2023;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 06 por 95 días calendario al Contrato N° 131-2023-GRJ/ORAF, correspondiente a la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – REGIÓN JUNÍN", con CUI N° 2345383, solicitada por el CONSORCIO SATIPO, la misma que se computará desde el 01 de octubre de 2025 y culminará el 03 de enero de 2026, sin reconocimiento de mayores gastos generales según el análisis y sustento técnico contenido en el Informe Técnico N°1633-2025-GRJ/GRI/SGSLO y los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución,.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- REMITIR** copia de todos los antecedentes administrativos del presente caso a la Secretaría Técnica del Gobierno Regional Junín y al Órgano Competente, a fin de precalificar y deslindar las responsabilidades de quienes formularon y evaluaron el expediente técnico de la obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RÍO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO – REGIÓN JUNÍN". Esto debido a las deficiencias en su formulación, específicamente por no haberse gestionado los trámites y la autorización de desbosque por parte de SERFOR; situación que, conforme a los informes técnicos que obran en el expediente, involucra el ámbito de competencia del Sub Gerente de Estudios – Ing. Frank Gonzales Quispe; lo que generó atrasos en la culminación de la obra y un posible perjuicio a la entidad.

**ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución, al Consorcio Satipo, al Consorcio Inti, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras y a los Órganos Competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines, requiriendo su cumplimiento oportuno.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.**

ING. RONY PACLO VEJARANO PEREZ  
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
La Secretaría General que suscribe, Certifica  
que la presente es copia fiel de su original.

HYO. 04 JUL 2025

Abg. Ena M. Bonilla Pérez  
SECRETARIA GENERAL

