



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	4928303
EXP. N°	3373019



RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 201 - 2021-GR-JUNÍN/GRI

Huancayo, 02 JUL 2021

EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

VISTO:

El Memorando N° 1754-2021-GRJ/GRI del 30 de junio de 2021; Opinión Legal N° 240-2021-GRJ/ORAJ, del 28 de junio de 2021; Informe Técnico N° 155-2021-GRJ/GRI del 25 de junio de 2021; Informe Técnico N° 448-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 22 de junio de 2021; Informe N° 119-2021-GRJ/GRI/SGLO-DAZP del 21 de junio de 2021; Memorando N° 1817-2021-GRJ/GRI del 17 de junio de 2021; Memorando N° 775-2021-GRJ/GRI/SGO del 16 de junio de 2021; Carta N° 035-2021-HJBG-RO del 15 de junio de 2021; Informe N° 008-2021-HJBG-R.O. del 15 de junio de 2021; Cuaderno de Obra N° 230 del 15 de junio de 2021; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo al artículo 191° de la Constitución Política del Perú de 1993, en concordancia con el artículo 2° de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales; que establecen que los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular, son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, con la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, sujetos al ordenamiento jurídico;

Que, la autonomía de los Gobiernos Regionales se define como la facultad de adoptar y concordar las políticas, planes y normas en los asuntos de su competencia, aprobar y expedir sus normas, decidir a través de sus órganos de gobierno y desarrollar las funciones que le son inherentes conforme a lo establecido en la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización;

Que, mediante el Contrato N° 065-2021-GRJ/ORAF, del 14 de junio del 2021 suscrito por el Gobierno Regional Junín y la otra parte la empresa CORPORATIVO DEA S.A.C., con el objeto de la ejecución de la Obra: **"Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en el Tramo del Cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, Distrito de Coviriali, provincia de Satipo-Junín-IV ETAPA"**, por el monto total de S/. 211,375.00 (Dos Cientos Once Mil Trescientos Setenta y Cinco con 00/100 Soles) por el sistema de contratación a Suma Alzada;

Que, mediante Informe N° 008-2021-HJBG-R.O. del 15 de junio de 2021, el Ingeniero Herbert Jorge Bravo Galvez – Residente de Obra, solicita aprobación de ampliación de plazo N° 07, donde concluye en el precitado informe lo siguiente: *"Se solicita la aprobación de la ampliación de plazo N° 07, por la causal de desabastecimiento de material de Cemento Portland tipo I X 42.5 Kg, para la conformación y/o ejecución de partidas que son de componentes de concreto, que afectan la ruta crítica, por un plazo de ejecución de 56 días calendarios a partir posible y aproximado, del 18 de junio del 2021 al 12 de agosto del 2021, por la afectación del cronograma valorizado y del*





Gobierno Regional Junín



cronograma de ejecución de obra existiendo partidas (desabastecimiento de material y/o bien), y a la fecha se tiene los desfases en la obra contractual y obra adicional de obra N° 01”;

Que, mediante Carta N° 035-2021-HJBG-RO del 15 de junio de 2021, el Ingeniero Herbert Jorge Bravo Galvez – Residente de Obra correspondiente a la Obra: Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, provincia de SATIPO-JUNIN-IV ETAPA, y a la vez hace entrega para la revisión, evaluación y aprobación de la Ampliación de Plazo N° 07, teniendo como solicitado con 56 días calendarios por la causal de conformidad con la Directiva N° 005-2009-GR-JUNIN. – VI Disposiciones Específicas. – 6.5. Presentación de Informes durante la ejecución de obra. – 6.5.4. Otros informes eventuales. – Por atrasos en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la entidad;

Que, de conformidad al Informe N° 119-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP del 21 de junio de 2021, el Ingeniero David Abel Zurita Puente en su calidad de Inspector de Obra señala que:



“El residente de obra solicita la ampliación de plazo debido a causal: por desabastecimiento de material (Cemento Portland Tipo I) por un plazo de 56 días calendarios por la afectación de la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, la cual fue por la causal de desabastecimiento de material por la demora de adquisición del servicio de adquisición de Cemento I.

La Inspección de Obra OPINA FAVORABLEMENTE la aprobación la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 por 44 días calendarios a partir 18 de junio de 2021 hasta el 31 de julio de 2021, por desabastecimiento de material, afectando la programación del cronograma de ejecución de obra, determinado por el análisis ejecutado por esta Inspección de Obra en base a los documentos de programación de obra vigente, basado en la ruta crítica de cronograma vigente”;



Que, mediante Informe Técnico N° 448-2021-RGJ/GRI/SGSLO del 22 de junio de 2021, el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, en relación a la Solicitud de Ampliación de Plazo N° 07 del obra: “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín”, aprueba la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por (24) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 18 de junio de 2021 hasta el 11 de julio de 2021;



Que, mediante Informe Técnico N° 155-2021-GRJ-GRI del 25 de junio de 2021, el Gerente Regional de Infraestructura, en relación a la solicitud de la Ampliación de Plazo de la obra: “Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en el tramo del cruce Ricardo Palma a la plaza principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo – Junín”, concluye por la procedencia técnica para la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 07 de la Obra en mención, y teniendo en cuenta los informes emitidos por el Residente y Supervisión de Obra;

Que, cuando se trata de la ejecución de una Obra por Administración Directa ejecutada por el Gobierno Regional de Junín, la **DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN** ha estipulado el debido procedimiento que se tiene que cumplir para poder aprobar las respectivas ampliaciones de plazo;

De los argumentos para declarar procedente la ampliación de plazo.

“Siendo esto así, la Inspección de la Obra y Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obra, a petición de la Residencia de la Obra sobre la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por un periodo de 56 días calendarios a consecuencia del atraso en el cumplimiento de las prestaciones por causas atribuibles a la Entidad, específicamente el atraso señalado por el residente, se debe al desabastecimiento de cemento portland tipo I x 42.5 Kg, por la cantidad de 8,900.00 bolsas, del proceso electrónico N° 06-2021-GRJ-OEC PRIMERA CONVOCATORIA, que el ganador inicial PROMOCIONES E INVERSIONES ARCO SAC perdió la buena pro, otorgándole al




Gobierno Regional Junín



segundo CORPPORATIVO DEA S.A.C. el cual generó una demora en el abastecimiento de dicho material afectando la ruta crítica.

Asimismo, señala, que las partidas principales que afecta la ruta crítica del cronograma de ejecución de obra, a la falta de cemento imposibilita la continuidad de la ejecución de las partidas (ejecución de concreto en Pavimento, Cunetas, Sardineles, Veredas, Bocacalles, Rampas, Badenes, Muro de Contención, Muro sardinel y otros), según expediente y el Adicional de Obra N° 01.

Ahora bien, el Inspector de obra, con el INFORME N° 119-2021-GRJ/GRI/SGSLO-DAZP, realiza su evaluación y análisis respectivo, el cual comparte con la causal mencionado por el residente de obra, sustentado por la demora en trámite administrativo por parte de la oficina de Abastecimiento y servicios auxiliares en la Adquisición del cemento, que se dio el 14 de julio del 2021. Sin embargo, refiere que, de acuerdo al cronograma de ejecución de obras aprobado, determina que la afectación de la ruta crítica, se da a partir del 02 de mayo del 2021 hasta el día 14 de junio del 2021, teniendo 44 días calendarios y no 56 como indica el residente:

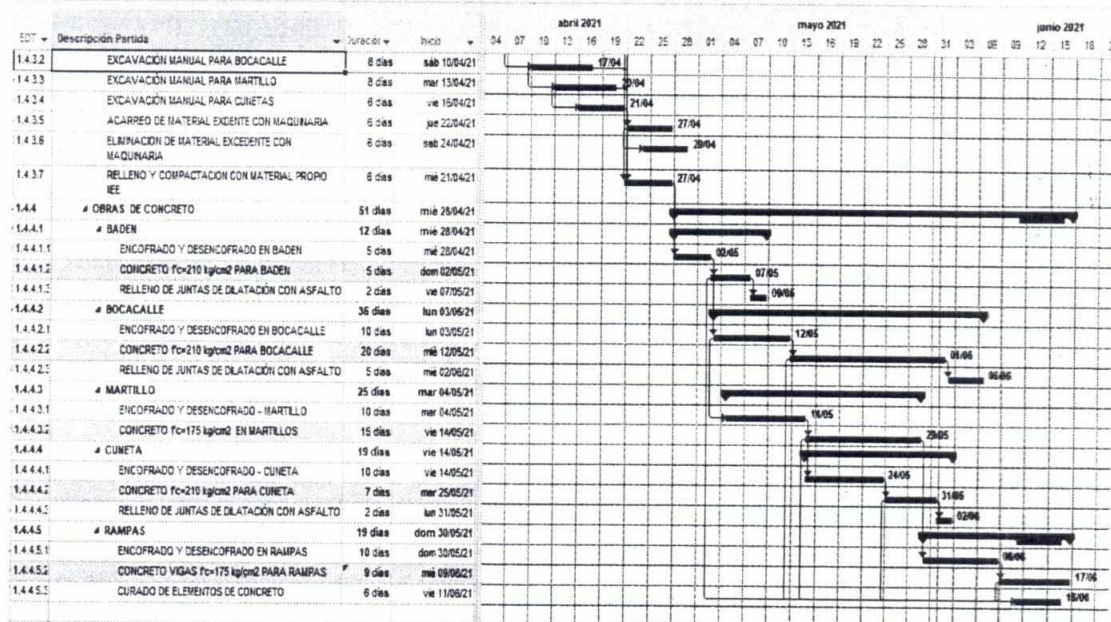

De la imagen se puede extraer que las partidas afectadas, por el desabastecimiento de cemento, en el siguiente cuadro:



PARTIDAS	PROGRAMACIÓN		TOTAL DE DÍAS
Construcción de Bocacalles			
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Badén	02/05/2021	07/05/2021	05 días
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Bocacalle	12/05/2021	01/06/2021	20 días
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Martillo	14/05/2021	29/05/2021	15 días
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Cuneta	24/05/2021	31/05/2021	07 días
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Rampas	08/06/2021	17/06/2021	09 días
TOTAL DE DÍAS PROGRAMADOS DE TRABAJOS DE CONCRETO			63 días
TOTAL DE DÍAS QUE AFECTA LA RUTA CRITICA POR DESABASTECIMIENTO DE CEMENTO			44 ÍAS



Gobierno Regional Junín



De manera que el inspector de obra concluye en Opinión favorable a la aprobación la solicitud de ampliación de plazo N° 07 por 44 días calendarios”;

Que, a través de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de obra, del informe Técnico N° 448-2021-GRJ/GRI/SGSLO del 23 de junio de 2021, luego de su análisis técnica, señala:

“(…) El plazo solicitado por el Residente de Obra fue de 56 días calendarios, sin embargo posterior a la revisión, evaluación y aprobación realizada por el Inspector de Obra, este aprueba la presente solicitud de Ampliación de Plazo N°07 por **24 días calendarios**, debido a que la DIRECTIVA N° 005 – 2009 – GR-JUNIN “NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN” señala en su ítem 5.3.5.3 Toda ampliación de plazo de la obra será aprobada por el titular de la entidad o el funcionario designado, previa sustentación escrita del residente de obras si la causal es de su competencia, y solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución. En ese sentido esta sub gerencia después de realizar la verificación de la información remitida determina que las únicas partidas que afectan la ruta crítica son las siguientes:

PARTIDAS	PROGRAMACIÓN		TOTAL DE DIAS
Construcción de Bocacalles			
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Martillo	14/05/2021	29/05/2021	15 días
Concreto F'c= 210 kg/cm2 para Rampas	08/06/2021	17/06/2021	09 días
TOTAL DE DIAS QUE AFECTEN LA RUTA CRITICA			24 días

(…) En ese sentido se aprueba solicitud de ampliación de Plazo N° 07, por 24 días calendarios, los cuales serán contabilizados desde el 18 de junio de 2021 hasta el 11 de julio de 2021.

Por tanto, revisado y evaluado los informes que obran en autos se colige que la ampliación de plazo afecta la ruta crítica respecto a la partida de construcción de Bocacalles, tal como se demuestra en el Informe de la referencia, del mismo modo el expediente materia de informe legal cuenta con los documentos que sustentan su pretensión; y respecto a los plazos para su aprobación se colige que este se cumplió, por tanto, corresponde su aprobación respectiva.

Finalmente, se debe precisar que el presente informe legal no implica convalidación de los actos o acciones realizadas o por realizarse que no se enmarquen dentro de la normatividad aplicable al caso en concreto; en consecuencia, la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Inspector de Obra, Residente de obra y demás unidades orgánicas inmersas en su ejecución deberán de cautelar la observancia del marco legal”;

Que, de las consideraciones esgrimidas, en cumplimiento, de los artículos 181.2° y 182.2° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General; y habiéndose evaluado el pedido en base únicamente a la documentación adjunta al expediente; ésta Oficina Regional de Asesoría Jurídica opinaría por Declarar Procedente aprobar mediante acto administrativo la ampliación de Plazo N°07 de la Obra **“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN”**, ejecutada a través de Administración Directa por un periodo de 24 días calendarios, el cual deberá computarse desde el 18 de junio del 2021 hasta el 11 de julio de 2021;



Gobierno Regional Junín



Que, mediante Informe Legal N° 240-2021-GRJ/ORAJ, del 28 de junio de 2021, la Oficina de Regional de Asesoría Jurídica, mediante el cual emite la siguiente opinión:

"Procedente Aprobar mediante acto administrativo con eficacia anticipada la solicitud de Ampliación de Plazo N° 07, por el periodo de 24 días calendarios comprendido a partir del 18 de junio de 2021 hasta el 11 de julio de 2021, de la Obra "Mejoramiento del servicio de Transitabilidad en el Tramo de Cruce Ricardo Palma a la Plaza Principal de Coviriali, distrito de Coviriali, provincia de Satipo, departamento de Junín";

Que, el 4.1.3. del numeral 4.1. en materia de Contrataciones del Estado del artículo tercero de la Resolución Ejecutiva Regional N° 045-2021 del 24 de febrero de 2021, el Gobernador Regional delega al Gerente Regional de Infraestructura, en las facultades y atribuciones siguientes: "La facultad de aprobar y denegar las ampliaciones de plazo de contratos de ejecución de obras y consultorías de obras de acuerdo a la normativa legal aplicable";

Que, estando a los sustentos técnicos y legales expuestos por la Supervisión de Obra, Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, debe aprobarse la Ampliación de Plazo N° 07 solicitado por Residente de Obra mediante la Carta N° 035-2021-HJBG-RO;

Que, con la visación de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura y la Dirección Regional de Asesoría Jurídica;

Que, en uso de las atribuciones conferidas por la Constitución Política del Estado, Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867 – Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, modificado por la Ley N° 27902, Resolución Ejecutiva Regional N° 045-2021-GRJ/GR;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR, la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07** presentado por el Residente de Obra que corresponde a la Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO DEL CRUCE RICARDO PALMA A LA PLAZA PRINCIPAL DE COVIRIALI, DISTRITO DE COVIRIALI, PROVINCIA DE SATIPO – JUNIN", contados a partir del 18 de junio de 2021 hasta el 11 de julio de 2021; conforme a los fundamentos expuestos.

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, el presente acto administrativo a los órganos competentes del Gobierno Regional de Junín y demás partes interesadas, de acuerdo a las disposiciones del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS; para conocimiento, cumplimiento y difusión.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.




Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE
Gerente Regional de Infraestructura
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines pertinentes

HYO. 02 JUL 2021

Mg. César F. Bonilla Pacheco
SECRETARIO GENERAL
