



Gobierno Regional Junín

G. R. I.	
REG. N°	5055533
EXP. N°	3478624

"Año de la Universalización de la Salud"



## RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

N° 273 -2021-GRJ/GRI

Huancayo, 04 SEP 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Memorando N° 1034-2021-GRJ/ORAJ del 04 de setiembre de 2021; Informe Legal N° 345 -2021-GRJ/ORAJ, de fecha 03 de setiembre del 2021; El Informe Técnico N° 239-2021-GRJ/GRI, de fecha 03 de setiembre del 2021; el Informe Técnico N° 671-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de setiembre del 2021; la Carta N° 080-2021-WESP-SUPERVISOR, de fecha 02 de setiembre del 2021; el Informe N° 031-2021-INGWESP/SO, de fecha 02 de setiembre del 2021; la Carta N° 282-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 02 de setiembre del 2021; el Memorando N° 1348-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 02 de setiembre del 2021; la Carta N° 069-2021-HLCHV-RESIDENTE, de fecha 02 de setiembre del 2021; el Informe Técnico N° 024-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, de fecha 02 de setiembre del 2021; la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNÍN/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021; y,

#### CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado el cual declara: "Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones", asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que "Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"; por otro lado, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: "Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."; asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: "Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo", advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de







autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de su sus habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades; finalmente, de conformidad al artículo 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el mismo que declara: *"Los errores material o aritmético en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión"*, pues estando a lo precedentemente descrito se puede desprender que con efecto retroactivo los errores materiales o aritméticos son pasibles de rectificar, ello siempre y cuando no se altere el fondo ni el sentido de la decisión;

Que, del Informe Técnico N° 239-2021-GRJ/GRI, de fecha 03 de setiembre del 2021, suscrito por el Ing. Anthony G. Ávila Escalante, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura, señala que existe error material en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021, pues de su análisis se advierte de manera objetiva lo siguiente:

### III. ANALISIS:

Mediante el INFORME TECNICO N°024 -2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, del residente de obra, manifiesta que en la RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 –G.R.- JUNIN/GRI, con fecha 09 de Agosto del 2021, se llegó apreciar sobre el cálculo de días asignados a la ejecución de obra, donde se hace mención sobre la nueva fecha de culminación de obra, siendo así el 10 de setiembre del 2021, por lo que según al plazo de ejecución de la obra 180 días calendarios, y considerando que el inicio de ejecución de la obra fue el 11 de marzo del 2021, por lo que la fecha de culminación de obra debería tener como fecha el 06 de setiembre del 2021, y **se evidencia que por error material de digitación se encuentra el 07 de setiembre del 2021**; finalmente concluyendo, con lo siguiente:

### CONCLUSIONES

(...).

- Se evidencia que la RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 –G.R.- JUNIN/GRI. Aprueba La ampliación de plazo N°01 POR 03 DIAS CALENDARIO
- La RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 –G.R.- JUNIN/GRI dentro del Artículo Primero, manifiesta que la culminación de la obra es el 10 de setiembre del 2021, de los cálculos de plazo establecidos considerando los 180 días calendarios de ejecución de obra adicionando la ampliación de plazo N° 01 por tres días calendarios la nueva culminación de obra debería ser el 09 de setiembre del 2021.
- Por lo que se solicita al área correspondiente realizar los trámites respectivos para resarcir el error de causa involuntaria ocurrido por error material de digitación.

(...).

Asi mismo mediante INFORME TECNICO N°-031-2021-INGWESP/SO, de fecha 02 de Setiembre del 2021, del supervisor de obra, manifiesta que en referencia a la solicitud de la residencia, sobre la solicitud de modificación de la RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 –G.R.- JUNIN/GRI, donde se aprobó una ampliación de plazo de 03 días calendarios y por error se digito una fecha de culminación contractual el 07 de Setiembre del 2021, teniendo como nueva fecha de culminación por la ampliación de plazo el 10 de setiembre del 2021; además que evidencia que durante la revisión de la Resolución N°41-2021-G.R.-JUNIN/GRI, se tiene un plazo de 180 días calendarios contractuales a partir del 11 de marzo del 2021 y como fecha de culminación se tiene el 06 de setiembre del 2021, asi mismo concluyendo con lo siguiente:

### V. CONCLUSIONES

(...).

Por los expuesto líneas arriba y según la ley N°27444" ley del procedimiento administrativo general" y visto por lo expuesto en el Informe N°024-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, DEL RESIDENTE DE OBRA, se da procedencia a la modificación de la fecha de culminación de obra el 06 de setiembre del 2021y con la ampliación de plazo N°01, se tendrá una nueva fecha de culminación de obra el 09 de setiembre del 2021.

(...).






"Año de la Universalización de la Salud"

Gobierno Regional Junín



#### ASPECTOS TÉCNICOS SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL

De los hechos expuestos por los profesionales responsables de la obra, como son el Residente y Supervisor de obra, se aprecia que el plazo consignado, como fecha de culminación, considerando la ampliación de plazo de 03 días calendarios, es el 10 de Setiembre del 2021, contabilizado desde el 08 de Setiembre del 2021 al 10 de Setiembre del 2021; habiendo percibido ambos profesionales el error de computo de plazo, ya que habiendo iniciado la obra el 11 de marzo del 2021, y contemplando un plazo de 180 días calendario, se tendría como fecha de culminación el 06 de Setiembre del 2021, y de esa manera la ampliación de plazo se contabilizaría desde el 07 de Setiembre hasta el 09 de Setiembre, siendo este último como nueva fecha de culminación de obra, para fines de plazo de ejecución; de acuerdo a la línea de tiempo siguiente:

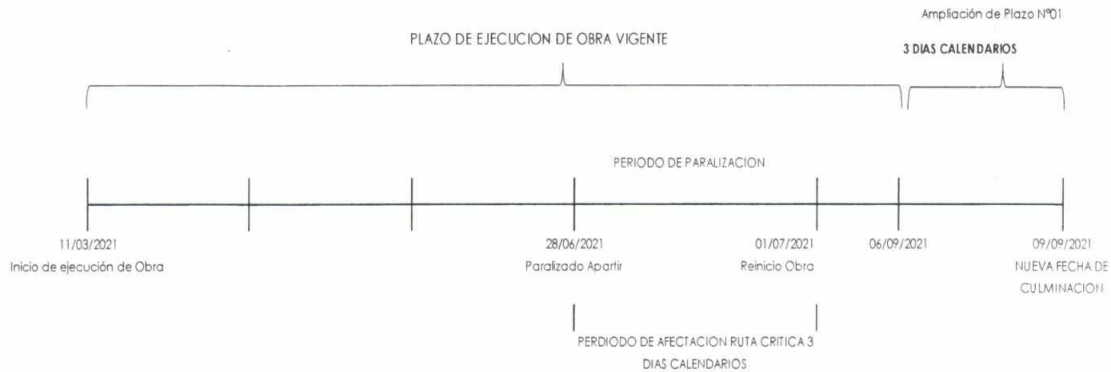

Para más detalle se muestra lo siguiente según:

#### RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 –G.R.- JUNIN/GRI

##### Considerando:

Dice:

...(...)

Que, mediante Informe Tecnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, del cual se desprende que da la aprobacion de ampliacion de plazo N°01, por 03 dias calendarios, los cuales se contabilizaran desde el 08 de Setiembre del 2021 al 10 de Setiembre del 2021;

...(...)

##### Debe decir:

(...)

Que, mediante Informe Tecnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervision y Liquidacion de Obras, del cual se desprende que da la aprobacion de ampliacion de plazo N°01, por 03 dias calendarios, los cuales se contabilizaran desde el **07 de Setiembre del 2021 al 09 de Setiembre del 2021;**

(...)

##### Se Resuelve:

Dice:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra el 10 de setiembre del 2021; conforme a los fundamentos expuesto.

(...)

##### Debe decir:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra **el 09 de setiembre del 2021;** conforme a los fundamentos expuesto.

(...)







Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



En ese sentido, modifica el término de ejecución de obra, que indica erróneamente el 10 de Setiembre del 2021 y que debería ser el 09 de Setiembre del 2021.

Conforme lo dispone el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas en cualquier momento siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión. Tales errores materiales pueden ser, como ha ocurrido en el presente caso, errores en la digitación y resultado aritmético.

#### ASPECTOS LEGALES SOBRE LA RECTIFICACIÓN DE ERROR MATERIAL

Conforme lo dispone el artículo 212 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas en cualquier momento, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión.

Juan Carlos Morón, señala que el error material:

"(...) atiende a un 'error de transcripción', un 'error de mecanografía', un 'error de expresión', en la 'redacción del documento', en otras palabras, un error atribuible no a la manifestación de voluntad o razonamiento contenido en el acto, sino a su expresión material que lo contiene (...) la rectificación de errores materiales o aritméticos es "el medio procesal mediante el cual un administrado busca obtener la rectificación de una resolución materialmente errada de tal modo que una simple lectura de su texto origina duda sobre su alcance, vigencia o contenido. Para la procedencia de esta figura, el error debe ser evidente, es decir, la decisión debe ser contraria a la lógica y al sentido común (defecto en la redacción, error ortográfico o numérico, etc.), por lo que no procede aspirar mediante esta vía a alterar lo sustancial de una decisión ni corregir deficiencias volitivas incurridas durante su motivación. El límite natural es objetivo: no puede ir más allá de la esencia de la resolución que pretende aclarar"

#### IV. CONCLUSIONES:

ES PROCEDENTE la rectificación del error material incurrido en la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNIN/GRI de fecha 09 de Agosto del 2021, pues se ha verificado que, por un error y/u omisión, se ha consignado erróneamente contabilizar desde 08 de Setiembre del 2021 al 10 de Setiembre del 2021, toda vez que el computo de plazo fue aclarado mediante los informes del residente y supervisor referidos, por lo que debería ser contabilizado desde el 07 de Setiembre del 2021 al 09 de Setiembre de 2021; modificando el computo de ampliación de plazo, y por ende la fecha de culminación de obra; quedando de la siguiente manera:

#### RESOLUCIÓN DE GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 231-2021 -G.R.- JUNIN/GRI

##### Considerando:

Dice:

...(...)

Que, mediante Informe Técnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, del cual se desprende que da la aprobación de ampliación de plazo N°01, por 03 días calendarios, los cuales se contabilizarán desde el 08 de Setiembre del 2021 al 10 de Setiembre del 2021;

...(...)

Debe decir:

...(...)

Que, mediante Informe Técnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, del cual se desprende que da la aprobación de ampliación de plazo N°01, por 03 días calendarios, los cuales se contabilizarán desde el 07 de Setiembre del 2021 al 09 de Setiembre del 2021;

...(...)

##### Se Resuelve:

Dice:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra el 10 de setiembre del 2021; conforme a los fundamentos expuesto.

(...)

Debe decir:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra el **09 de setiembre del 2021**; conforme a los fundamentos expuesto.

(...)

Que, estando a lo precedentemente señalado, y del Informe Técnico N° 671-2021-GRJ/SGSLO, de fecha 02 de setiembre del 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, pues en su análisis señala que del Informe Técnico N° 024 -2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, suscrito por el residente de obra, se declaró que en la Resolución de Gerencia Regional de Infraestructura N° 231-2021 -G.R.- JUNIN/GRI, su fecha 09 de Agosto del 2021, se llegó apreciar sobre el cálculo de días asignados a la ejecución de obra, donde se hace mención sobre la nueva fecha de culminación de obra, siendo así el 10 de setiembre del 2021, por lo que según al plazo de ejecución de la obra 180 días calendarios, y considerando que el inicio de ejecución de la obra fue el 11 de marzo del 2021, por lo que la fecha de culminación de obra debería tener como fecha el 06 de setiembre del 2021, y se evidencia además que por error material de digitación se consignó el 07 de setiembre del 2021; por otro lado podemos advertir de la Carta N° 080-2021-WESP-SUPERVISOR, recepcionado con fecha 02 de setiembre del 2021 y suscrito por el Supervisor de Obra Ing. Wilmer Saturno Ponce, quien solicitó la modificación de fecha de culminación contractual por error material en el cálculo de los plazos de culminación de la obra, adjuntando a dicho documento su Informe N° 031-2021-INGWESP/SO, de fecha 02 de setiembre del 2021, pues del contenido de su análisis se puede advertir que se habría aprobado una ampliación de plazo de tres días y que por error material se digitó una fecha de culminación contractual el 07 de setiembre del 2021, teniendo como nueva fecha de culminación por la ampliación de plazo el 10 de setiembre del 2021, cuando debería ser como fecha de culminación el 09 de setiembre del 2021, tal como precisó en el cuadro del tiempo que se ilustra a continuación:



Que, de la Carta N° 069-2021-HLCHV-RESIDENTE, de fecha 02 de setiembre del 2021, suscrito por el Ing. Héctor Luis Chachi Vicuña, en su calidad de Residente de Obra, mediante su Informe Técnico N° 024-2021-GRJ/GRI/SGO/RO-HLCHV, de fecha 02 de setiembre del 2021, solicitó la





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



modificación de la fecha de culminación contractual de la obra debido a un error material en el cálculo de los plazos de culminación de la misma, pues refiere que por error material se consignó como fecha de culminación de la obra el 10 de setiembre del 2021, cuando realmente debería señalarse como fecha de culminación el 09 de setiembre del 2021, y que visto la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNIN/GRI, su fecha 09 de agosto del 2021, efectivamente se advierte que se tiene como fecha de culminación de la obra el 10 de setiembre del 2021, siendo así, es factible que se rectifique el error material incurrido, debiendo señalarse como fecha de culminación el 09 de setiembre del 2021, conforme a los sustentos realizados por el Residente, Supervisor, Sub Gerente de Supervisor y Liquidación de Obras y Gerencia Regional de Infraestructura, en aplicación del artículo 212.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el mismo que declara que los errores materiales o aritméticos en los actos administrativos pueden ser rectificadas con efecto retroactivo, en cualquier momento, de oficio o a instancia de los administrados, siempre que no se altere lo sustancial de su contenido ni el sentido de la decisión;

#### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- RECTIFICAR** por **ERROR MATERIAL**, la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNIN/GRI, su fecha 09 de agosto del 2021, tal como sigue:

En la parte del **CONSIDERANDO**:

DICE:

...(...)

Que, mediante Informe Técnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, del cual se desprende que da la aprobación de ampliación de plazo N°01, por 03 días calendarios, los cuales se contabilizarán desde el 08 de Setiembre del 2021 al 10 de Setiembre del 2021;

...(...)

**DEBE DECIR:**

...(...)

Que, mediante Informe Técnico N° 558-2021-GRJ/GRI/SGSLO, del 03 de Agosto del 2021, suscrito por el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, del cual se desprende que da la aprobación de ampliación de plazo N°01, por 03 días calendarios, los cuales se contabilizarán desde el **07 de Setiembre del 2021 al 09 de Setiembre del 2021**;

...(...)





Gobierno Regional Junín

"Año de la Universalización de la Salud"



En la parte del **SE RESUELVE**

DICE:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra el 10 de setiembre del 2021; conforme a los fundamentos expuesto.

(...)

DEBE DECIR:

(...)

**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la solicitud de **Ampliación de Plazo N° 01**, solicitado por el Ingeniero Héctor Luis Chachi Vicuña en su calidad de Residente de Obra, mediante la Carta N° 055-2021-HLCHV-RESIDENTE, para la ejecución de la Obra: "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNÍN IV ETAPA-COMPONENTE ALCANTARILLADO SANITARIO", por el periodo de tres (03) días calendarios, teniendo una nueva fecha de culminación de obra **el 09 de setiembre del 2021**; conforme a los fundamentos expuesto.

(...)

**ARTÍCULO SEGUNDO.- MANTENER** subsistentes los demás extremos de la Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 231-2021-G.R.-JUNIN/GRI, de fecha 09 de agosto del 2021.

**ARTÍCULO TERCERO.- REMÍTASE** copias de los actuados a **Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario** de la entidad, a efectos de que deslinde responsabilidades funcionales en contra de los funcionarios que habrían incurrido en dicho error, pues en la







Gobierno Regional Junín


"Año de la Universalización de la Salud"



tramitación de los documentos e informes emitidos por funcionarios de la entidad se viene generando dilación, perjuicio económico y moral a la entidad pública.

**ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR**, copia de la presente Resolución a la Gerencia Regional de Infraestructura, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Sub Gerencia de Obras, al Residente y Supervisor de la Obra y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y demás fines.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
.....  
Ing. ANTHONY G. AVILA ESCALANTE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribo a Ud. para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 06 SEP 2021

.....  
Mg. César F. Bonilla Pacheco  
SECRETARIO GENERAL

