

ORDITI	01
Dcc. N°	02324767
Exp. N°	01590518

129

GOBIERNO REGIONAL JUNIN GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA	
RECIBIDO	
11 OCT 2017	
Hora: 16:45 A	Firma: [Firma]
Folios: 01	

MEMORANDO Nro. 231 -2017-GRJ/GGR/ORDITI

ASUNTO : Ing. EDUARDO CRISTIAN LAGOS VILLAVICENCIO
Gerente Regional de Infraestructura

: Reitero Remisión de Información para el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Junín.

FECHA : Huancayo, 11 OCT 2017

Mediante el presente me dirijo a usted, para comunicarle que como es de su conocimiento se aprobó la Directiva Gerencial N°009-2012-GRJ-ORDITI, "Normas para la Publicación y Actualización de Información en el Portal de Transparencia del Gobierno Regional de Junín", a través del cual se designa un responsable por cada Unidad Orgánica de proporcionar la información necesaria a ser publicada en el Portal de Transparencia de la Sede del Gobierno Regional de Junín, dentro de los plazos de entrega, esto es dentro de los 10 días siguientes de cada mes, bajo responsabilidad.

Por lo que se le solicita, alcanzarnos la información correspondiente a su Dependencia, asimismo, dicha información solicitada, deberá de remitir en forma impresa a esta Oficina y digital al Correo electrónico: kamsi_26@hotmail.com, según detallo:

Información a remitir correspondiente al III Trimestre del presente año.

- Información de los montos por concepto de adicionales de obra
- Liquidación final de obras
- Informes de supervisión de contratos según corresponda

Atentamente,

[Firma]
Ing. CESAR LENNER RICALDI RUPAY
Director Regional de Desarrollo Institucional
y Tecnología de la Información
GOBIERNO REGIONAL JUNIN


GOBIERNO REGIONAL JUNIN SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS	
RECIBIDO	
12 OCT 2017	
Reg: 11701	Folios:
Hora: 10:12	Firma: [Firma]

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
Huancayo, 12 OCT 2017 del 2017

PARASE A: [Firma]
PARA: [Firma]

c.c.
Arch.
CRR/Epm.





DOC 2397255
EXP 1638329
REPORTE N° 014-2017/GRJ/GRI/SGO/GAMR-RO



A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

ASUNTO : INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/O
ACTIVIDADES

REFERENCIA : MEMORANDO MÚLTIPLE N° 20 – 2017 – GRJ/GRI

FECHA : Huancayo, 20 de noviembre del 2017

Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y remitir a su despacho lo solicitado en el documento de la referencia.

Se adjunta:

Ficha técnica de obra.
Diapositivas con información según plantillas.
Panel fotográfico.
Información financiera.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 159218

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: Ing. Gino Peña
HYO. 20 NOV 2017
PARA: Apuntes



PROVINCIA DE JAUJA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 159218

“MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA-JAUJA-JUNIN”


GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 159218

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA-JAUJA - JUNIN"

I. LOCALIZACIÓN :

Región : Junín
 Provincia : Jauja
 Distrito : Curicaca

II. DESCRIPCIÓN GENERAL:

Se mejorará la transitabilidad de los Jr. Juan Alonzo, Jr. Ramón Castilla, Jr. Calle Uno y Jr. César Vallejo de la localidad de San Francisco, Distrito de Curicaca – Jauja - Junín, mediante la construcción de un pavimento rígido con concreto $f'c=210$ Kg/cm², aceras peatonales, jardinería, sistema de drenaje pluvial mediante cunetas.

	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE
META FÍSICA	S/ 203,189.24	S/ 215,523.08	30.76%
PRESUPUESTO	S/ 700,660.21	S/ 116,159.69	16.58%

NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS : Se beneficiará a un total de 1200 beneficiarios, pobladores de la localidad y transportistas que circulan por el área del proyecto.

LOGROS OBTENIDOS : Se han ejecutado los trabajos de movimiento de tierras, se culminó la ejecución de veredas y sardineles, se viene trabajando en la conformación de la estructura del pavimento



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 SUB GERENCIA REGIONAL DE OBRAS
 GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP. N° 156218

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA-JAUJA - JUNIN"

CÓDIGO SNIP N° 325554




CONFORMACIÓN DE SUB BASE GRANULAR

Monto de inversión viable	S/ 510,748.39
Presupuesto de obra	S/ 700,660.21
Monto supervisión de obra	S/ 33,364.77
Variación entre PIP y Expediente técnico	37.18%
Plazo de ejecución de obra	180 días
Fecha de inicio de ejecución	11/09/2017
Fecha de término programado	10/03/2018
AVANCE FÍSICO EJECUTADO ACUMULADO A LA FECHA	30.76%
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO	29.63%
PIM 2017	S/ 468,231.00
Devengado año 2017	S/ 116,159.69
Devengado acumulado al año 2017	S/ 116,159.69
EJECUCIÓN FINANCIERA ACUMULADO DEVENGADO AL 2017	24.80%

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENTE DE OBRAS
GERENTE ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 158218

NOMBRE DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE JR. JUAN ALONZO, JR. RAMÓN CASTILLA, JR. CALLE UNO Y JR. CESAR VALLEJO DE LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE CURICACA-JAUJA - JUNIN"

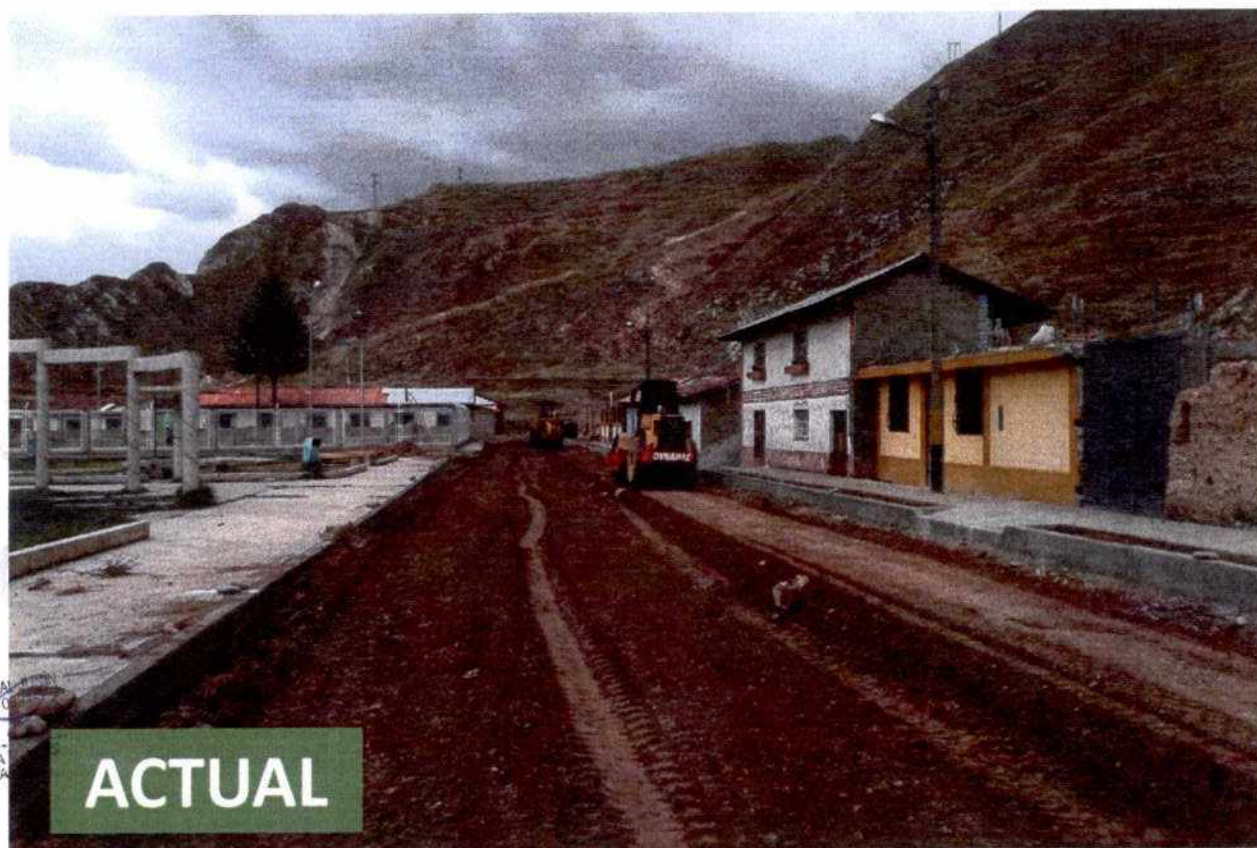

REPORTE N° 014-2017/GRJ/GRI/SGO/GAMR-RO

A : **ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA**
SUB GERENTE DE OBRAS

ASUNTO : **INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/O**
ACTIVIDADES

REFERENCIA : **MEMORANDO MÚLTIPLE N° 20 – 2017 – GRJ/GRI**

FECHA : **Huancayo, 20 de noviembre del 2017**



Por medio de la presente es grato dirigirme a Ud. Para saludarlo cordialmente y remitir a su despacho lo solicitado en el documento de la referencia.

Se adjunta:

Ficha técnica de obra.
Diapositivas con información según plantillas.
Panel fotográfico.
Información financiera.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
GERMAN ALBERTO MINAYA ROJAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 159218

DOC 2347271
Exp. 1638383

"Año del Buen Servicio al Ciudadano"

113

Huancayo, 15 de Noviembre del 2017.

CARTA Nº 049-2017-GARZ/RO

Señor:

ING. GUSTAVO EDUARDO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras
Gobierno Regional Junín



CIUDAD.-

ASUNTO : REMITO INFORMACIÓN DE OBRA

REFERENCIA : OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N -
OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN REGION
JUNIN -
II ETAPA"

Mediante el presente me dirijo a usted con el fin de remitir a su despacho con el fin de informarle lo siguiente:

Se le hace llegar la información solicitada de la siguiente obra: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN REGION JUNIN - II ETAPA".

Es todo cuanto informe a usted para su conocimiento y demás fines pertinentes.

Atentamente;

C.c.
Archivo

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Gustavo Adolfo Recuay Zamudio
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: ING. PENA

HYO. 17 NOV 2017

PARA: Su despacho



ING. GUSTAVO ADOLFO RECUAY ZAMUDIO
REG. CIP Nº 109872
TAMBO

TELF: 977802223
DIR.: PSJE SANTA ÚRSULA 623 EL

**“MEJORAMIENTO DE LA VIA
VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME
PE-3N - OBELISCO DE
CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN
PROVINCIA DE JUNIN REGION
JUNIN - II”**

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Gustavo Recany Zamudio
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN REGION JUNIN - II"

CODIGO SNIP N° 87569



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Gustavo Recana Zamudio
 RESIDENTE DE OBRA

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD) 3,131,826.10

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO I ETAPA 1,443,699.74

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO II ETAPA 1,688,126.36

PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA 75 dc

FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA 14/06/2017

FECHA DE TERMINO PROYECTADO 08/11/2017

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 86.75 %

AVANCE FISICO ACUM. PROG. 100.00%

PIM 2017 560,239.55

DEVENGADO 2017 874,302.76


DEVENGADO ACUMULADO (2017) 874,302.76

EJECUCION FINANCIERA % ACUM.-DEVENGADO 2017 0.00 %

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN REGION JUNIN - II"




ANTES

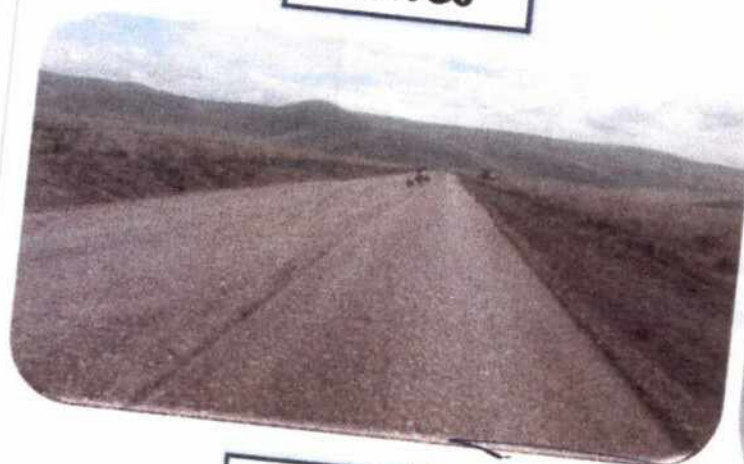

ANTES

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
 SUB GERENCIA DE OBRAS

 Gustavo Recay Zamudio
 RESIDENTE DE OBRA

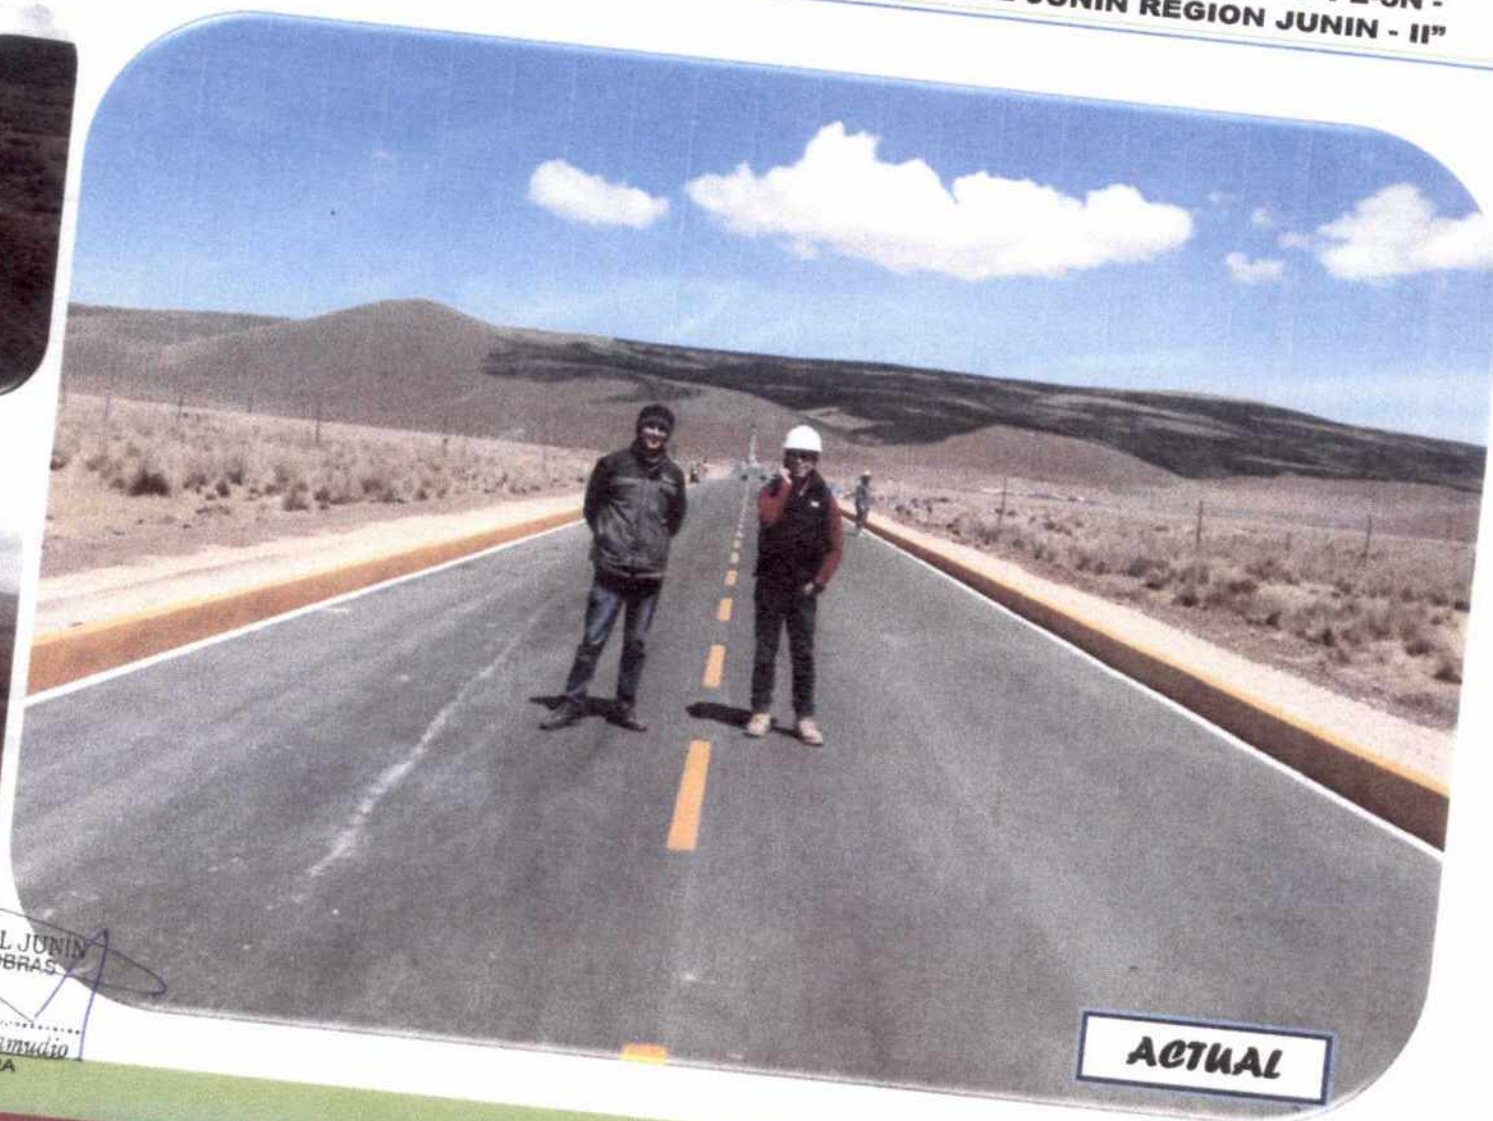

ACTUAL

INFORMACION DE OBRA

NOMBRE DE LA OBRA	MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN REGION JUNIN - II		
CÓDIGO SNIP	Nº 361405		
UNIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL JUNIN		
FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS PROPIOS		
AÑO DE EJECUCION	2017		
MONTO CONTRACTUAL	1,443,699.74		
TIEMPO DE EJECUCION	75 DIAS		
FICHA DE AVANCE DE OBRA			
	MES	AVANCE	AVANCE ACUMULADO
	JUNIO	0.70%	0.70%
	JULIO	3.22%	3.92%
	AGOSTO	30.12%	34.04%
	SEPTIEMBRE	7.26%	41.30%
	OCTUBRE	45.48%	86.78%


 GOBIERNO REGIONAL JUNIN
 SUB GERENCIA DE OBRAS
 Gerardo Acuña Zamudio
 RESIDENTE DE OBRA

Doc 2397285
Exp. 1638397

108

INFORME N° 004-2017-GRJ/SGO/RO/VARP.

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. VÍCTOR ALBERTO ROJAS PATIÑO.
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS.
REFERENCIA : MEMORANDO MÚLTIPLE N° 20-2017-GRJ/GRI

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL
SANTUARIO DEL SEÑOR DE ÁNIMAS DE PACA Y LA CASCADA PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA -
JAUJA - JUNÍN"

FECHA : Huancayo , 20 de Noviembre del 2017



Por intermedio del presente, es grato dirigirme a Ud. para saludarlo cordialmente y hacer de su conocimiento lo siguiente.

Adjunto al presente, remito a Ud., la información solicitada en el memorando de la referencia del Proyecto "Mejoramiento de los servicios turísticos de orientación y accesos al parque principal, Santuario del Señor de Ánimas de Paca y la Cascada Pacapaccha, Distrito de Paca - Jauja - Junín".

Es cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
Ing. Víctor Alberto Rojas Patiño
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: Ing. Gina Peña
HYO. 20 NOV 2017
PARA: Huancayo



NOMBRE DE LA OBRA : " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL
PARQUE PRINCIPAL, SANTUARIO DEL SEÑOR DE ANIMAS DE PACA Y LA CASCADA
PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAUJA - JUNÍN " - I ETAPA

CODIGO SNIP : 383444

UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : RECURSOS ORDINARIOS

AÑO DE EJECUCIÓN : 2017 - 2018

MONTO CONTRACTUAL : S/. 1'162,611.57 Nuevos Soles

TIEMPO DE EJECUCIÓN : 180 DIAS CALENDARIOS

FICHA DE AVANCE DE OBRA : 9.21%

INFORME DETALLADO DE GASTOS : S/. 7,930.01


CUADERNO DE OBRA :

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. Victor Alberto Rojas Patino
RESPONSABLE DE OBRA

NOMBRE DEL PIP : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL SANTUARIO D SEÑOR DE ÁNIMAS DE PACA Y LA CASCADA DE PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAUJA – JUNÍN" - PRIMERA ETAPA

O SNIP N° 383444

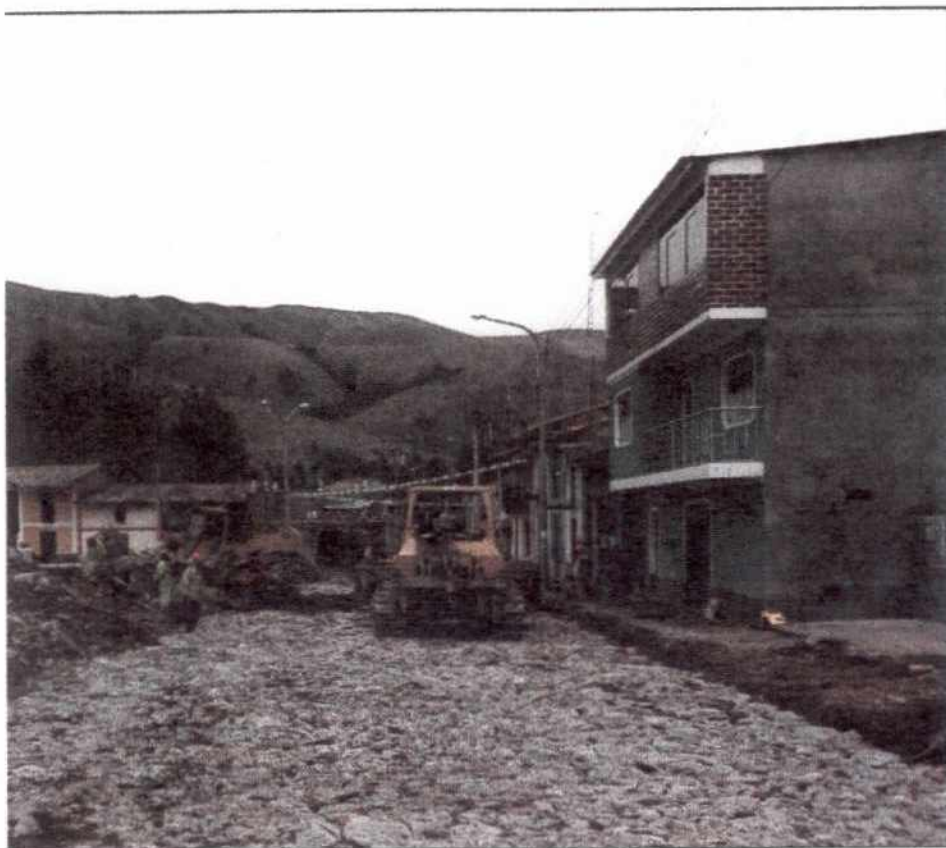

ENTO RIGIDO EN PERIMETRO DEL PARQUE Y VEREDAS

Monto de Inversión Viable	S/. 1'342,947.23
Monto de Contrato de Ejecución	
Monto Supervisión de Obra	S/. 30,352.01
VARIACIÓN	
Plazo de Ejecución de Obra (I ETAPA)	90 DIAS CALENDARI
Fecha de Inicio de Obra	14 DE OCTUBRE 20:
Fecha de Término Proyectado	11 DE ENERO DEL 20
AVANCE FISICO EJE. ACUMULADO	9.21 %
AVANCE FISICO ACUM. PROG.	10.00 %
PIM 2017	S /. 221,139.00
Devengado 2017	S/. 7,930.01
Devengado Acumulado Actual 2017	S/. 7,930.01
Ejecución Financiera % Acum. Devengado 2017	0.38%


GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS

Ing. *[Firma]*
RESIDENTE DE OBRA


OBRA : "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS DE ORIENTACIÓN Y ACCESOS AL PARQUE PRINCIPAL SANTUARIO DEL SEÑOR DE ANIMAS DE PACA Y LA CASCADA DE PACAPACCHA, DISTRITO DE PACA - JAULA - JUNÍN" - PRIMERA ETAPA



MONTO DE INVERSIÓN S/. 1'342,947.23

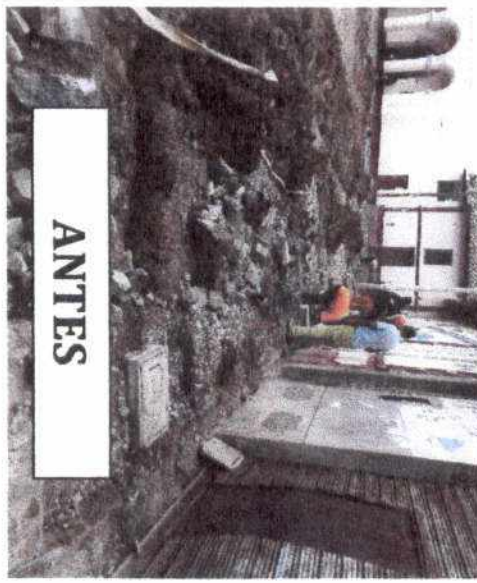

ANTES

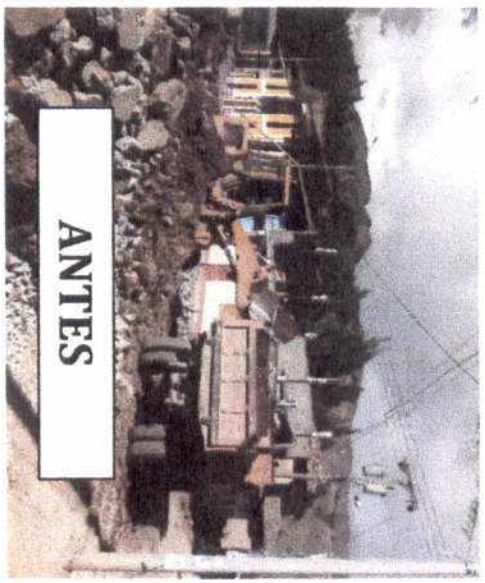

ANTES



ACTUAL

INFORME N° 001-2017-JEES/S/GRJ

A : ING° GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de obras GRJ

DE : ING° JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVÁÑEZ
Supervisor de Obra.

ASUNTO : INFORME DETALLADO DE OBRA

REF. : Obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606-30587 INTEGRADO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN".

FECHA : Huancayo, 20 de NOVIEMBRE del 2017.

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS

RECIBIDO

21 NOV 2017

Hora 12:12 Reg. Solic.

Mediante el presente reciba mis más cordiales saludos, así mismo para poder poner de conocimiento a vuestro despacho lo siguiente:

Viso: el Memorando Multiple N° 20-2017-GRJ/GRI De fecha 03 de Nov. 2017, y entregado el 15 de Nov. del 2017 al supervisor, tiene por objeto Solicito Información detallada de obra :

1.- De la Modalidad de Ejecución:

La obra esta siendo ejecutado por la modalidad Administración Directa.

2.- Generalidades de la Obra:

Obra : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606-30587 INTEGRADO DE SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN PROVINCIA DE JUNIN".

CODIGO Snip : 305655

Valor Referencial	: S/. 858,690.11 Soles
Factor de Relación	: 1
Entrega de Terreno	: 19 de Julio del 2016
Entrega de Exp. Técnico	: 19 de Julio del 2016
Designación Supervisor	: 23 de Agosto del 2016
Supervisor de Obra	: ING° JUAN EFRAIN EIZAGUIRRE SANTIVÁÑEZ
Residente de Obra	: ARQ° ARACELY GARCIA HIDALGO
Adelanto Directo	: No se Solicito
Inicio de Obra	: 19 de Julio del 2016
Plazo de Ejecución	: 120 días calendarios.
Termino Programado	: 19 de Noviembre del 2016
Ampliación de Plazo N° 01	: 75 días
Ampliación de Plazo N° 02	: 81 días
Ampliación de Plazo N° 03	: 69 días
Ampliación de Plazo N° 04	: denegada
Ampliación de Plazo N° 05	: 77 días
Termino Real de Obra	: 15 de Setiembre del 2017
Avance de obra mensual	: 0 %
Avance de obra Acumulado:	100.00 %
Avance de obra adicional N° 01	: 100.00 %
Avance de obra adicional N° 02	: 100.00 %
Avance de obra Acumulado Adicional N° 01	: 100.00 %
Presupuesto de supervisión	: s/. 33,400.00

INFORME MENSUAL SUPERVISION GRJ

Resumen de presupuestos asignados:

VARIACION POR ADICIONAL DE OBRA			
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO			
PIP VIABLE	EXPEDIENTE	PRESUPUESTO ADICIONAL N°1	PRESUPUESTO ADICIONAL N° 2
S/. 667,996.20	S/. 858690.11	S/. 73,498.39	S/. 177,008.99

Presupuesto total : s/. 1'109,197.49

Observaciones:

La obra se encuentra culminada al 100.00 %

:

La

Es cuanto cumpla con informar

Atentamente

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ing. Juan E. Cárdenas de Santayán
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 74352

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: ING. PETA

HYO. 21 NOV 2017

PARA: Su atención



FICHA TECNICA

1 ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL JUNIN	
2 Codigo SNIP DE LA OBRA O ESTUDIO	305655	
3 FUNCION		
4 META	038	
5 DENOMINACION DE LA OBRA:	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606-30587 INTEGRADO SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN	
6 OBJETO DE LA OBRA	CONSTRUCCION DE UNA INFRAESTRUCTURA APORTICADA DE DOS NIVELES, PARA SEIS AULAS, INCLUYE CAJA DE ESCALERA, CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS, PARA NIÑAS, NIÑOS Y PROFESORES..	
7 UBICACION GEOGRAFICA	LUGAR: BARRIO SAN CRISTOBAL PROVINCIA: JUNIN PROVINCIA: JUNIN REGION: JUNIN	
8 MONTO DE APROBACION DEL PERFIL TECNICO	S/.	667,996.20
9 PRESUPUESTO DEL EXP. TECNICO	S/.	858,690.11 R.G.R.I. N° 158-2016-GR-JUNIN/GRI
AULAS	S/.	476,794.54
SERVICIOS HIGIENICOS	S/.	97,592.76
EQUIPAMIENTO	S/.	40,500.00
COSTO DIRECTO	S/.	614,887.30
GASTOS GENERALES (15%)	S/.	92,233.10
IGV (18%)	S/.	110,679.71
PRESUPUESTO BASE	S/.	817,800.11
SUPERVISION (5%)	S/.	40,890.00
PRESUPUESTO TOTAL	S/.	858,690.11
10 PRESUPUESTO ANALITICO ASIGNADO		
11 FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS	
12 MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA	
13 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	360 DIAS CALENDARIOS	
14 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	19 DE JULIO DEL 2016	
15 FECHA DE INICIO DE OBRA	19 DE JULIO DEL 2016	
16 FECHA DE TERMINO DE OBRA PROGRAMADO	10 DE SETIEMBRE DEL 2017	
17 AMPLIACION DE PLAZO N° 01		
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 01	77 DIAS - RESOLUCION GERENCIAL N° 23-2017-GRJ/GGR	
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	31 DE ENERO DEL 2017	
PARALIZACION DE OBRA	36 DIAS (DEL 1 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DEL 2017)	
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 02	81 DIAS - RESOLUCION GERENCIAL N°118-2017-GRJ/GGR	
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	22 DE ABRIL DEL 2017	
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 03	69 DIAS - RESOLUCION GERENCIAL N°207-2017-GRJ/GGR (8 DE MAYO DEL 2017)	
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	30 DE JUNIO DEL 2017	
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 04	77 DIAS - RESOLUCION GERENCIAL	
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	10 DE SETIEMBRE DEL 2017	
18 ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/.	73,498.39 NUEVOS SOLES.- RESOLUCION GERENCIAL N° 154-2017-G.R.-JUNIN/GRI
ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/.	177,008.90 NUEVOS SOLES.- RESOLUCION GERENCIAL N° 154-2017-G.R.-JUNIN/GRI
19 NOMBRE DEL PROYECTISTA DEL EXPEDIENTE TECNICO	ARQ. JOSE SUASNABAR ASTETE CAP N° 5355	

20 NOMBRE DEL RESIDENTE
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL RESIDENTE

ARQ. ARACELY GARCIA HIDALGO
20092757

CAP N° 8056

21 NOMBRE DEL SUPERVISOR
DOCUMENTO DE IDENTIDAD DEL SUPERVISOR

ING. JUAN EIZAGUIRRE SANTIVANEZ

CIP N° 74352

21 MONTO EJECUTADO PRESUPUESTAL

1.109.197.49

23 ANOTACIONES DE OBRA

LA OBRA SE HA CULMINADO EL 10 DE SETIEMBRE DEL 2017 EL ESTADO ACTUAL DE LA OBRA ES CULMINADA EN ESPERA DE RECEPCION E INAGURACION.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. Juan E. Eizaguirre Santivanez
SUPERVISOR DE OBRA
CIP 74352

OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 606 - 30587 INTEGRADO SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGIÓN JUNIN"

CODIGO SNIP : 305655

AHORA

ANTES



INICIO



MONTO DE INVERSION VIABLE 1,075,797.49

MODALIDAD DE EJECUCION : ADMINISTRACION DIRECTA

SUPERVISION 33,400.00

PLAZO DE EJECUCION DE OBRA 360 DIAS

FECHA DE INICIO DE OBRA 19/07/2016

FECHA DE CULMINACION 10/09/2017

AVANCE FISICO EJEC. ACUM. 100%

EJECUCION FINANCIERA 100%

OBSERVACION : OBRA CULMINADA

Doc 2397318
Exp 1638422

99

INFORME N° 147- 2017 GRJ/GRI/SGO/RO-IMC

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub. Gerente de Obras

De : ING. INES MELENDEZ CASTRO
Residente de Obra.

Assunto : REMITO INFORMACION PARA LA AUDIENCIA.

OBRA : "MEJORAMIENTO DE PISTA Y VEREDAS DE LA AVENIDA CENTENARIO,
AVENIDA QUILCAS, TRAMO CARRETERA CENTRAL - CALLE UNION
JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y
QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN" II ETAPA

FECHA : Huancayo, 20 de noviembre del 2017



Por medio del presente me dirijo a Ud. con el fin de remitir a su despacho, la información Requerida para la Primera Audiencia Regional de la obra en referencia.

Es cuanto Informo Para los fines pertinentes.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PAGE A: Ing. Gino Penar
HYO., 20 NOV 2017
PARA: Afuencan

C.c.
Archivo



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO: CARRETERA CENTRAL CALLE UNION JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" II ETAPA



MONTO DE INVERSION : S/. 2,150,250.05



[Handwritten signature]

88
86

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO: CARRETERA CENTRAL CALLE UNION JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN" II ETAPA



CODIGO SNIP N° 322249



MONTO DE INVERSIÓN VIABLE	S/. 2,150,250.05
MONTO ASIGNADO AL 2017	S/. 2,150,250.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 49,580.00
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	180 dc
AMPLIACION DE PLAZO	53 dc
FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA	13/03/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	08/09/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION	31/10/2017
AVANCE FISICO EJEC. ACUM. OCTUBRE	100%
AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE	100 %
DEVENGADO ACUMULADO (2017)	2,126,000.00
EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2017	98.87%
% ACUM.-DEVENGADO	

ING. NÉS C. P. BELLO CASTRO
EL JUEZ DE PAZ

Doc 2397334
Exp 1638436

96

INFORME N° 148- 2017 GRJ/GRI/SGO/RO-IMC

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub. Gerente de Obras

De : ING. INES MELENDEZ CASTRO
Residente de Obra.

Assunto : REMITO INFORMACION PARA LA AUDIENCIA.

OBRA : "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR.
MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL
ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE
HUANCAYO - JUNIN"

FECHA : Huancayo, 20 de noviembre del 2017



Por medio del presente me dirijo a Ud. con el fin de remitir a su despacho, la información Requerida para la Primera Audiencia Regional de la obra en referencia.

Es cuanto Informo Para los fines pertinentes.

Atentamente;

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: *Ing. Gina Paez*
HYO., 20 NOV 2017
PARA: *[Signature]*

C.c.
Archivo



NOMBRE DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"



MONTO DE INVERSION : S/. 419,177.84



ING. INES D.P. MELENDEZ CASTRO
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PIP: "INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL JR. MANCO CAPAC TRAMO AV. COMAS - CEMENTERIO GENERAL DEL ANEXO DE COCHAS CHICO, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"



CODIGO SNIP N° 295646



MONTO DE INVERSIÓN VIABLE	S/. 419,177.84
MONTO ASIGNADO AL 2017	S/. 419,177.84
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 16,122.23
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	90 dc
AMPLIACION DE PLAZO	0 dc
FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA	02/11/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	30/01/2018
FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION	
AVANCE FISICO ELEC. ACUM. OCTUBRE	2%
AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE	2 %
DEVENGADO ACUMULADO (2017)	380,000.00
EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2017	50%
% ACUM.-DEVENGADO	

[Handwritten signature]

INFORME N° 013 - 2017 GRJ/GRI/SGO/RO-HAAC

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub. Gerente de Obras

De : ING. HENRY ANDRES ARANA CANDIOTTI
Residente de Obra.

Asunto : REMITO INFORME DETALLADO DE OBRA

REFERENCIA : MEMORANDO MULTIPLE N° 20 - 2017-GRJ/GRI
OBRA: INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN
LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO,
PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN.

FECHA : HUANCAYO, 11 DE NOVIEMBRE DEL 2017

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
RECIBIDO
13 NOV 2017
Hora..... Reg.....
Cima..... Folio **05/1014**

Por medio del presente me dirijo a Ud. Para saludarle muy cordialmente y a la vez REMITIR EL INFORME DETALLADO DE OBRA de la obra: **"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN - I ETAPA"**, la cual se viene ejecutando bajo la modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 - 2009 -GR- JUNIN Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Publicas por ejecución presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica.


Andres Arana Candiotti
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: **Ing. Gina Peña**
HYO. **13 NOV 2017**
PARA : **Audición**



FICHA TECNICA DE OBRA

1. **Entidad Ejecutora** : Gobierno Regional de Junín
2. **Código Snip** : 260387
3. **Función** : Cultura y Deporte
4. **Programa** : Deportes
5. **Sub Programa** : Infraestructura Deportiva Y Recreativa
6. **Nmonico** : 480
7. **Nombre de la Obra** : "Obra "Instalación del Polideportivo Municipal en la Ciudad de la Merced, Distrito de Chanchamayo, Provincia de Chanchamayo – Junín" - I Etapa
8. **Objeto De La Obra** : Construcción de Infraestructura Recreativa y Deportiva
9. **Ubicación Geográfica** :
 - Lugar : La Merced
 - Distrito : Chanchamayo
 - Provincia : Chanchamayo
 - Región : Junín
10. **Costo Expediente Técnico – I Etapa** : S/. 1'850,867.39 Nuevos Soles
11. **Presupuesto Analítico Pim 2017** : S/. 1'464,000.00 Nuevos Soles
12. **Fuente de Financiamiento** : Recursos Ordinarios
13. **Modalidad de Ejecución** : Administración Directa
14. **Plazo de Ejecución** : 180 Días Calendarios Según Expediente Técnico
15. **Ira. Ampliación de Plazo** : 45 Días Calendarios
16. **Fecha de Entrega de Terreno** : 05 de Mayo del 2017
17. **Fecha de Inicio de Obra** : 05 de Mayo del 2017
18. **Fecha Culminación de Obra** : 31 de Octubre del 2017
19. **Nueva Fecha de Término de Obra** : 15 de Diciembre del 2017
20. **Nº Resolución Proyecto Integral** : Resolución Gerencial Regional de Infraestructura Nº145-2017-GRJ-JUNIN/GRI del 03 de Abril del 2017


 Ing. Andres Grana Candiotti
 RES. DE OBRA

21. N° Resolución Proyecto I Etapa : Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N°176-2017-GRJ-JUNIN/GRI del 25 de Abril del 2017
22. Proyectista : Ing. Pamela Rodriguez Perez
C.I.P. N° 174854
23. Residente de Obra : Ing. Henry Andres Arana Candiotti
C.I.P. N° 103357
24. Supervisor De Obra : Ing. Alex Dirceu Orihuela Davila
C.I.P. N° 102759
25. Representante Legal : Mag. Ángel Unchupaico Canchumani


Ing. Andres Arana Candiotti
RESIDENTE DE OBRA

“INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNÍN” - I ETAPA

CODIGO SNIP N° 260387



EJECUCION DEL CAFETIN SUM - LOSA MULTIFUNCIONAL -GRASS SINTETICO


Monto de Inversión Viable	S/. 6'939,005.42
Monto de Asignado para la Ejecución	S/. 1'464,000.00
Monto Supervisión de Obra	S/. 45,143.12
VARIACIÓN	
Plazo de Ejecución de Obra	180 Días Calendarios
Fecha de Inicio de Obra	05 de Mayo del 2017
Fecha de Término Proyectado	15 de Diciembre del 2017
AVANCE FISICO EJE. ACUMULADO	30,40%
AVANCE FISICO ACUM. PROG.	67,8%
PIM 2017	S/. 1'464,000.00
Devengado 2017	S/. 781,296.11
Devengado Acumulado Actual 2017	S/. 781,296.11
Ejecución Financiera % Acum. Devengado 2017	53,4%




**"INSTALACION DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED
DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – JUNÍN" - I ETAPA**




MONTO DE INVERSIÓN S/. 1'850,867.39

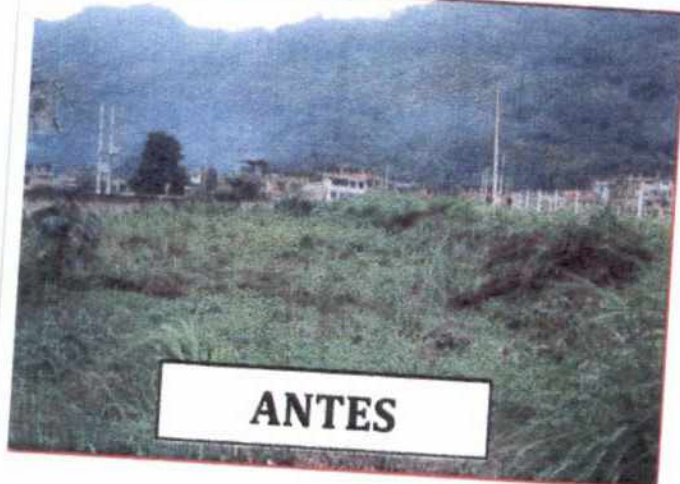

ANTES

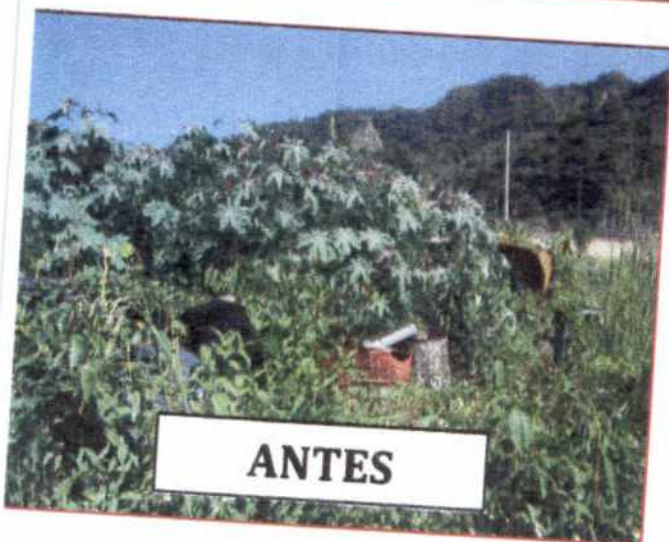

ANTES

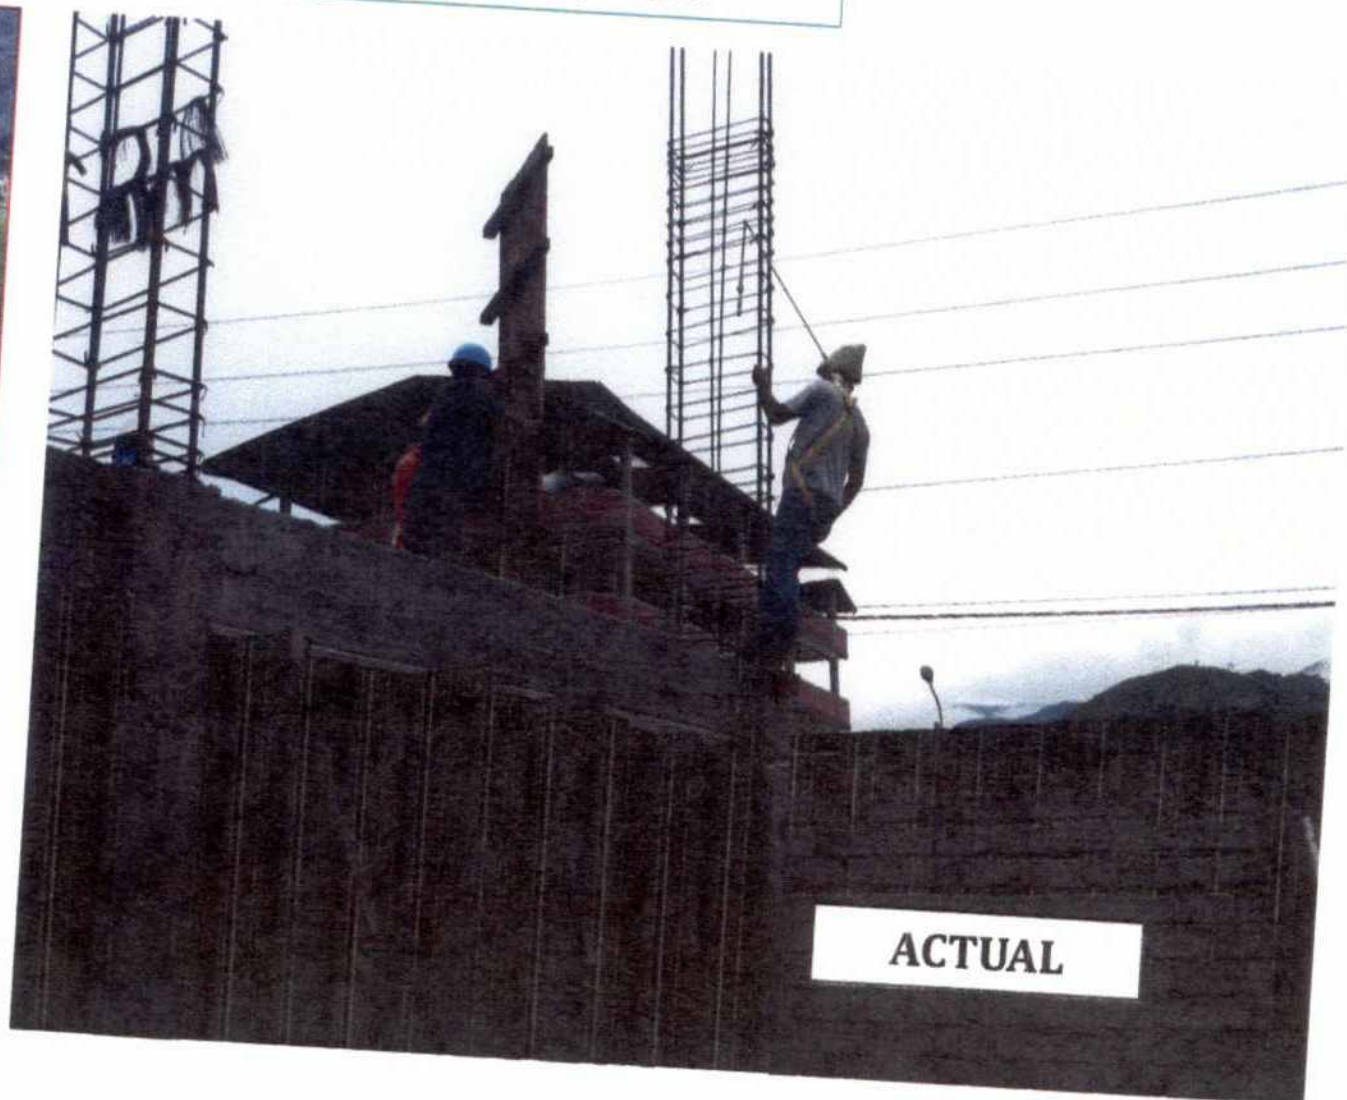

ACTUAL

INFORME N° 057 - 2017-GRJ/GRI/SGO-RO-HAAC

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerente de Obras

ASUNTO : PRESENTACION DE INFORME DETALLADO DE OBRA

REFERENCIA : **MEMORANDO MULTIPLE N° 20 -2017 -GRJ/GRI**
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO –
EL TAMBO – SAN AGUSTIN DE CAJAS – HUALHUAS – SAÑO –
QUILCAS – SAN JERONIMO DE TUNAN – INGENIO, PROVINCIA DE
HUANCAYO – JUNIN"

FECHA : Huancayo, 11 de Noviembre del 2017.

A

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente, y a la vez para presentarle el **INFORME DETALLADO DE OBRA** de la obra: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO – SAN AGUSTIN DE CAJAS – HUALHUAS – SAÑO – QUILCAS – SAN JERONIMO DE TUNAN – INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNIN", la presente obra se viene ejecutando bajo la Modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 – 2009 –GR- JUNIN Normas y Procedimientos para la Ejecución de Obras Publicas por Ejecución Presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica.



Ing. Andres Arana Candiotti
PRESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: Ing. Gina Peña

HYO., 13 NOV 2017

PARA



FICHA TECNICA DEL PROYECTO

FICHA TECNICA DE OBRA

1. ENTIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN
2. COD. SNIP : 51557
4. PROGRAMA : 033 TRANSPORTE TERRESTRE
- 5 SUB PROGRAMA : 0066 VIAS VECINALES
6. NMONICO : 0020
7. NOMBRE DE LA OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO
- EL TAMBO - SAN AGUSTÍN DE CAJAS - HUALHUAS - SAN
JERÓNIMO DE TUNAN -INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO
- JUNÍN" (PROG. 20+140 AL 24+727.56)
8. OBJETO DE LA OBRA : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO FLEXIBLE
9. UBICACIÓN GEOGRÁFICA :
- Lugar : Casacancha
- Distritos : Quilcas - Ingenio
- Provincia : Huancayo
- Región : Junín
10. COSTO EXPEDIENTE TECNICO : S/. 3'896, 021.07 Nuevos Soles
11. MONTO DEVENGADO 2016 : S/. 1'073,043.00 Nuevos Soles
12. PRESUPUESTO ANALÍTICO 2017 : S/. 2'163,722.00 Nuevos Soles
13. FUENTE DE FINANCIAMIENTO : 00 RECURSOS ODINARIOS
14. MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACION DIRECTA
15. PLAZO DE EJECUCIÓN : 180 Días Calendarios Según Expediente Técnico
16. PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO : 80 Días Cal. - RESOLUCION N° 010-2017-GRJ/GGR




Ing. Andres Arana Candiotti
RESIDENTE DE OBRA

17. SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO	: 49 Días Cal. – RESOLUCION N° 082-2017-GRJ/GGR
18. TERCERA AMPLIACION DE PLAZO	: 41 Días Cal. – RESOLUCION N° 197-2017-GRJ/GGR
19. FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	: 13 DE JUNIO DEL 2016
20. FECHA DE INICIO DE OBRA	: 14 DE JUNIO DEL 2016
21. FECHA DE CULMINACION DE OBRA	: 24 de Octubre del 2017
22. NÚMERO DE RESOLUCION	: RES.GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°121 – 2016 – G.R. – JUNIN / GRI DEL 31 - 05 - 2016
23. ESTADO ACTUAL DE LA OBRA	: CONCLUIDA AL 100%
23. PROYECTISTA	: Ing. PEINADO DE LA CRUZ RONALD - C.I.P N° 67662
24. RESIDENTE DE OBRA	: Ing. HENRY ANDRES ARANA CANDIOTTI C.I.P N° 103357
25. SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. LUDMIR PATSY ROJAS PARIONA C.I.P N° 146917


Ing. Andrés Arana Candiotti
RESIDENTE DE OBRA

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO – SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUALHUAS – SAN JERÓNIMO DE TUNAN – INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN" (PROG. 20+140 AL 24+727.56) – ULTIMA ETAPA

CODIGO SNIP N° 51577

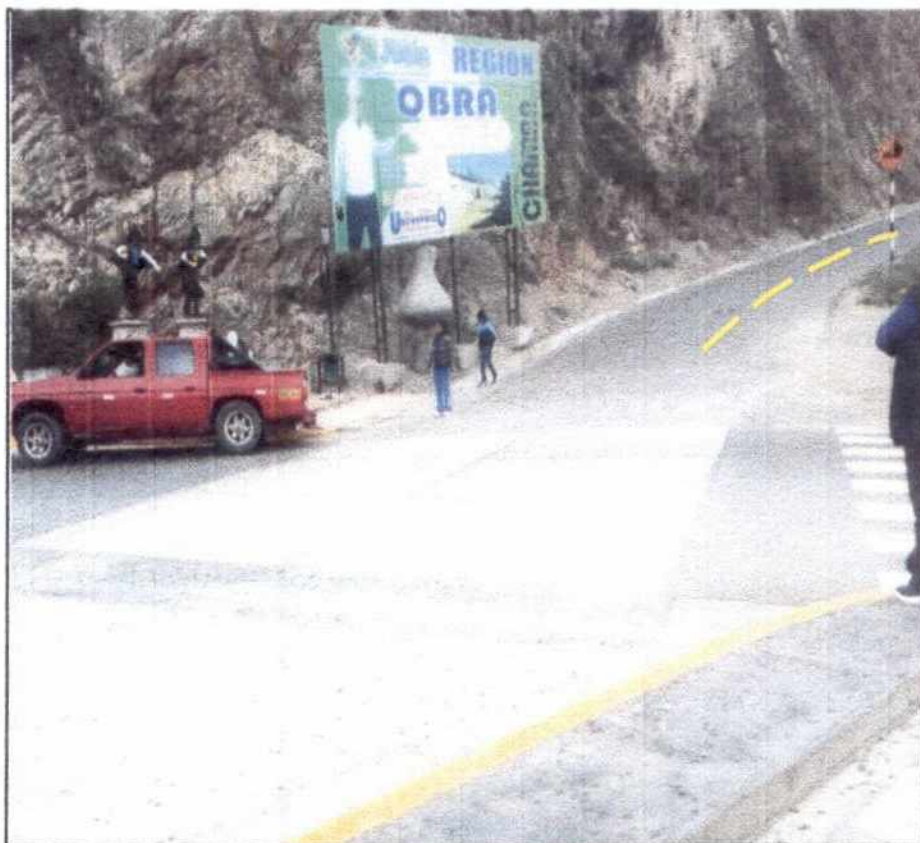

ASFALTADO DE CARRETERA


Monto de Inversión Viable	S/. 3'896,021.07
Monto de Asignado para la Ejecución	S/. 3'236,765.00
Monto Supervisión de Obra	
VARIACIÓN	$\Delta + 84.82\%$
Plazo de Ejecución de Obra	180 Días Calendarios
Fecha de Inicio de Obra	14/06/2016
Fecha de Término Proyectado	31/10/2017
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO	99.86%
AVANCE FISICO ACUM. PROG.	100.00%
PIM 2017	2' 163,722.00
Devengado 2017	S/. 1,934,296.43
Devengado Acumulado Actual 2017 Y 2016	S/. 3'007,33943
Ejecución Financiera % Acum. Devengado 2017	89,4 %




"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL HUANCAYO – EL TAMBO – SAN AGUSTÍN DE CAJAS – HUALHUAS – SAN JERÓNIMO DE TUNAN – INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN"
(PROG. 20+140 AL 24+727.56) – ULTIMA ETAPA




MONTO DE INVERSIÓN S/. 3'896,021.07

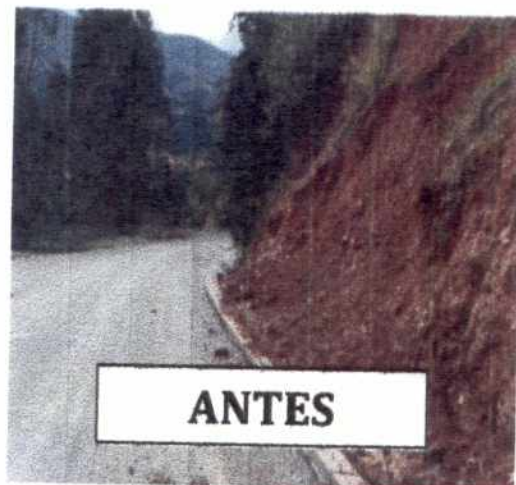

ANTES

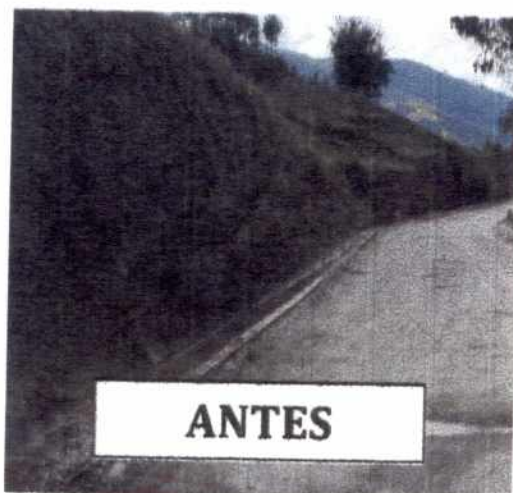

ANTES

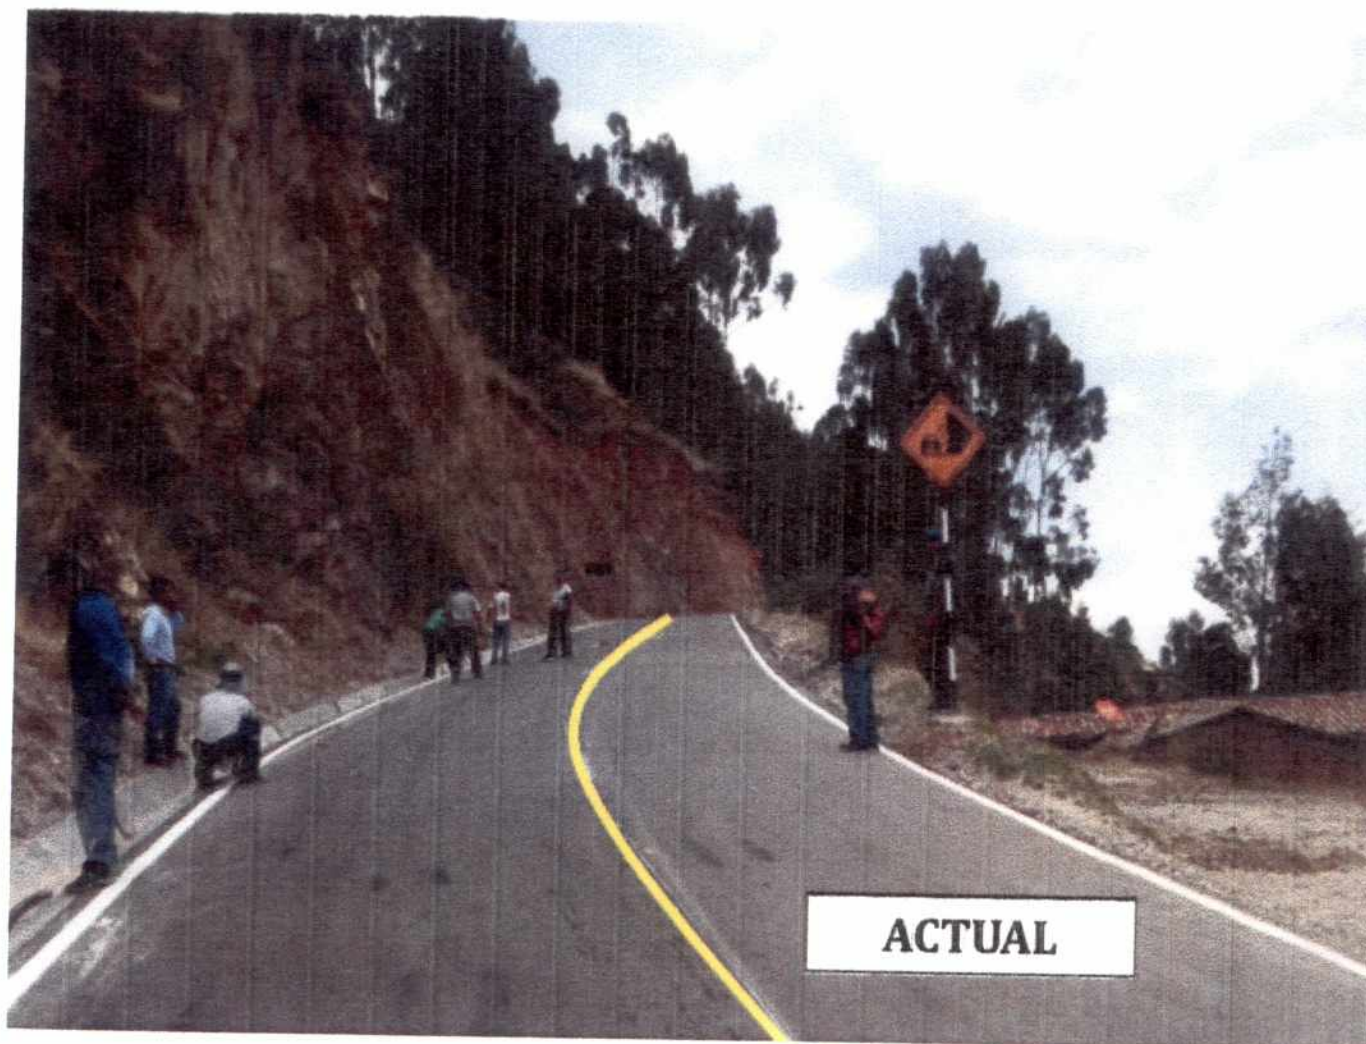

ACTUAL

INFORME Nro. -2017-GRJ/GRI/SGOP/RO

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
Sub Gerencia de Obras

DE : ING. ROLANDO CAMPOS ACEVEDO
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : presenta Informe respecto a Memorando Múltiple N° 20
-2017-GRJ/GRI

REFERENCIA : **Obra:** "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA
CIUDAD DE LA OROYA"

FECHA : Huancayo 13 de noviembre del 2017

Mediante la presente me es grato dirigirme a Usted, para expresarle mi saludo cordial y a la vez presentar el informe solicitado mediante informe N° 020-2017-GRJ/GRI hasta el mes de setiembre para su evaluación y tramite respectivo, de la obra mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado de la ciudad de la oroya.

Es cuanto informo a Usted para su conocimiento y fines pertinentes.

Atentamente.


Rolando Campos Acevedo
RESIDENTE DE OBRA


GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE AL: Ing. Peño

HYO., 13 NOV 2017

PARA: Su atención





NOMBRE DE LA OBRA :

«MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA – JUNÍN»

CODIGO SNIP

3066

UNIDAD EJECUTORA

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

: RECURSOS ORDINARIOS

AÑO DE EJECUCION

: 2016 – 2017

TIEMPO DE EJECUCION

: 360 DIAS CALENDARIOS

FICHA DE AVANCE DE OBRA

: 100% AVANCE FISICO

INFORME DETALLADO DE GASTOS

: S/. 5,775,498.96


Rolando Campos Acevedo
RESPONSABLE DE OBRA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA"

MONTO DE INVERSIÓN: S/. 6,599, 028.90


PROCESO

PROCESO

ACTUAL

CODIGO SNIP

3066

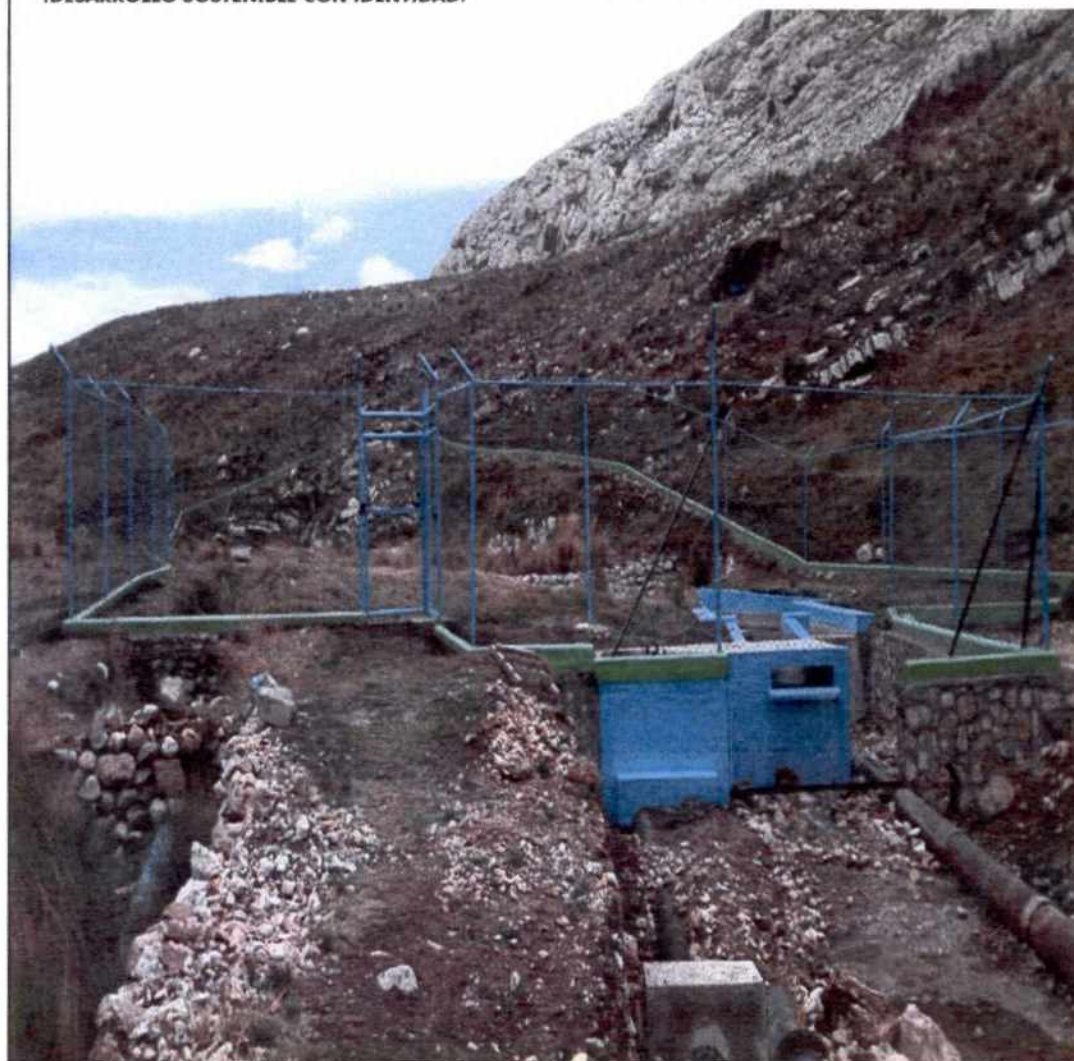

CAPTACION CUCHIMACHAY

Monto de Inversion Viable	37, 638,716.00
Monto de Contrato de Ejecucion	6,599,028.90
Monto Supervision de Obra	373,529.94
VARIACION	
Plazo de ejecucion de obra	360 dias calendarios
Fecha de inicio de obra fisica	06 de febrero del 2016
Fecha de termino Proyectado	28 de octubre del 2017
AVANCE FISICO EJECUTADO (A SETIEMBRE)	99.59%
AVANCE FISICO ACUMULADO PROGRAMADO A la fecha de la se	100%
PIM 2017	3, 367,691.21
Devengado 2017	2,917,691.21
Devengado Acumulado Actual 2017	5,775,498.96
Ejecucion Financiera % Acum.-devengado 2017	87.52%



INFO OBRAS

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017

1.- ENTIDAD EJECUTORA	GOBIERNO REGIONAL JUNIN
2.- CODIGO SNIP DE LA OBRA	3066
3.- COMPONENTE	AGUA POTABLE
4.- META	
5.- DENOMINACION DE LA OBRA	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA.
6.- OBJETO DE LA OBRA	.- Construccion de Captacion, Camara Rompe Presion y otras obras de concreto. .- Excavacion de zanja y puesta de tuberia de PVC de 250 mm Clase 10 y Clase 15 tambien tuberia de hierro ductil de DN 250 mm para la linea de conduccion Cuchimachay
7.- UBICACIÓN GEOGRAFICA	DISTRITO: YAULI PROVINCIA: OROYA REGION: JUNIN
8.- MONTO DE APROBACION DEL PERFIL TECNICO	S/. 37,638,716.00
9.- MONTO DE APROBACION DE EXPEDIENTE TECNICO	S/. 6,599,028.90 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 317-2015-GR-JUNIN/GRI
10.- MONTO DE DISGREGADO DE EXPEDIENTE	S/. 6,599,028.90 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 324-2015-GR-JUNIN/GRI Fecha: 20 de Octubre 2015
Disgregado de componente:	
COSTO DIRECTO	S/. 5,659,544.51 Nuevos soles,
GASTOS GENRALES	S/. 565,954.45 Nuevos soles,
TOTAL COSTO DIRECTO	S/. 6,225,498.96 Nuevos soles,
SUPERVISION	S/. 373,529.94 Nuevos soles,
TOTAL PRESUPUESTADO	S/. 6,599,028.90 Nuevos soles,
10.- MONTO DE DISGREGADO DEL EXPEDIENTE TECNICO DE CULMINACION	S/. 2,000,000.00 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 324-2015-GR-JUNIN/GRI Fecha: 05 de Noviembre 2015
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 1,886,792.45 Nuevos soles,
SUPERVISION	S/. 113,207.55 Nuevos soles,
TOTAL PRESUPUESTADO	S/. 2,000,000.00 Nuevos soles,
11.- MONTO DE EXPEDIENTE TECNICO DE SALDO DE CULMINACION	S/. 6,562,062.34 RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 022-2016-GR-JUNIN/GRI Fecha: 03 de Febrero 2016
PRESUPUESTO DE OBRA	S/. 6,190,624.85 Nuevos soles,
SUPERVISION	S/. 371,437.49 Nuevos soles,
TOTAL PRESUPUESTADO	S/. 6,562,062.34 Nuevos soles,


GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS
Rolando C. Campos Acevedo
JEFE DE OBRA



INFO OBRAS

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017

11.- PRESUPUESTO ASIGNADO	S/. 6,599,028.90
12.- FUENTE DE FINANCIAMIENTO	RECURSOS ORDINARIOS
13.- MODALIDAD DE EJECUCION	ADMINISTRACION DIRECTA
14.- PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	330 DIAS CALENDARIOS
15.- FECHA DE ENTREGA DE TERRENO	09 DE FEBRERO DEL 2016
16.- FECHA DE INICIO DE OBRA	09 DE FEBRERO DEL 2016
17.- FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	09 DE ENERO DEL 2017
NUEVA FECHA DE TERMINO PROGRAMADO	28 DE OCTUBRE DEL 2017
18.- AMPLIACION DE PLAZO	
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 01	122 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 033 - 2017-GR/GGR
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	09 DE JUNIO DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 02	90 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 245-2017-GRJ/GGR
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	08 DE AGOSTO DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 03	32 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 344-2017-GR-JUNIN/GGR
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	08 DE SETIEMBRE DEL 2017
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 04	20 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 372-2017-GR-JUNIN/GGR
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	
PLAZO DE EJECUCION DE AMPLIACION N° 05	29 DIAS CALENDARIOS RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 451-2017-GR-JUNIN/GGR
NUEVA FECHA DE TERMINO DE OBRA	08 DE NOVIEMBRE DEL 2017
19.- ADICIONAL DE OBRA N° 01	S/. 861,259.66 RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL N° 157-2017-G.R.JUNIN/GRI
ADICIONAL DE OBRA N° 02	S/. 107,965.37 RESOLUCION GERENCIA GENERAL REGIONAL EN TRAMITE
20.- NOMBRE DEL PROYECTISTA DEL EXP. TEC.	ING. CHARLES SALOME NUÑEZ CIP N° 91668
21.- NOMBRE DEL RESIDENTE DE OBRA	ING. ROLANDO CAMPOS ACEVEDO CIP N° 114999
DNI DEL RESIDENTE	DNI N° 20015781 CELULAR 964465740
22.- NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA	ING. ENRIQUE EDUARDO MIRANDA CALDAS CIP N° 70746
DNI DEL SUPERVISOR	DNI N° 32927180 CELULAR 943664835
23.- NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE OBRA	MARIA DEL CARMEN CALDERON GONZALES
DNI DEL ADMINISTRADOR	DNI N° 44483390 CELULAR 964993388
24.- NOMBRE DEL AUXILIAR DE OBRA	
DNI DEL AUXILIAR	DNI N° CELULAR
25.- NOMBRE DEL ALMACENERO DE OBRA	EDISON HUAMAN TIMOTEO
DNI DEL ALMACENERO	DNI N° 21259697 CELULAR 991846612


 Rolando Campos Acevedo
 RESIDENTE DE OBRA

INFO OBRAS

FICHA TECNICA DE OBRA: SETIEMBRE 2017

26.- RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA

VALORIZACION N° 18 - MES DE SETIEMBRE					
SEG. EXP. TEC	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	SALDO	
COSTO DIRECTO	S/. 5,659,544.51	S/. 5,607,658.40	S/. 29,080.96	S/. 5,636,739.36	S/. 22,805.15
GASTOS GENERALES	S/. 565,954.45	S/. 560,765.84	S/. 2,908.10	S/. 563,673.94	S/. 2,280.51
TOTAL COSTO DIRECTO	S/. 6,225,498.96	S/. 6,168,424.24	S/. 31,989.06	S/. 6,200,413.30	S/. 25,085.66
SUPERVISION	S/. 373,529.94	S/. 370,105.45	S/. 1,919.34	S/. 372,024.80	S/. 1,505.14
TOTAL PRESUPUESTADO	S/. 6,599,028.91	S/. 6,538,529.69	S/. 33,908.40	S/. 6,572,438.09	S/. 26,590.80
% AVANCE FISICO EJECUTADO		99.08%	0.51%	99.60%	0.40%
AVANCE FISICO PROGRAMADO	S/. 6,599,028.91	S/. 5,294,744.58	S/. 364,775.00	S/. 5,659,519.58	S/. 939,509.33
% AVANCE FISICO PROGRAMADO		93.55%	6.45%	100.00%	0.00%

27.- ESTADO SITUACIONAL DE OBRA

SE CULMINO CON LA CONSTRUCCION DE DADOS DA ANCLAJE Y VIGAS DE APOYO PARA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL K -9 EN LA PROGRESIVAS EN CRUCE POR TUNEL Y SECTOR BAJADA CERRO ICHU HUACTA , TAMBIEN SE ESTA CONCLUYENDO EJECUCION DE LAS PARTIDAS EN LINEA DE ADUCCION COMO OBRA ADICIONAL EN LINEA DE ADUCCION EN LOS SECTORES TUPAC AMARU, RESERVORIO METALICO Y TAMBIEN SE REALIZO INSTALACION DE VALVULAS DE AIRE Y VALVULAS DE PURGA EN LINEA DE CONDUCCION CUCHIMACHAY. SE TIENE UNA ADICIONAL DE OBRA CUYA VALORIZACION ACUMULADA 94.91 %

28.- OBSERVACIONES Y COMENTARIOS

DEBIDO A LA INOPERANCIA DE LA EMPRESA EMSAPA POR NO CONSEGUIR EL PASE DE FERROVIAS Y A LA EJECUCION DE OBRAS ADICIONALES N° 02, LA OBRA TUVO UN RETRASO EN LA CONSTRUCCION DE DADOS Y VIGAS DE APOYO EN TUNEL Y HA OBLIGADO A SOLICITAR UNA QUINTA AMPLIACION DE PLAZO POR 29 DIAS LA CUAL ESTA EN PROCESO DE APROBACION Y CONCLUYE EL PLAZO EL DIA 28 DE OCTUBRE DEL 2017 POR QUE EL AVANCE DE OBRA NO ES AL 100% EN LA INSTALACION DE LA TUBERIA DE HIERRO DUCTIL HAY UN RETRASO FISICO DE OBRA EL CUAL SE REFLEJA EN LA VALORIZACION PRESENTADA A PESAR DE EJECUTAR OTROS TRABAJOS LOS CUALES ESTAN PROGRAMADOS.

29.- FOTOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO


 Rolando C. Campos Acovedo
 JEFE DE OBRA

INFORME N° 025 -2017-GRJ/GRI /SGO-RO/RMAH

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. RAUL MAX AYLLON HILARIO
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO: INFORMACION DETALLADA DE OBRA Y/O ACTIVIDADES

REF. : **OBRA:** "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION - CONDORCOCHA -
CARIPA, DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN".

FECHA : Tarma, 13 de Noviembre del 2017



=====

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el informe detallado de obra y/o actividades de obra en referencia; ejecutado bajo la modalidad de Administración Directa y en cumplimiento de la Resolución N° 195-88-CG de la Contraloría General de la República y es como sigue:

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios.

Atentamente.


GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
Ing. Raul M. Ayllon Hilario
RESIDENTE DE OBRA

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: Ing. Peña

HYO. 13 NOV 2017

PARA: su denuncia



1. DATOS DE OBRA:

OBRA : "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION -
CONDORCOCHA - CARIPA, DISTRITO DE LA UNIÓN LETICIA,
PROVINCIA DE TARMA - JUNÍN"

UBICACIÓN : ANEXO DE JACAHUASI
DISTRITO : TARMA
PROVINCIA : TARMA
REGIÓN : JUNÍN

CODIGO SNIP : N° 213508
UNIDAD EJECUTORA : GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.
MODALIDAD DE EJECUCIÓN : ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
PRESUPUESTO SEGÚN EXP. TÉCNICO : S/. 3' 818.622.60 NUEVOS SOLES.
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA : 180 DÍAS CALENDARIOS
FECHA DE INICIO DE OBRA : 05 DE SETIEMBRE DEL 2016.
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 : 60 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 36 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 : 52 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 04 : 39 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 05 : 18 DÍAS CALENDARIOS
AMPLIACION DE PLAZO N° 06 : 75 DÍAS CALENDARIOS
FECHA NUEVA DE CULMINACION : 12 DE DICIEMBRE DEL 2017

RESIDENTE DE OBRA : Ing. SIDMAN RAYNOZO BASTIDAS C.I.P N° 177200
RESIDENTE DE OBRA : Ing. SIMEON E. CHAVEZ PANTOJA C.I.P N° 107396
RESIDENTE DE OBRA : Ing. RAUL M. AYLLON HILARIO C.I.P N° 93558

SUPERVISOR DE OBRA : Ing. CARLOS CACHI SANCHEZ C.I.P N° 62414
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. ABEL YANGALI PAUCAR C.I.P N° 107739
SUPERVISOR DE OBRA : Ing. JOSE A. TIPISMANA MENDOZA C.I.P N° 74735

REPRESENTANTE LEGAL : MAG. ÁNGEL UNCHUPAICO CANCHUMANI



CONTROL DE AVANCE FISICO

RESUMEN DE VALORIZACION DE OBRA EJECUTADO

EXPEDIENTE TECNICO APROBADO

Costo Directo Total	S/.
Gastos generales 10%	S/.
Sub Total	S/.
Supervisión 5%	
Costo Total del Proyecto	S/.
% Avance Físico Ejecutado	

VALORIZACION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017					
SEG. EXP.	AÑO 2016	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
	3,306,166.75	640,944.77	963,832.50	138,338.50	1,102,171.00
	330,616.68	64,094.48	96,383.25	13,833.85	110,217.10
	3,636,783.43	705,039.25	1,060,215.75	152,172.35	1,212,388.10
	181,839.17	35,251.96	53,010.79	7,608.62	60,619.41
	3,818,622.60	740,291.21	1,113,226.54	159,780.97	1,273,007.51
	19.39%	29.15%	4.18%	33.34%	47.28%
	19.39%	48.54%	52.72%	52.72%	47.28%

RESUMEN DE VALORIZACION DE ADICIONAL DE OBRA N° 01

EXP. TECNICO DE ADICIONAL N°01 APROBADO

Costo Directo Total	S/.
Gastos generales 10%	S/.
Sub Total	S/.
Supervisión 5%	
Costo Total del Proyecto	S/.
% Avance Físico Ejecutado	

VALORIZACION ADICIONAL N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017					
SEG. EXP.		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
	465,401.52	-	395,699.68	395,699.68	69,701.84
	46,540.15	-	39,569.97	39,569.97	6,970.18
	511,941.67	-	435,269.65	435,269.65	76,672.02
	25,597.08	-	21,763.48	21,763.48	3,833.60
	537,538.75	-	457,033.13	457,033.13	80,505.62
	0.00%	0.00%	85.02%	85.02%	14.98%
	0.00%	0.00%	85.02%	85.02%	14.98%

RESUMEN DE VALORIZACION DE DEDUCTIVO DE OBRA N° 01

EXP. TECNICO DEDUCTIVO N°01 APROBADO

Costo Directo Total	S/.
Gastos generales 10%	S/.
Sub Total	S/.
Supervisión 5%	
Costo Total del Proyecto	S/.
% Avance Físico Ejecutado	

VALORIZACION DEDUCTIVO N° 01 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017					
SEG. EXP.		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	ACUMULADO	SALDO
	117,290.08	-	117,290.08	117,290.08	-
	11,729.01	-	11,729.01	11,729.01	-
	129,019.09	-	129,019.09	129,019.09	-
	6,450.95	-	6,450.95	6,450.95	-
	135,470.04	-	135,470.04	135,470.04	-
	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%
	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	0.00%

CONTROL DE AVANCE FINANCIERO

Avance Financiero de obra en % $\frac{\text{VALORIZACIÓN COSTO DIRECTO X 100}}{\text{COSTO DIRECTO DEL PRESUPUESTO}}$

Avance financiero de la obra al 31 de diciembre 2016 S/. 1'548,614.58 = 46.84%

Avance financiero de obra al 30 de junio 2017-(782,597.12) = S/. 2'512,722.39 = 70.60%

Avance financiero de obra de mes actual S/. 27,751.17 = 1.10%


Avance financiero acumulado S/. 2'540,473.56 = 71.70%

[Firma]
Rafael M. Ayllón Meléndez
RESIDENTE DE OBRA
CIP 83558


OBRA: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION - CONDORCOCHA -
CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

PRESUPUESTO EXPEDIENTE : S/. 3,818,622.60


Nº207-2016-G.R.-JUNIN/GRI, fecha 17 de agosto del 2016

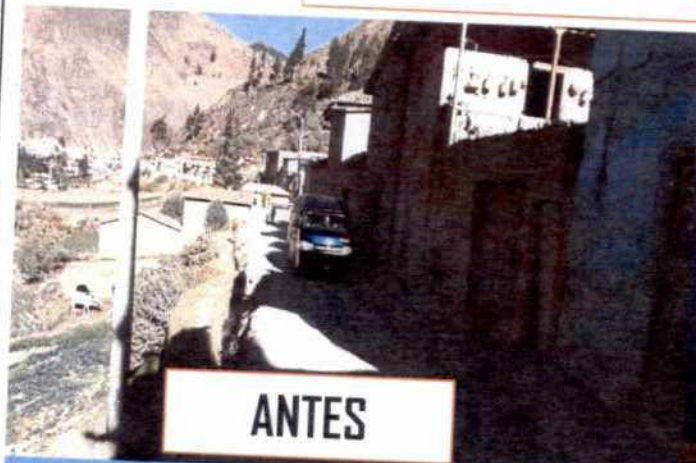

ANTES

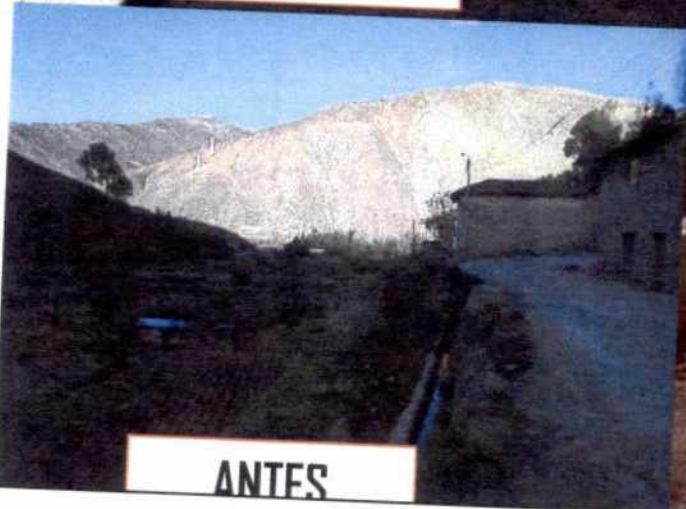

ANTES

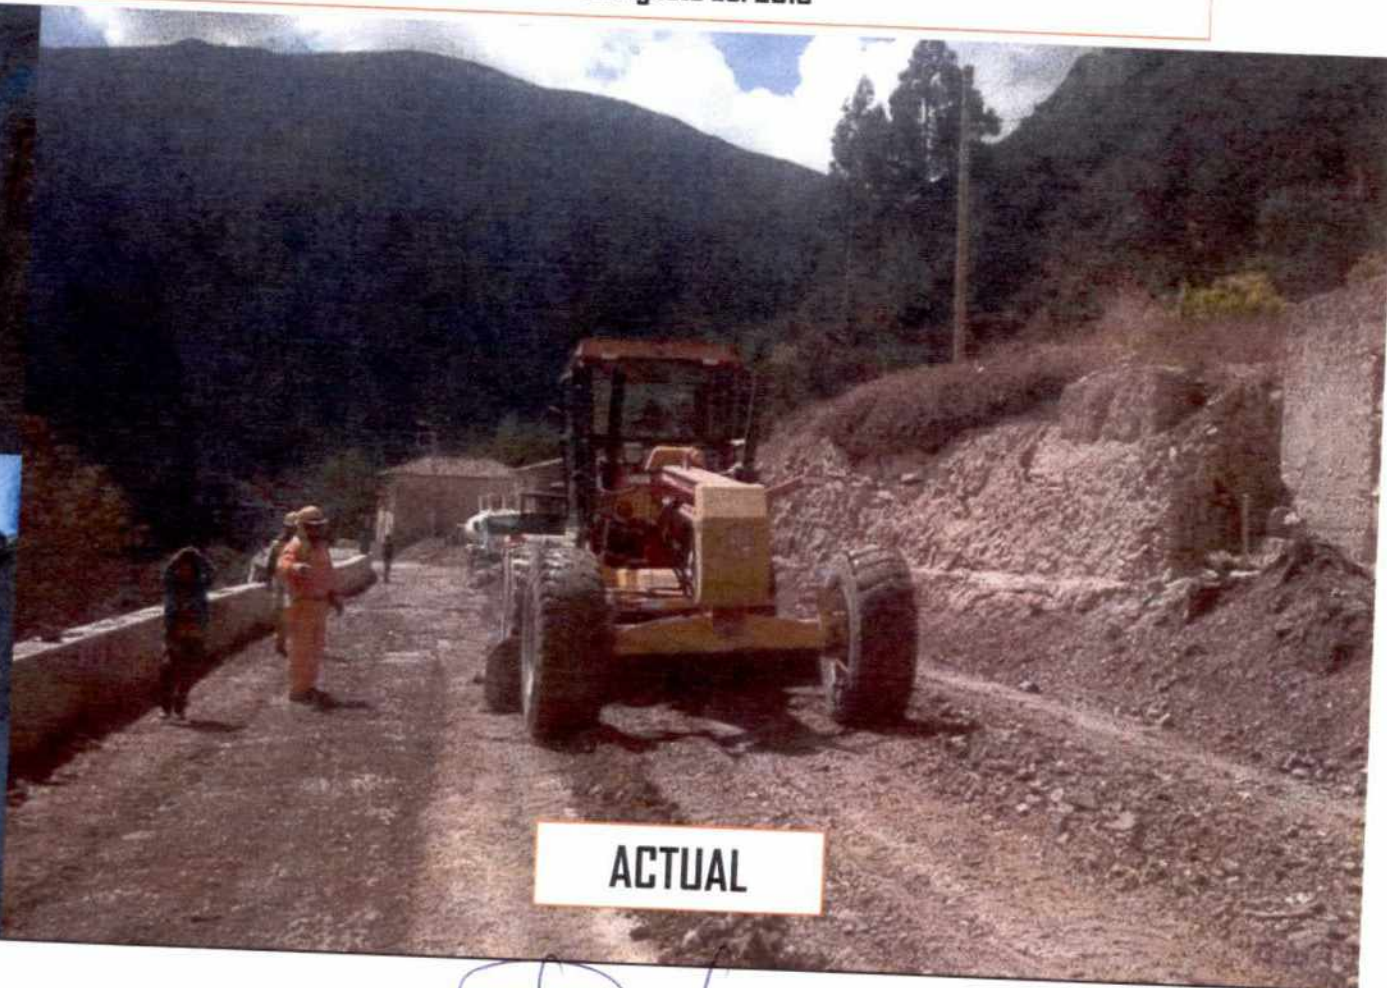

ACTUAL

[Handwritten signature]
ING. Raul M. Ayllon Huan
PRESIDENTE DE OBRA

**NOMBRE DEL PIP: "OBRA" MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNIÓN -
CONDORCOCHA – CARIPA DISTRITO LA UNION LETICIA, PROVINCIA DE TARMA – JUNIN"**

CODIGO SNIP N° 213508



CONFORMACION DE BASE GRANULAR E= 0.20 MTS

Monto de Inversión Viable	31,418,069
Monto Exp. Tec. Saldo	3,818,622.60
Plazo de ejecución de obra (según expediente Técnico Saldo)	180 día c
Ampliación de Plazo N° 06	75 día c
Fecha de inicio de obra física	05/09/2016
Fecha de termino proyectado	12/12/2017
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO al 10/11/2017	52.72% 1,273,007.51
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO a la fecha sesión GRI	52.72% 1,273,007.51
PIM 2017	1,804,297.00
DEVENGADO 2017 MES DE OCTUBRE	S/. 27 751.00
SALDO A DEVENGADO	S/. 840 869.00
SALDO A CERTIFICAR	S/. 31 931.00
Ejecucion Financiera % acum.- Devengado 2017	71.70% S/. 2'540,473.56
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO ADICIONAL N° 01 al 10/11/2017	85.02% 457,033.13
PIM 2017	1,804,297.00

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Ing. Raúl M. Ayllón Matarín
PRESIDENTE DE OBRA
2016

Doc 2389722
Exp 1633722



CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION
DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA,
PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN

INFORME MENSUAL N° 34 - 2017- GRJ/GRI/SGO-YAAJ/RO

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA SUB GERENTE DE OBRAS

ASUNTO : INFORME DETALLADO DE OBRA

REFERENCIA : OBRA: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

FECHA : Huancayo 13 de Noviembre del 2017

Es grato dirigirme a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez presentarle el Informe detallado en referencia al Memorando Múltiple N°20-2017-GRJ/GRI de la obra: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN", la cual se viene ejecutando bajo la modalidad de Administración Directa, bajo la Directiva 005 – 2009 –GR- JUNIN Normas y Procedimientos para la ejecución de Obras Publicas por ejecución presupuestaria Directa en el Gobierno Regional Junín y la Resolución N° 195-88 de la Contraloría de la Republica. Se adjunta Informe detallado según requisito requerido.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para expresarle a Ud. las consideraciones especiales y estima personal.

Atentamente.

C.c.

Archivo

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

[Firma]
Arq. Yuber A. Auqui Janampa
RESIDENTE DE OBRA



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: Ing. Gino Rina

HYO., 13 NOV 2017

PARA: *[Firma]*

[Firma]

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE,
 DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

CODIGO SNIP N° 361730

UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: RECURSOS ORDINARIOS



Monto de Inversión Viable	1,027,792.88
Monto de Contrato de Ejecución	916,970.00
Monto Supervisión de obra	43,430.40
VARIACION	
Plazo de Ejecución de obra	217 días
Fecha de inicio de obra física	12/04/2017
Fecha de termino de proyecto	14/11/2017
AVANCE FISICO EJECA. ACUM. (A OCTUBRE)	58.75%
AVANCE FISICO ACUM. A la fecha de la sesión CRI	58.75%
PIM 2017	1,053,970.00
Devengado 2017	645,491.71
Ejecución Financiera % Acum.-devengado 2017	64.62%

GOBIERNO REGIONAL JUNIN



 Arq. Yuber A. Alguajana
 RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE,
DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00



GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Arq. Yuber A. Auqui Janampa
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE,
DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00



ANTES



ANTES



ACTUAL

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Arq. Yuber A.  Janampa
RESIDENTE DE OERA

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00



GOBIERNO REGIONAL JUNIN

Arg. Yub. 
RESIDENTE DE OBRA

67

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE,
DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00



GOBIERNO REGIONAL JUNIN
Arq. Yuliana Janampa
RESIDENTE DE OBRA

66
D. 100

NOMBRE PIP: "CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

MONTO DE INVERSIÓN: S/.1,053,970.00



GOBIERNO REGIONAL JUNIN


Arq. Yuber A. Auqui Janampa
PRESIDENTE DE OERA

65 01

DOC 2389739
Exp 1633733

INFORME 006-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/SRB

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : INFORMACION DETALLADAS DE OBRAS

REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 20 – 2017-GRJ/GRI

FECHA : Huancayo, 13 de noviembre del 2017



Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho la información detallada de la obra: **"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO DEL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"**, COMPONENTE AGUA POTABLE, de la II y III etapa, ejecutada por el Gobierno Regional de Junín bajo la modalidad por administración directa.

Contenido:

- Presentación información
- Se adjunta digital (CD)

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios.

Atentamente;


GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP 177200

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: Ing. Gino Pena
HYO., 14 NOV 2017
PARA: Asunción







**"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA,
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" - II ETAPA**



Monto de inversión S/. 2,320,273.93

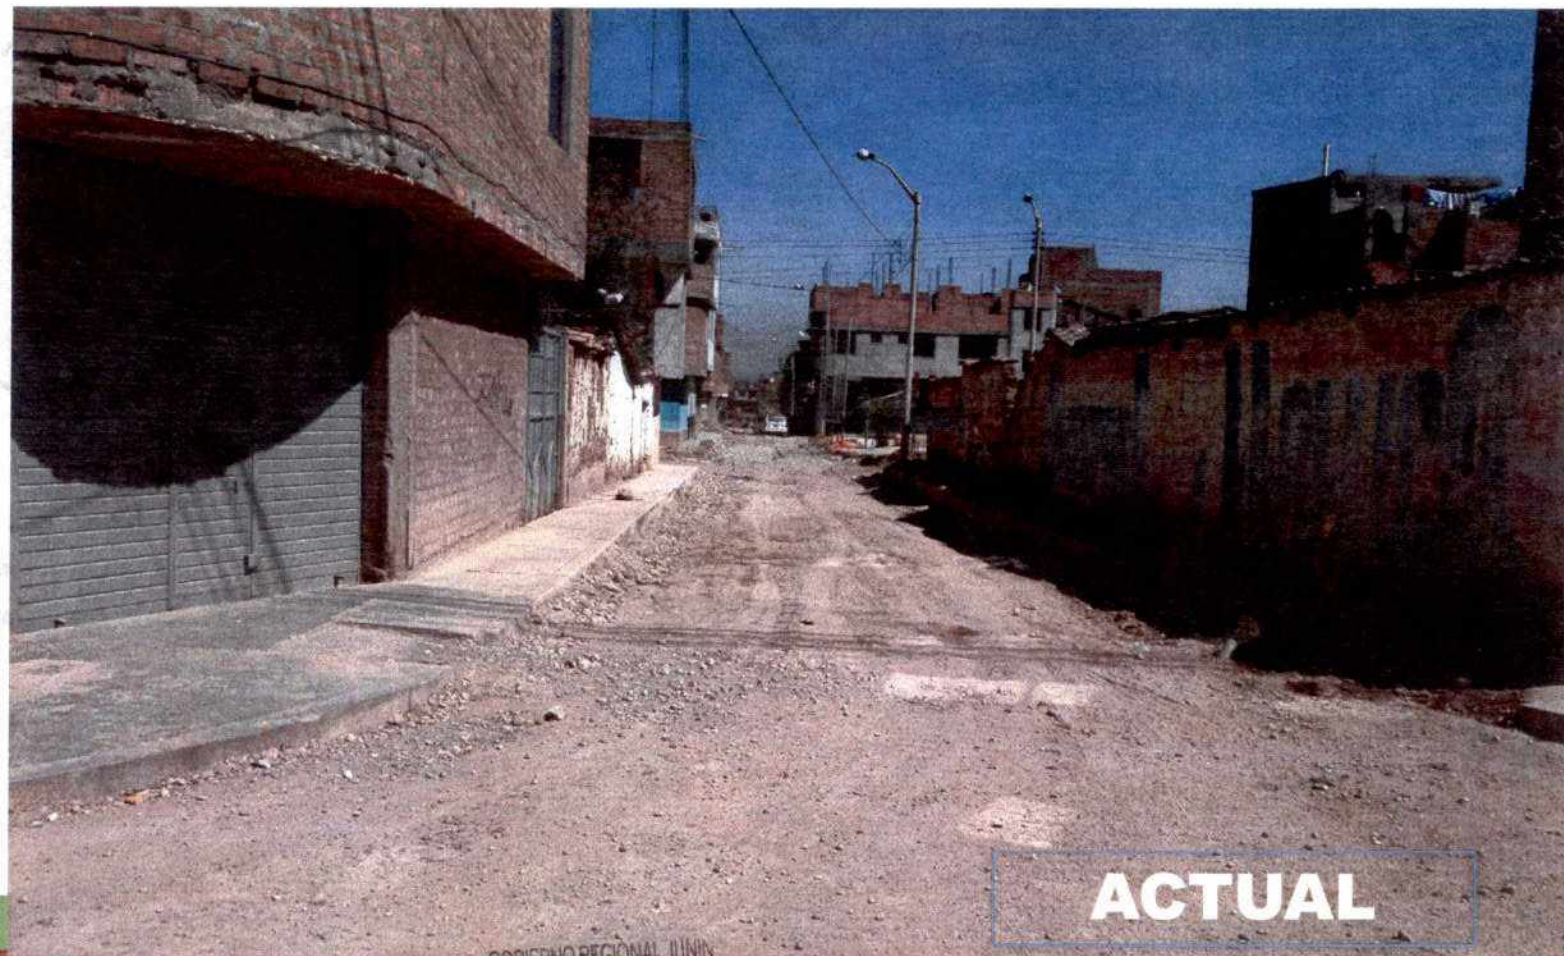

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
ING. SIDMAN REYNOSO BASTIDAS
RESIDENTE DE OBRA
CIP 177200

63
AT

NOMBRE DEL PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" - II ETAPA

CODIGO SNIP N° 331464




ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD)	10,093,856.00
MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO (COMPONENTE AGUA)	7,882,424.93
MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	2,320,273.93
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	75 dc
FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA	09/05/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	23/07/2017
AMPLIACION DE PLAZO	-----
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	-----
AVANCE FISICO EJEC. ACUM.	91.49%
AVANCE FISICO ACUM. PROG. (Octubre)	91.49%
PIM 2017 - COMPONENTE AGUA	-----
ASIGNACION 2017	1,882,418.00
DEVENGADO 2017	1,050,323.67
DEVENGADO ACUMULADO (2016-2017)	1,050,323.67
EJECUCION FINANCIERA AL 15/09/2017	90.25%
% ACUM.-DEVENGADO (COMPONENTE AGUA)	

NOMBRE DEL PIP: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" – III ETAPA

CODIGO SNIP N° 331464

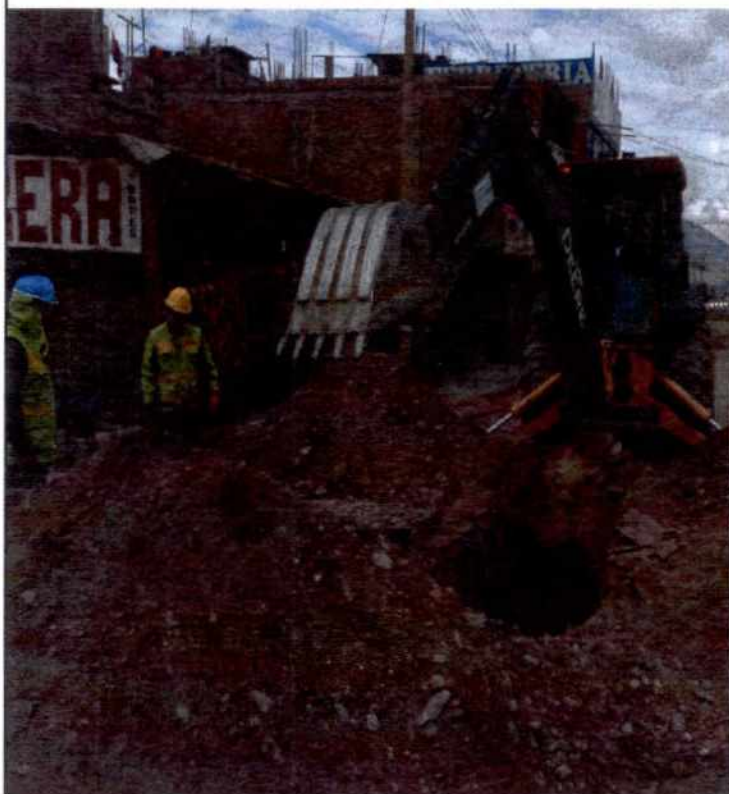


EXCAVACIÓN DE ZANJAS – PARA LA INSTALACIÓN DE TUBERÍA

MONTO DE INVERSIÓN VIABLE (FECHA DE VIABILIDAD)	10,093,856.00
MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO (COMPONENTE AGUA)	7,882,424.93
MONTO ACTUALIZADO DEL PIP	2,320,273.93
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	30 dc
FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA	18/09/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	18/10/2017
AMPLIACION DE PLAZO	-----
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	-----
AVANCE FISICO EJEC. ACUM.	75.97%
AVANCE FISICO ACUM. PROG. (Octubre)	71.50%
PIM 2017 - COMPONENTE AGUA	-----
ASIGNACION 2017	1,524,279.00
DEVENGADO 2017	1,266,332.32
DEVENGADO ACUMULADO (2016-2017)	1,266,332.32
EJECUCION FINANCIERA AL 13/11/2017	76.78%
% ACUM.-DEVENGADO (COMPONENTE AGUA)	




**"AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL AA.HH JUSTICIA PAZ Y VIDA,
DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO-JUNIN" - III ETAPA**

Monto de inversión S/. 2,320,273.93

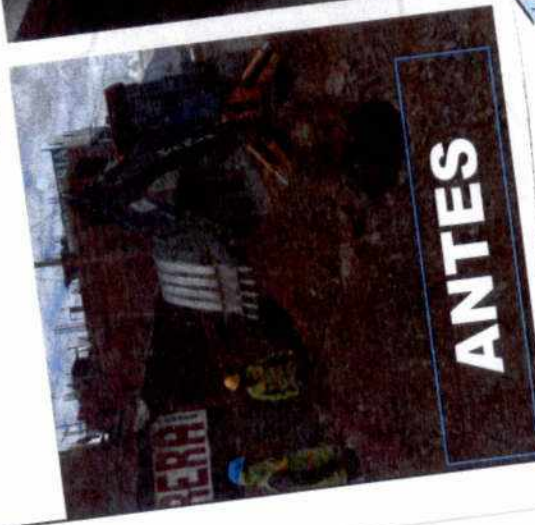

ANTES

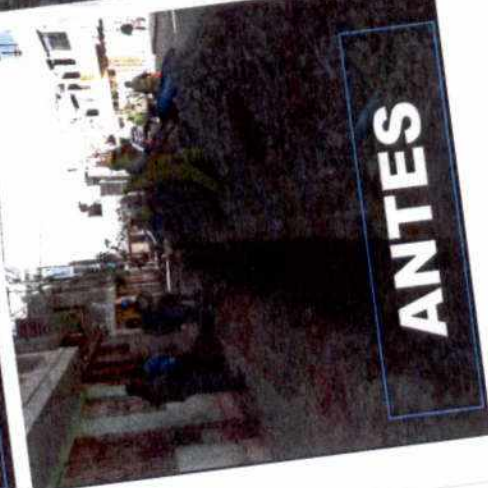

ANTES



ACTUAL

DOC 2389804
Exp. 1633780



INFORME N° 64-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/JCSA

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : INFORMACION DETALLADA DE OBRA

REF. : MEMORANO MULTIPLE N° 20-2017-GRJ/GRI
OBRA: "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC
- MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA
- JUNIN"

FECHA : Huancayo, 15 de Noviembre del 2017

Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el informe detallado de obra donde solicita datos técnicos de la obra:

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES,
DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN"

II Y III ETAPA

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios.

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: *Ing. Gino Ben...*

HYO., 15 NOV 2017

PARA: *A. Caceres*

.....

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
JUAN C. SOBERANES ALARCÓN
INGENIERO
RESIDENTE DE OBRA

458

NOMBRE DEL PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN" II ETAPA

CODIGO SNIP :

60117

UNIDAD EJECUTORA :

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

AÑO DE EJECUCION :

2017

MONTO CONTRACTUA

MONTO EXPEDIENTE : S/. 4,229,221.45

TIEMPO DE EJECUCION

11 MESES

FICHA DE AVANCE DE OBRA :

55%

INFORME DETALLADO DE GASTOS :

ITEM	OBJETO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	GASTOS EFECTUADOS (S/.)		EJECUCION ACTUAL (%)
			ACTUAL	ACUM. ACTUAL	
1	COSTO DIRECTO	4,378,704.00	651,809.72	4,201,943.48	95.96%
1.1	MANO DE OBRA	1,265,433.00	83,000.00	1,336,976.96	105.65%
1.2	BIENES DE CONSUMO	2,012,739.00	189,301.00	1,974,096.80	98.08%
1.3	SERVICIOS DE TERCEROS	1,077,332.00	379,508.72	867,669.72	80.54%
1.4	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS	23,200.00		23,200.00	100.00%
2	GASTOS GENERALES	344,442.00	23,000.00	273,802.85	79.49%
2.1	MANO DE OBRA	0.00		0.00	0.00%
2.2	BIENES DE CONSUMO	75,237.00		42,771.85	56.85%
2.3	SERVICIOS DE TERCEROS	269,205.00	23,000.00	231,031.00	85.82%
	COSTO TOTAL	4,723,146.00	674,809.72	4,475,746.33	94.76%
3	SERV. DE CONSULTORIA Y SU	163,477.00	0.00	0.00	0.00%
3.1	BIENES	0.00		0.00	0.00%
3.1	SERVICIOS	163,477.00		0.00	0.00%
	COSTO TOTAL	4,886,623.00	674,809.72	4,475,746.33	91.59%


 JUAN C. SOBERANES ALARCÓN
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 94.111
 RESIDENTE DE OBRA



**"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHUPACA, HUAYAO, HUACHAC Y MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HAUCHAC,
PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN." II ETAPA**



CODIGO SNIP	60117
MONTO DE INVERSION VIABLE	15220024.34
MONTO ASIGNADO	7894419.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	438
FECHA DE INICIO DE OBRA	19/10/2016
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	31/12/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (OCTUB	42.95%
PIM 2017	8363402.77
DEVENGADO 2017	4475746.33
EJECUCION FINANCIERA % ACUMULADO DEVENGADO	91.50%

JUAN C. SOBERANES ALARCÓN
INGENIERO CIVIL
CIP Nº 94132
RESIDENTE DE OBRA

NOMBRE DEL PROYECTO :

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPACA - HUAYAO - HUACHAC - MANZANARES, DISTRITO DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN" III ETAPA

CODIGO SNIP :

60117

UNIDAD EJECUTORA :

GOBIERNO REGIONAL JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO :

RECURSOS ORDINARIOS

RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO

AÑO DE EJECUCION :

2016 - 2017

MONTO CONTRACTUAL :

MONTO EXPEDIENTE : S/. 4,134,181.32

TIEMPO DE EJECUCION :


09 MESES.

POCENTAJE DE AVANCE DE OBRA :

43.80%

INFORME DETALLADO DE GASTOS :

ITEM	OBJETO DEL GASTO	VALOR PRESUPUESTADO	GASTOS EFECTUADOS (S/.)		EJECUCION ACTUAL (%)
			ACTUAL	ACUM. ACTUAL	
1	COSTO DIRECTO	4,378,704.00	651,809.72	4,201,943.48	95.96%
1.1	MANO DE OBRA	1,265,433.00	83,000.00	1,336,976.96	105.65%
1.2	BIENES DE CONSUMO	2,012,739.00	189,301.00	1,974,096.80	98.08%
1.3	SERVICIOS DE TERCEROS	1,077,332.00	379,508.72	867,669.72	80.54%
1.4	MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIOS	23,200.00		23,200.00	100.00%
2	GASTOS GENERALES	344,442.00	23,000.00	273,802.85	79.49%
2.1	MANO DE OBRA	0.00		0.00	0.00%
2.2	BIENES DE CONSUMO	75,237.00		42,771.85	56.85%
2.3	SERVICIOS DE TERCEROS	269,205.00	23,000.00	231,031.00	85.82%
	COSTO TOTAL	4,723,146.00	674,809.72	4,475,746.33	94.76%
3	SERV. DE CONSULTORIA Y SUPERVISIO	163,477.00	0.00	0.00	0.00%
3.1	BIENES	0.00		0.00	0.00%
3.1	SERVICIOS	163,477.00		0.00	0.00%
	COSTO TOTAL	4,886,623.00	674,809.72	4,475,746.33	91.59%


JUAN C. SOBERANES ALARCÓN
 INGENIERO CIVIL
 CIP N° 94132
 RESIDENTE DE OBRA



"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA: CHUPACA, HUAYAO, HUACHAC Y MANZANARES, DISTRITOS DE CHUPACA Y HUACHAC, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN." II ETAPA



CODIGO SNIP	60117
-------------	-------

MONTO DE INVERSION VIABLE	15220024.34
MONTO ASIGNADO	7894419.00
PLAZO DE EJECUCION DE OBRA:	438
FECHA DE INICIO DE OBRA	19/10/2016
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	31/12/2017
AVANCE FISICO EJECUTADO ACUMULADO (OCTUBRE 2017)	42.95%
PIM 2017	8363402.77
DEVENGADO 2017	4475746.33
EJECUCION FINANCIERA % ACUMULADO DEVENGADO	91.50%



JUAN C. SOBRANTES ALARCÓN
INGENIERO CIVIL
CIP N° 84132
RESIDENTE DE OBRA

DOC 2389825
Exp 1633795

INFORME N°051-2017-GRJ/GRI/SGO-RO/PRP

A : ING. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. PAMELA RODRIGUEZ PEREZ
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : INFORMACION DETALLADA DE OBRA

REF. : MEMORANDO MULTIPLE N° 20 – 2017 – GRJ/GRI
OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL
COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE
SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN"

FECHA : Huancayo, 10 de Noviembre del 2017



Por medio del presente me dirijo a Ud., con el fin de remitir a su despacho el información detallada de la obra **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO – JUNIN"**.

Contenido:

- Presentación
- Vistas fotográficas (digital)
- Se adjunta digital (CD)

Es cuanto Informo para su conocimiento y fines necesarios.

Atentamente.

Pam R7
PAMELA RODRIGUEZ PEREZ
RESIDENTA DE OBRA
CIP: 172554

GOBIERNO REGIONAL JUNIN
SUB GERENCIA DE OBRAS

PASE A: *Ing. Gin Peru*

HYO., 10 NOV 2017

PARA: *Asesor*






MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN



NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN"

MONTO DE INVERSIÓN

S/. 2,024,971.51

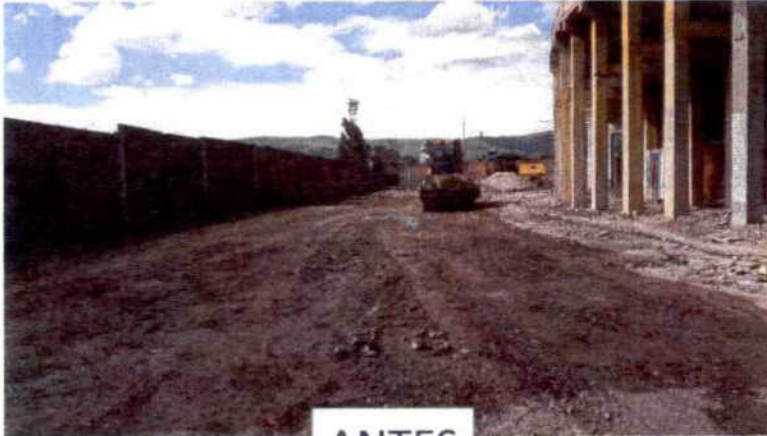

ANTES



ACTUAL



Pam RB

RESIDENTA DE SICAYA
C/P. 17485

NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN"

CODIGO SNIP N° 341882



MONTO DE INVERSIÓN VIABLE	S/. 2,024,971.51
MONTO ASIGNADO AL 2017	S/. 1, 577,739.00
MONTO DE SUPERVISION DE OBRA	S/. 63,500.00
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	180 dc
AMPLIACION DE PLAZO	60 dc
FECHA DE INICIO DE OBRA FÍSICA	12/04/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO	08/10/2017
FECHA DE TERMINO PROYECTADO CON AMPLIACION	07/12/2017
AVANCE FISICO EJEC. ACUM. OCTUBRE	61.82%
AVANCE FISICO ACUM. PROG. OCTUBRE	74.03 %
DEVENGADO ACUMULADO (2017)	1,033,802.37
EJECUCION FINANCIERA AL 31/10/2017 % ACUM-DEVENGADO	51.05%



ANTES

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNIN

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

DESPUES




• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNIN

ANTES



• OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNIN

DESPUES

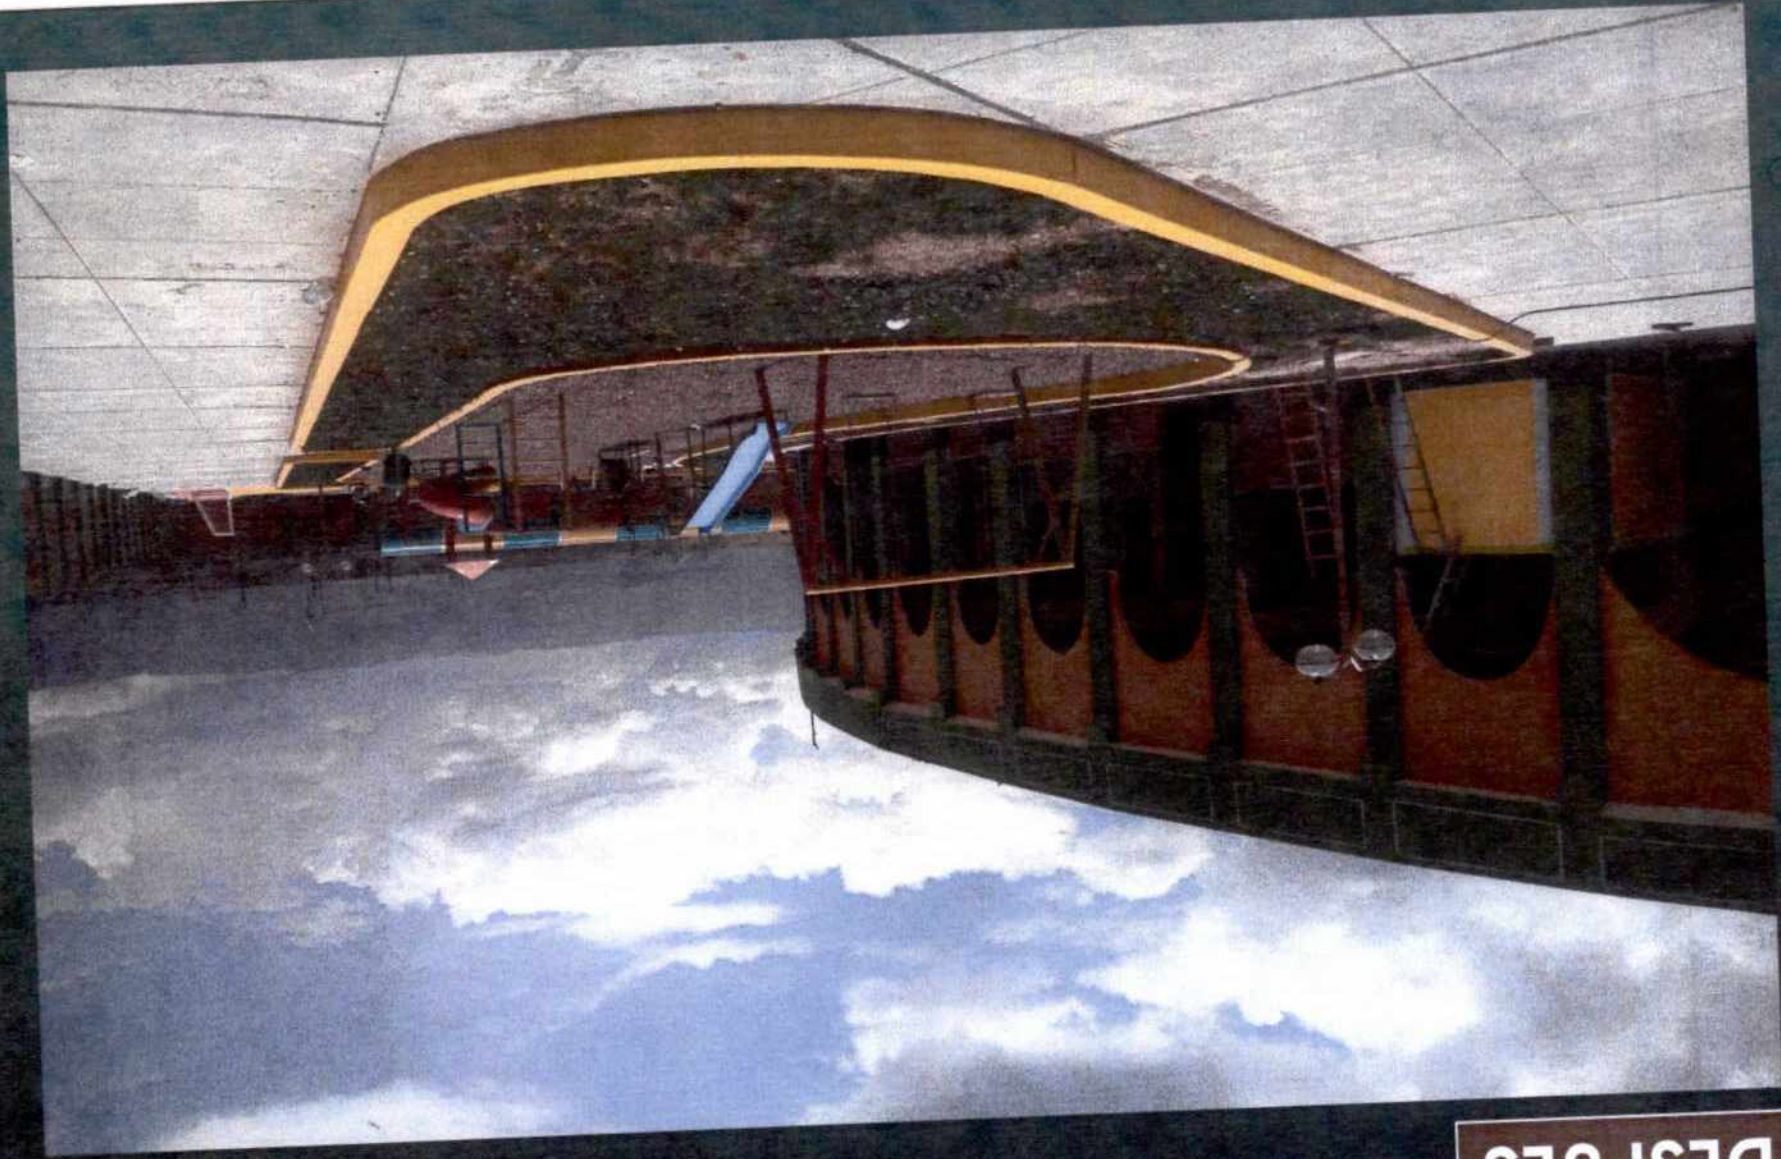

RECEIVED
CIP 1721

45



Ing. Carlos
RESERVA DE
CIP. 17485

ANTES

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNIN

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

DESPUES



• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

ANTES



GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
RESIDENTE DE SERVICIO
CIP: 174854

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUÍZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

DESPUES




• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

ANTES



• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN


DESPUES

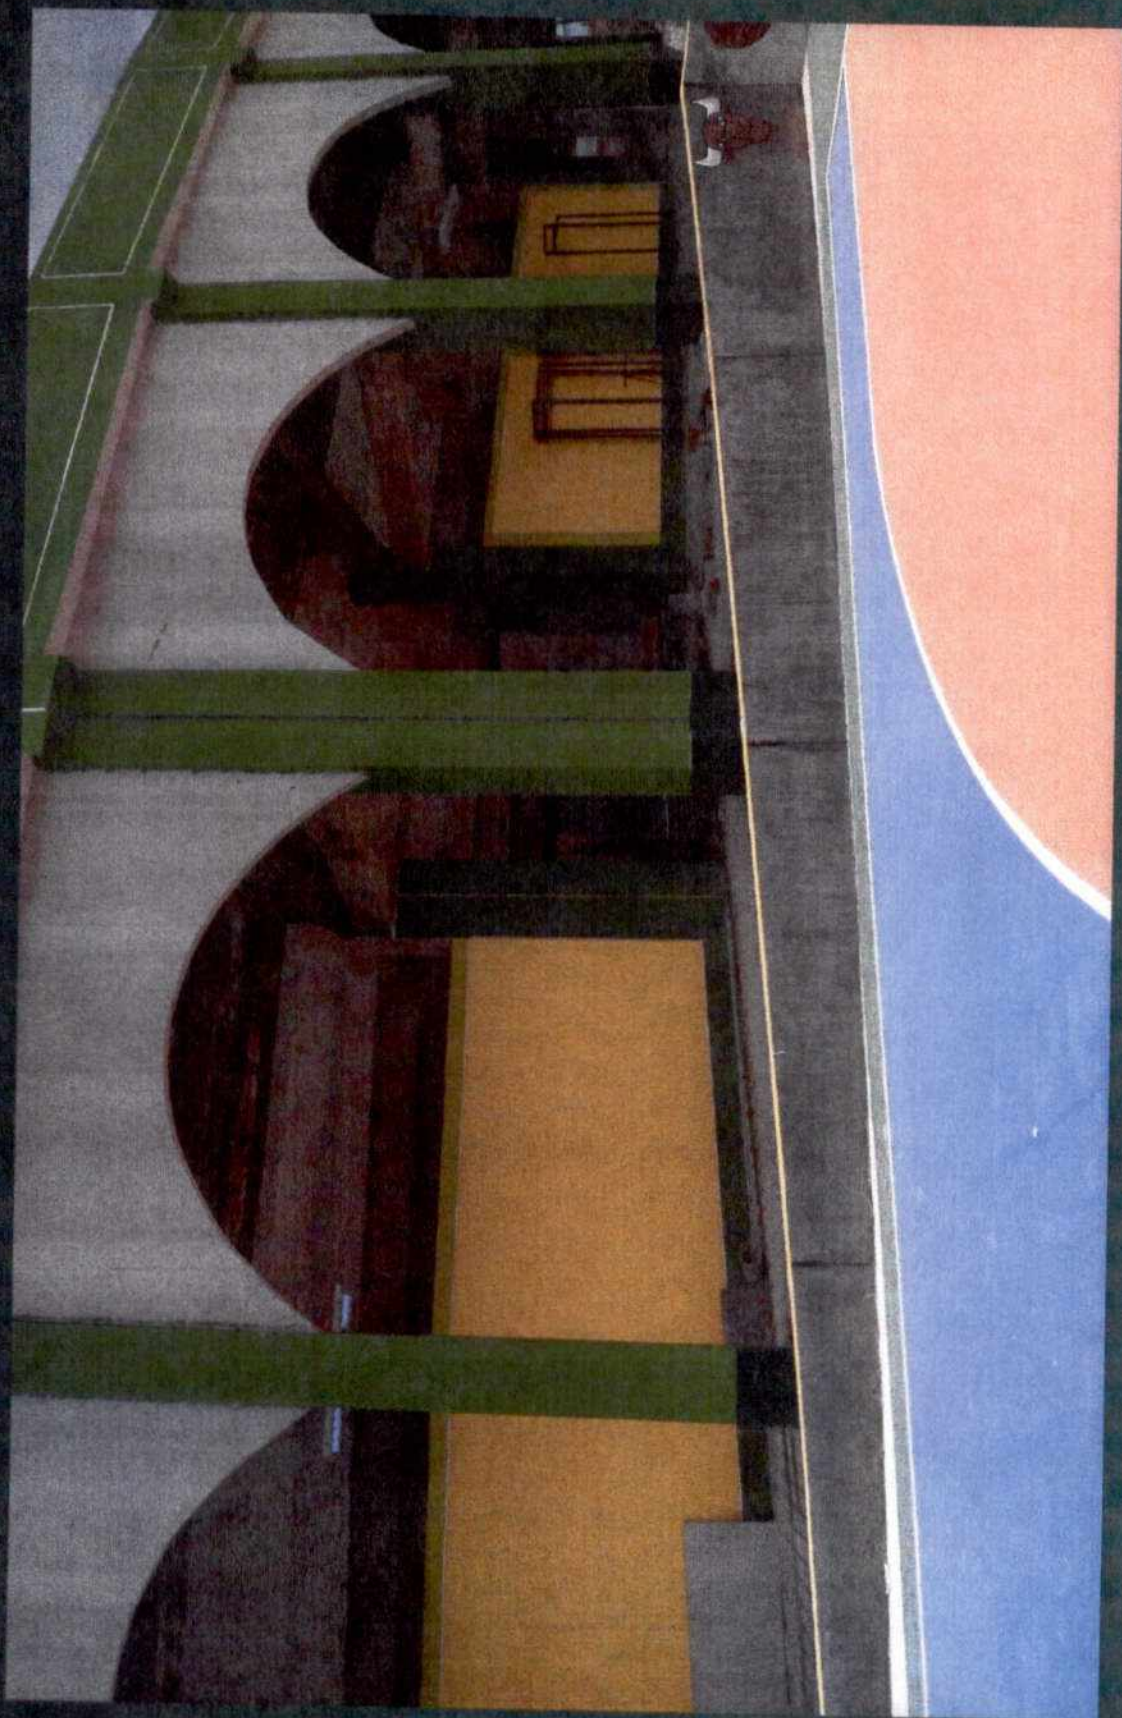

PAMELA RUEDA, L.L.C.
REGISTRADA DE D.C.
C.I.P. 17485

Pamela Rueda

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

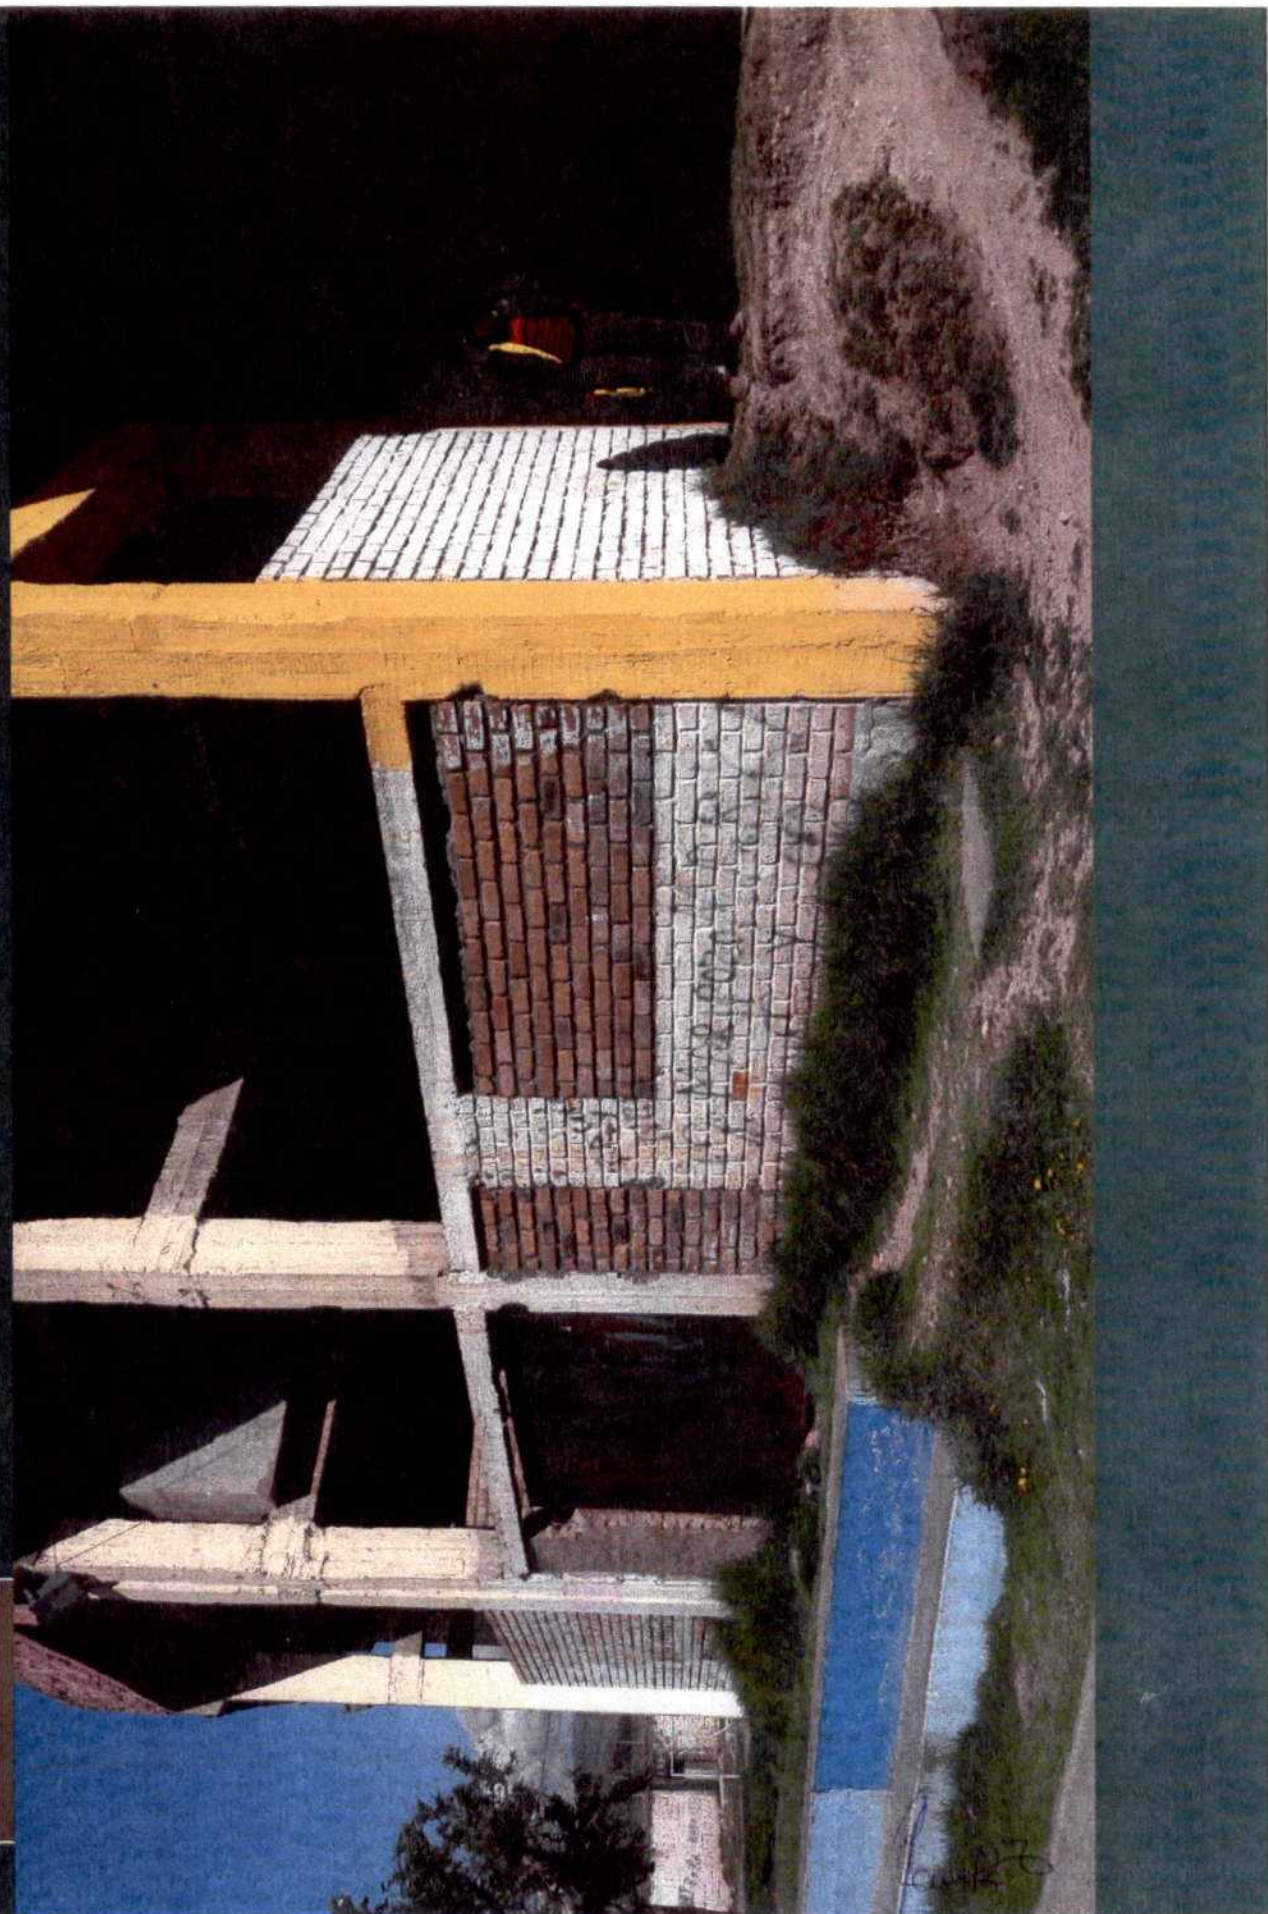

AL RESIDENTE DE C. U.
RES. CIP: 174854
C. U.

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

DESPUES



PANELA RODRIGUEZ PÉREZ
RESIDENTA DE OBRA
CIP. 174854

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

ANTES



PAULELA RODRIGUEZ PÉREZ
RESIDENTA DE OBRA
CIP: 174854

• OBRA : MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO
RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA-HUANCAYO JUNÍN

DESPUES



RODRIGO RODRIGUEZ PEREZ
RESERVA DE OBRA
CIP. 174854

Doc 2389848
Exp 1633813

"AÑO DEL BUEN SERVICIO AL CIUDADANO"

Huancayo, 10 de Noviembre del 2017.

CARTA N° 011-2017-RO/EAGC:


A : Ing. GUSTAVO CONDEZO MANSILLA
SUB GERENTE DE OBRAS

DE : ING. ERNESTO A. GUERRA CABEZAS
RESIDENTE DE OBRA

ASUNTO : INFORMACIÓN DETALLADA DE OBRAS Y/O ACTIVIDADES.

referencia : MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 20-2017-GRJ/GRI

FECHA : Huancayo, 10 de noviembre del 2017.




Por Intermedio del Presente, es Grato Dirigirme a Ud. para Saludarle Cordialmente y hacer llegar lo Siguiente:

Remito la **INFORMACIÓN DETALLADA** de la Obra: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS, DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCIÓN - JUNÍN" - I ETAPA., para su Revisión y/o Trámites Correspondientes.

Es cuanto informo a Ud. para los fines consiguientes.

Atentamente.


ING. ERNESTO A. GUERRA CABEZAS
DNI. 45799890

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN
SUB GERENCIA DE OBRAS
PASE A: Ing. Peña
HYO. 10 NOV 2017
PARA: Su despacho


DATOS GENERALES DE LA OBRA

- i. **OBRA** : "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS, DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCIÓN - JUNÍN" - I ETAPA."
- ii. **Código SNIP** : 329391
- iii. **Entidad Ejecutora** : Gobierno Regional de Junín.
- iv. **Fuente de Financiamiento** : Recursos Ordinarios.
- v. **Año de Ejecución** : 2017
- vi. **Monto de Ejecución Integral** : S/. 3,094,983.89
- vii. **Monto de Ejecución 1º Etapa** : S/. 499,996.96
- viii. **Plazo de Ejecución Inicial** : 90 Días Calendarios.
- ix. **Ubicación** : Distrito de Cochas - Provincia de Concepción - Junín.
- x. **Fecha de Inicio de Obra** : 02 de Noviembre del 2017.
- xi. **Fecha de Culminación de Obra** : 31 de Enero del 2018.
- xii. **Ampliación de Plazo** : Ninguna
- xiii. **Gerente Regional de Infraestructura** : Ing. Eduardo Cristian LAGOS VILLAVICENCIO.
- xiv. **Sub Gerente de Obras** : Ing. Gustavo CONDEZO MANSILLA
- xv. **Supervisor de Obra** : Ninguno.
- xvi. **Residente de Obra** : Ing. Ernesto Andderly GUERRA CABEZAS.
- xvii. **Costo de avance anterior** : S/. 0.00
- xviii. **% de Avance Anterior** : 0,00%
- xix. **Costo de avance actual** : S/. 22,363.00
- xx. **% de Avance actual** : 4.47%
- xxi. **Costo de avance acumulado** : S/. 22,363.00
- xxii. **% de Avance Acumulado** : 4.47%
- xxiii. **Estado actual de la obra** : en Ejecución


Ing. Ernesto Andderly Guerra Cabezas
RESIDENTE DE OBRAS




NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS , DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION – JUNIN, I ETAPA"



MONTO DE INVERSIÓN : S/. 499,996.96



ANTES

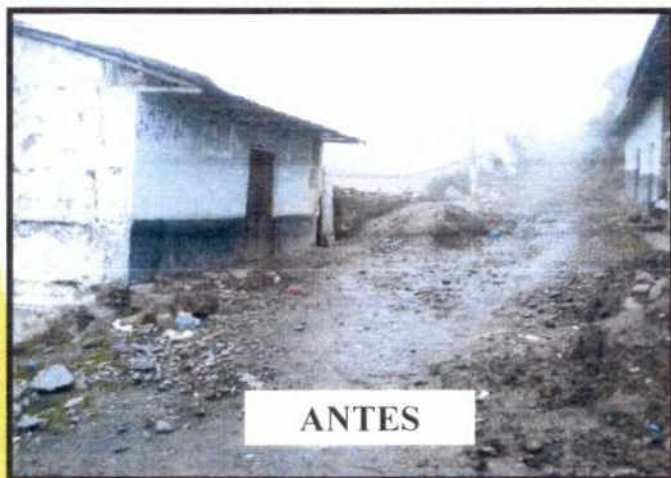

ANTES



ACTUALMENTE





NOMBRE DEL PIP: "MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL ACCESO PRINCIPAL DEL DISTRITO DE COCHAS TRAMO 18 DE ENERO, PUESTO DE SALUD, 07 DE ABRIL, MELCHOR OROSCO Y OTROS DEL ANEXO DE COCHAS , DISTRITO DE COCHAS - CONCEPCION – JUNIN, I ETAPA"



CODIGO SNIP N° 329391



ENTIDAD EJECUTORA	Gobierno regional Junín
MODALIDAD	Administración directa
MONTO DEL EXPEDIENTE INTEGRAL	S/. 3,094,983.89
MONTO DEL EXPEDIENTE 1° ETAPA	S/. 499,996.96
MONTO ASIGNADO A LA EJECUCION DE OBRA	S/. 300,000.00
PLAZO DE EJEJCUION (1° ETAPA)	90 día c
FECHA DE INICIO DE OBRA	02 de Noviembre del 2017
FECHA DE TERMINO DE OBRA	31 de Enero del 2018

META PROGRAMADA AL	Total de Componentes	20.00%
AVANCE FISICO EJEC. ACUMULADO al	Total de Componentes	2.00%
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO	Total de Componentes	0.00%
AVANCE FINACIERO EJECUTADO (Devengado)	Total de Componentes	0.00%
RESIDENTE DE OBRA	ING. Erneto Guerra Cabezas	
SUPERVISOR DE OBRA		

EXTENDIDO DE BASE EN VEREDAS


Ing. Erneto Guerra Cabezas
RESIDENTE DE OBRA

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA III AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA POMACHACA - LA UNION -
CONDORCOCHA - CARIPA DISTRITO DE LA UNION LETICIA,
PROVINCIA DE TARMA - JUNIN"

2) **LOCALIZACIÓN:**

REGION: Junín
PROVINCIA: Tarma
DISTRITO: Tarma
LOCALIDAD: Jacahuasi



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Mejoramiento de la superficie de rodadura, con Pavimento Flexible en caliente de 2.5" de espesor, en un ancho de vía de 6.00 m; Teniendo en cuenta el mejoramiento de la sub base y base con un espesor = 20.00 cm, en una longitud de 1.49 km de superficie de rodadura respectivamente. Construcción de cunetas rectangulares, veredas, reposición de canal de riego de concreto armado, construcción de una 04 alcantarilla y la construcción de 609.92 m de muro de contención en voladizo a lo largo del tramo.

4) **META FÍSICA:**

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 3'818,622.60
Ejecutada al 31 de agosto: S/. 62,190.55
Avance (%): 1.63 %

5) **PRESUPUESTO:**

Programada: S/. 3'818,622.60
Ejecutada (Devengado al 31/10/2016): S/. 2,439,155.27
Avance (%): 73.78 %

6) **AVANCE FÍSICO ACUMULADO TOTAL**

Avance Acumulado (%): 46.97 %

7) **AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL**

S/. 2,439,155.27
Avance (%): 73.78 %

SGCTP.



8) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas.

Se beneficiará a un total de 2450 pobladores del Anexo de Jacahuasi y el Distrito de Tarma y la Unión Leticia.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<p>Trazo y replanteo topográfico Mantenimiento de tránsito y seguridad Vial Excavación en Material Suelto" Corte a nivel de sub rasante del pavimento) Relleno para estructura en muro de contención Transporte y eliminación de Material excedente Demolición de techo de buzones Existente Muros de contención.</p>

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTEs, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA", REGION JUNÍN.

2) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: OROYA.

DISTRITO: OROYA.

LOCALIDAD: OROYA ANTIGUA.



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Se mejorará el sistema de agua potable mediante la ejecución de obras correspondientes a la complementación de la **Línea de Conducción** cuya **Captación** está ubicada en Cuchimachay en una Longitud de 5,396ML de Tubería de 250mm Clase 10; longitud de 2400ml de tubería de 2500 Clase 15 Y 4200 ml de Tubería de 250mm de Hierro Dúctil haciendo un **total de 11,796 ml**, y sus componentes además de la Planta de Tratamiento de Agua Potable y el Reservorio existente en Alto Marcavalle y con ello mejorar la calidad de vida de la población

4) **META FÍSICA:**

Programada según Expediente Técnico S/. 6, 562,062.34

Ejecutada: S/. 5, 563,954.70

Avance (%) 98.31%

5) **PRESUPUESTO:**

Programada PIM S/. 6 562,062.34

Devengado al 31/07/2017: S/. 4 801,010.01

Avance (%) 98.31 %

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS** Max 02 líneas.

Se beneficiará a un total de 10,820.00 pobladores de la zona.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

La dotación del agua potable permitirá la satisfacción de las necesidades básicas de los pobladores del Distrito de La Oroya.

La ejecución de la obra permite erradicar la presencia de enfermedades diarreicas, gastrointestinales y parasitarias, incremento en índice de morbilidad y mortalidad, el aumento de la malnutrición y los gastos de atención en la salud y por ende se agudizan el índice de pobreza de la población del distrito.




FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE:**

"INSTALACIÓN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL EN LA CIUDAD DE LA MERCED, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO JUNIN LTAPAT"

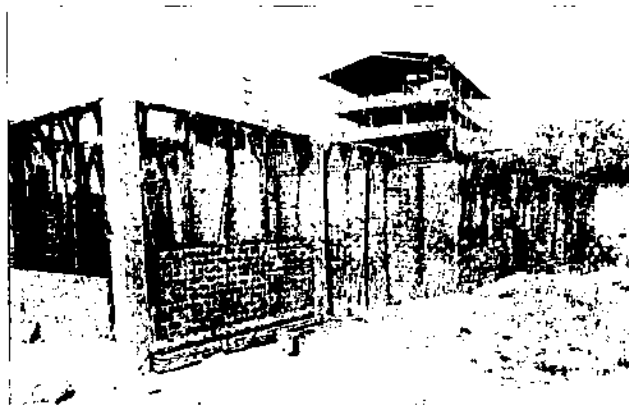

2) **LOCALIZACIÓN:**

REGION: Junin
PROVINCIA: Chanchamayo
DISTRITO: Chanchamayo
LOCALIDAD: Ciudad de la Merced

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD** (Max. 05 líneas)

Se viene ejecutando la obra del polideportivo municipal en la ciudad de la merced, la cual comprende los componentes de: Mod.2 Cafetin Sum, administración, balneario, cafetin, cocina, sum, ss.hn, A=527.70 m²; Mod.4 Losa Deportiva Multifuncional, losa reglamentaria, tribunas y cerco de malla metálica, A=828m²; Mod.8 Cancha De Grass Sintético, contiene cancha de grass sintético, tribunas, ss.hn, A=1.127.30m²

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	S/. 1,850,867.39	S/. 454,247.09	24.55%
PRESUPUESTO PIM 2017	S/. 1'464,000.00	S/. 454,247.09	24.55%

5) **NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS**

Se beneficiara a un total de 26,310 pobladores, principalmente a los habitantes de la Ciudad de la Merced, del distrito y provincia de Chanchamayo

6) **PRODUCTO O RESULTADO A OBTENER**

Espacios adecuados para el desarrollo de la recreación y actividades deportivas, con instalaciones apropiadas para su funcionamiento, el cual impulsa, la cultura y el deporte, mejorando así la calidad de vida de los ciudadanos de la Ciudad de la Merced

SGCTP.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se realizó desbroce de malezas y arbustos.
- Se realizó eliminación de elementos metálicos y maquinaria antigua (chatarra).
- Se realizó limpieza de terreno manual.
- Se realizó trazo, nivelación.
- Se realizó corte en terreno firme con maquinaria.
- Se realizó excavación manual de zanjas para cimientos y zapatas.
- Se realizó el vaciado de solado para zapatas.
- Se realizó el vaciado cimientos corridos y sobre cimiento.
- Se realizó los trabajos acero y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm² en zapatas.
- Se realizó los trabajos de acero, encofrado y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm² en columnas.
- Se realizó los trabajos de acero, encofrado y vaciado de concreto F'C=210 kg/cm² en placas y muro de contención.
- Se realizó el afirmado con material propio y material de préstamo con maquinaria
- Se realiza el encofrado y vaciado con concreto F'C=175 kg/cm² de losa deportiva.



FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017


(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"MANTENIMIENTO COMPLEMENTARIO 2016 DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO COAR. UBICADO EN EL DISTRITO DE CHONGOS BAJO – CHUPACA – JUNÍN"

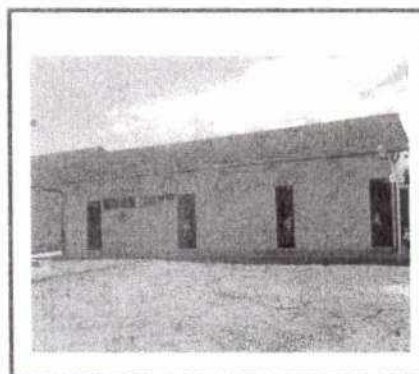

2) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: Huancayo.
DISTRITO: Chongos Bajo.
LOCALIDAD: Chongos Bajo.

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

- Brindar un servicio educativo con altos estándares de calidad nacional e internacional que permita fortalecer sus competencias personales, académicas, artísticas y/o deportivas para constituir una red de líderes capaces de contribuir al desarrollo local y regional. Así mismo, busca articular los esfuerzos por parte de los diferentes niveles de gobierno.

4) **META Y PRESUPUESTO:**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	496,413.40	391,889.12	87.79 %
PRESUPUESTO	446,414.00	396,102.78	88.73 %

5) **NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS** (máximo 2 líneas):

300 alumnos de alto rendimiento.
Alumnos de alto rendimiento académico de pobreza extrema de nivel secundario.


6) **PRODUCTO Y RESULTADO OBTENIDO** (máximo 02 línea).

Se beneficiara a un total de 300 estudiantes de alto rendimiento..


II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**



FOTOGRAFIAS









FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE :**

"CREACION, PUESTA EN VALOR Y ACONDICIONAMIENTO DE LA ESCENIFICACION DE LAS BATALLAS DE PUCARA Y MARCAVALLE, DISTRITO DE PUCARA, PROVINCIA DE HUANCAYO, REGION, JUNIN"

2) **LOCALIZACIÓN:**

REGION : Junín
PROVINCIA : Huancayo
DISTRITO : Pucará
LOCALIDAD : Paraje Chuo Uclo.



3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.**

Construcción de infraestructura puesta en valor de mirador, que cuenta con los siguientes ambientes y zonas; área de estacionamiento, área cívica, 4 plataformas que están conectadas mediante graderías, pasadizos y corredores con muros y pisos de piedra, de la misma manera cuenta con tratamiento de áreas verdes por cada plataforma y el acceso peatonal que comunica con el mirador.

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	S/. 740,580.76	S/. 341,269.59	39.29 %
PRESUPUESTO	S/. 740,580.76	S/. 341,269.59	39.29 %

5) **NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS**

Se beneficiara a un total de 4,700 pobladores, principalmente a los habitantes del distrito de Pucará.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO**

Infraestructura para actividades sociales y culturales para el disfrute de la escenificación, mejorar el paisaje y la estética del Distrito de Pucará.

SGCTP.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se realizó Corte de Terreno
- Se realizó el Movimiento de Tierras
- Se realizó la colocación de Iluminación por medio de paneles solares sin contaminar el medio ambiente.
- Se viene culminando los muros de contención ciclópeo.
- Se viene culminando el acceso peatonal.
- Se viene colocando falso piso en el nivel superior.
- Se viene creando Espacios para actividades sociales y culturales.
- Se crea una adecuada Infraestructura puesta en valor, que pueda ayudar a explotar todo significado cultural e histórico que tiene pucara, específicamente la Batalla de Pucara y Marcavalle.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.


I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE :**

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N° 606-30587 INTEGRADO SAN CRISTOBAL DEL DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN"

2) **LOCALIZACIÓN:**

REGION: Junín
PROVINCIA: Junín
DISTRITO: Junín
LOCALIDAD: San Cristóbal.

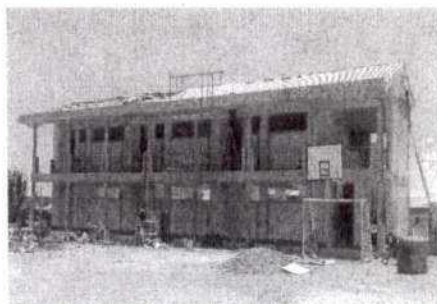

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Se vienen culminando los trabajos en el módulo de aulas, se ha realizado el pintado de todo el modulo tanto interiores, como exteriores, se han instalado las barandas metálicas, y se viene colocando la cobertura de tejas sobre la losa aligerada. Las puertas y ventanas se hayan en proceso de elaboración pero aún no se han instalado. En lo referente al módulo de servicio higiénico se ha culminado ya con los trabajos de pintura y se han instalado los separadores en el interior de los servicios, aún falta la colocación de puertas y ventanas que ya están en proceso de confección.

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	S/. 858,690.11	S/. 871,836.76	101.53 %
PRESUPUESTO	S/. 858,690.11	S/. 1'109,197.48	129.17 %

5) **NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS**

Se beneficiara a un total de 3,700 pobladores, principalmente a los habitantes del barrio San Cristóbal.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO**

Bienestar para los estudiantes y profesores de la escuela, así como satisfacción para los padres de familia y pobladores.

SGCTP.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se realizaron las zanjas para la construcción de las zapatas y cimientos de la construcción.
- Se construyó las estructuras del módulo de aulas, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada 1° y 2° y escaleras.
- Se realizaron los cimientos y sobre cimientos con concreto de la construcción.
- Se construyeron los muros de ladrillo en primer y segundo nivel de alas aulas, así como en la caja de escalera.
- Se realizó el acabado con tarrajeo de muros, columnas, vigas, cielo rasos, escaleras con cemento arena fina, en interiores y exteriores, en el primer y segundo nivel del módulo de aulas.
- Se realizó los trabajos de pintura en interiores, exteriores, columnas, vigas, placas, y derrames en primer y segundo nivel del módulo de aulas.
- Se realizaron las instalaciones eléctricas, tubería empotrada, cableados, instalación de luminarias, pozo a tierra y pararrayo.
- Se vienen instalando cobertura de tejas en la losa del segundo nivel.
- Se realizaron las zanjas para la construcción de las zapatas y vigas de cimentación para servicio higiénico.
- Se construyó las estructuras del módulo de servicio higiénico, zapatas, columnas, vigas, losa aligerada 1°.
- Se realizaron los cimientos y sobre cimientos con concreto de la construcción.
- Se construyeron los muros de ladrillo delimitando los servicios de niños, niñas y profesores.
- Se realizó el acabado con tarrajeo de muros, columnas, vigas, cielo rasos, con cemento arena fina, en interiores y exteriores, del módulo de servicio higiénico.
- Se realizó el enchape de muros con cerámicos, así como de las mesas de los ovalines, y el lavadero exterior.
- Se realizó los trabajos de pintura en interiores, exteriores, columnas, vigas, y derrames.
- Se realizaron las instalaciones eléctricas, tubería empotrada, cableados, instalación de luminarias.
- Se realizó las instalaciones sanitarias, tuberías de desagüe, y de agua fría, empotradas.
- Se realizó la instalación de aparatos sanitarios, inodoros, lavatorios, y su conexión de agua.
- Se instaló la grifería exterior.
- Se instaló cobertura de tejas en la losa aligerada.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE :**

"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINAL
HUANCAYO – EL TAMBO – SAN AGUSTÍN DE CAJAS
– HUALHUAS – SAN JERÓNIMO DE TUNAN –
INGENIO, PROVINCIA DE HUANCAYO – JUNÍN"
(PROG. 20+140 AL 24+727.56) – **ULTIMA ETAPA**



2) **LOCALIZACIÓN:**

REGION: Junín
PROVINCIA: Huancayo
DISTRITO: Ingenio
LOCALIDAD: Centro Poblado de Casacancha.

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Se viene construyendo la carretera - última etapa del circuito turístico Catalina Huanca, desde la progresiva 20+140 hasta la 24+728, la cual se ubica en el distrito de Ingenio, una longitud total de 04 + 588 km. Los cuales contemplan zona rural y zona urbana que cuentan con muros de contención, alcantarillas, pontón, sardineles, cunetas rectangulares, cunetas triangulares, drenajes laterales, la calzada de rodadura será de Asfalto de 2" de espesor.

4) **META Y PRESUPUESTO**

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	S/. 3'896,021.07	S/. 3'124,948.03	76.45 %
PRESUPUESTO	S/. 3'236,765.00	S/. 3'124,948.03	76.45 %

5) **NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS**

Se beneficiara a un total de 1,250.00 pobladores, principalmente a los habitantes de Centro Poblado de Casacancha, distrito de Ingenio.

6) **PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO**

Bienestar para los pobladores de la zona, así como transitabilidad en todo momento y disminución del peligro ante el delito.

SGCTP.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- Se realizó la estabilización de terreno a nivel de sub rasante con material over.
- Se captó con cajas de suministro y se eliminó aguas de la napa freática superficial y pluvial a través de drenaje francés en la zona urbana.
- Se realizó el mejoramiento del diseño geométrico en la carretera.
- Se realizó el mantenimiento y la ampliación de alcantarillas existentes.
- Se ejecutó la conformación de sardineles y cunetas en toda la zona urbana.
- Se amplió la sección vial en toda la zona urbana.
- Se realizó la mejora-ampliación de pontón para cumplir la sección vial.
- Se realizó la construcción de muros de contención.
- Se realizó la imprimación asfáltica con MC-30 en todo el tramo.
- Se viene culminando la colocación de carpeta asfáltica con un espesor de 2".
- Se ha mejorado la calidad de vida de los pobladores y usuarios de la carretera en ejecución; para facilitar el tránsito de vehículos y poder realizar intercambios financieros de los productos que la zona brinda hacia los mercados de la región y del país.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. TIPO: PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU-510 TRAMO: EMPALME PE-3N
- OBELISCO DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN
- JUNIN" I ETAPA



2) ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL: SI ☐ NO ☐

3) LOCALIZACION:

REGION: Junín
PROVINCIA: Junín
DISTRITO: Junín
LOCALIDAD: Santuario Histórico de Chacamarca

4) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 líneas

Mejoramiento la vía de acceso al Santuario Histórico de Chacamarca en una longitud, para la primera etapa, de 750 metros lineales en un ancho de calzada de 7.20 metros, adicionales a la construcción de cunetas en concreto F'c=210 Kg/cm², y veredas de 1.80m de ancho a cada lado, de la calzada con concreto F'c=175 Kg/cm².

5) COSTO TOTAL DEL PROYECTO: S/. 1'128,422.56

6) META FISICA 2016-2017: Programada: 100.00% Ejecutada: 100.00% Avance (%):100.00

7) PRESUPUESTO 2016-2017: Programada: S/.980,393.00 Ejecutada: S/.892,157.63 Avance (%): 91.00

8) AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%) : 91.00

9) AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA(S/.): 892,157.63 (%): 91.00

10) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas.

Se beneficiará a un total de 9984 beneficiarios, visitantes del Santuario Histórico de Chacamarca.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Se han culminado la ejecución de lo trabajos de mejoramiento de la vía, se realizó la colocación de la carpetas asfáltica y se culminó con las obras de concreto.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.


SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510
TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE
CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE
JUNIN - JUNIN - II ETAPA".

2) **ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL:** NO ☐
SI ☐.....

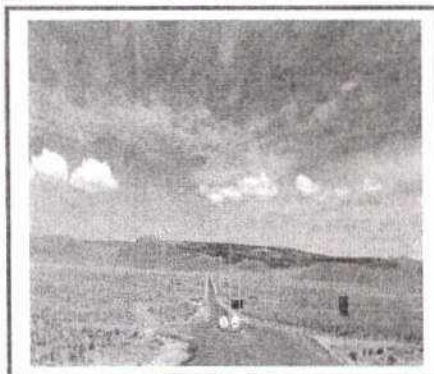

3) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: JUNIN.

DISTRITO: JUNIN.

LOCALIDAD: CHACAMARCA

4) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

SE VIENE REALIZANDO LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE ARTE LAS CUALES SON SARDINELES Y CUNETAS DE LA PAVIMENTACION QUE COMPRENDE 1+520 KM DE PAVIEMNTO, SARDINEL Y CUNETAS POR CADA LADO, ASI MISMO VEREDAS EN UN TRAMO DE 80 ML, UN DRENAJE PLUVIAL Y TRATAMIENTO DEL OVALO DE INGRESO

5) **COSTO TOTAL DEL PROYECTO:** S/.1,688,126.36 nuevos soles

6) **META FISICA 2017:** PROGRAMADA: S/.1,688,126.36 EJECUTADA: S/. 623,825.01
AVANCE 39.00%

7) **PRESUPUESTO 2017:** PROGRAMADA: S/.1,688,126.36 EJECUTADA: S/.
623,825.01 AVANCE 39.00%

8) **AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%)** 77.82%

9) **AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA:** 39.00%

10) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS** Max 02 líneas.

SGCTP.



Beneficiarios.- El ámbito de influencia del Proyecto beneficiará a centros poblados entre, caseríos y centros poblados dentro de los 2.5 km en cada margen del eje de la vía propuesta en la alternativa más conveniente.

Beneficios esperados.- Contando con esta pavimentación se espera brindar una mejora para la población de los centros poblados de la localidad.

II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
A la fecha se viene culminando con los trabajos de obras de arte, como sardinel y cunetas de la obra MEJORAMIENTO DE LA VIA VECINAL JU - 510 TRAMO: EMPALME PE-3N - OBELISCO DE CHACAMARCA, DISTRITO JUNIN, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN - II ETAPA.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☐ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS BARRIOS DE MIRADOR SAN MIGUEL , FORTALEZA , VILLA RETAMA , DISTRITO DE CHILCA – HUANCAYO – JUNÍN"



2) **LOCALIZACIÓN:**

PROVINCIA: Huancayo.

DISTRITO: Chilca.

LOCALIDAD: Barrios de Mirador San Miguel, Fortaleza y Villa Retama – Chilca.

3) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Se instaló una red colectora en una longitud de 4,833.93 metros lineales .4,176 metros con tubería PVC UF S- 25 de 8" y 661 metros con tuberías de PVC UF S-25 de 10". Excavación de zanjas 7,391.40 m3 con maquinarias. Construcción de 102 buzones colectores de concreto f'c= 175 kg/cm2. Instalación de 323 conexiones domiciliarias con tuberías PVC UF S-25 de 6". La entrega de acuerdo al certificado de factibilidad de SEDAM-HYO , es en la calle Real y Pueblo Unido.

Se ejecutó 2 expedientes de adicionales de obra

4) **META FÍSICA:**

Programada según Expediente Técnico S/. 1'175,357.56

Adicional de obra N° 01 – S/. 193,322.23

Adicional de obra N° 02 – S/. 92,935.41

Mayores metrados _ S/. 36,263.23

5) **PRESUPUESTO:**

Programada PIM S/. 1'175,357.56

Avance : 100%

6) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS**

Se beneficiará a un total de 1,850 pobladores de la zona.



II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Mejorar las condiciones de vida de los pobladores que en su mayoría son de extrema pobreza y desplazados de la Región Huancavelica.
Disminuir las enfermedades infecto contagiosas, ya que a falta de desagüe sanitario las excretas se evacúan por las calles y pasajes.

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

2) "AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL A.A.H.H. JUSTICIA PAZ Y VIDA, DISTRITO EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO" - II ETAPA COMPONENTE AGUA POTABLE.

3) **LOCALIZACIÓN:**

REGION: Junín

PROVINCIA: Huancayo

DISTRITO: El Tambo

LOCALIDAD: A.A.H.H Justicia Paz y Vida



4) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Consiste en la renovación de la red matriz de tubería del sistema de agua potable en una longitud de 12,644.38 ml, en los 13 sectores de A.A.H.H Justicia Paz y Vida con tubería de 3", 4" y 6" así mismo el suministro e instalación de accesorios, Válvulas Compuertas de F°F° e Hidrantes.

5) **META FÍSICA:**

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 320,273.93

Presupuesto asignado: S/. 1, 882,418.00

Ejecutado a julio: S/. 2, 000,535.90

Avance (%): 93.23 %

6) **PRESUPUESTO:**

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 320,273.93

Presupuesto asignado: S/. 1, 882,418.00

Ejecutada (Devengado al 23/08/2017): S/. 786,925.68

Avance (%): 41.80 %

7) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS** Max 02 líneas.

Se beneficiará a 6,593 habitantes del A.A. H.H Justicia Paz y Vida



II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

<p>Dotación del servicio de agua potable en los 13 sectores de A.A.H.H justicia Paz y Vida, con su respectiva compactación, del mismo modo se realizó la instalación de válvulas, los empalmes respectivos, la colocación de hidrantes, reinstalación de las conexiones domiciliarias de las redes de alcantarillo sanitario y pluvial donde fueron afectados por la excavación y la eliminación del material excedente.</p>
--

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.


I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:

"MEJORAMIENTO INTEGRAL Y TRATAMIENTO PAISAJÍSTICO DE LA AV. REAL TRAMO JR. PEDRO PERALTA TÚPAC AMARU DISTRITO DE CHILCA - JUNÍN" II ETAPA"

2) LOCALIZACIÓN:

REGION: Junín
PROVINCIA: Huancayo.
DISTRITO: Chilca.
LOCALIDAD: Azapampa.

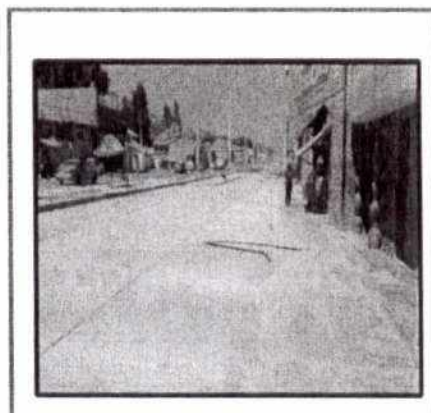

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD. Max. 05 líneas

Mejoramiento de la superficie de rodadura, con Pavimento Rígido $f'c=210 \text{ Kg/cm}^2$ de espesor de 0.20 m, en un ancho de vía de 7.60 m y estacionamiento de 2.40 m Teniendo en cuenta el mejoramiento de la sub base con un espesor de 0.20 m y un mejoramiento de terreno de 0.30 m en una longitud de 700 m de superficie de rodadura respectivamente. Construcción de cunetas, veredas, tratamiento de áreas verdes y Señalización horizontal y vertical.

4) META FÍSICA:

Programada (Según Expediente Técnico): S/. 2, 840,630.20
Ejecutada: S/. 2, 597,188.20
Avance (%): 91.43 %

5) PRESUPUESTO:

Programada: S/. 2, 840,630.20
Ejecutada (Devengado al 24/08/2017): S/. 1 683,176.41
Avance (%): 59.25%

6) NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS Max 02 líneas.

Se beneficiara a un total de 6439 pobladores del Distrito de Chilca y toda la población de la zona sur del distrito de Chilca.



II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
<p>Mejorar las condiciones actuales de la vía, es decir mejorar las condiciones de transitabilidad de la vía.</p> <p>Incrementar la producción y la productividad de las áreas de comercio y gastronomía de la zona del distrito de Chilca.</p> <p>Contribuir al desarrollo urbano, económico y social.</p> <p>En conclusión Mejorar la calidad de vida de los pobladores de la zona</p>

FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA II AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA (GERENCIA, SUB GERENCIA, UGEL, UTES, AGENCIAS AGRARIAS, DIRECCIONES REGIONALES, ETC.) SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA
Av. CENTENARIO, Av. QUILCAS TRAMO:
CARRETERA CENTRAL CALLE UNION
JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE SAN
JERONIMO DE TUNAN Y QUILCAS DE LA
PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO
DE JUNIN" II ETAPA



LOCALIZACIÓN:

PROVINCIA: Huancayo.
DISTRITO: Quilcas
LOCALIDAD: Quilcas

2) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Pavimento rígido de $f'c = 210 \text{ kg/cm}^2$, en un área de 8000 m², aceras peatonales 3200 m², canal de rebose de riego en una longitud de 640 ml, áreas de jardinería, construcción de muro de contención, ejecución de alcantarillas pluviales.

3) **META FÍSICA:**

Programada según Expediente Técnico S/. 2'150,250.02
Ejecutada: S/. 1'204,140.01
Avance (%) 52 %

4) **PRESUPUESTO:**

Programada PIM 2017 S/. 2'383,000.00
Devengado al 24/08/2017: s/. 1'204,140.01
Avance (%) 52 %

5) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS** Max 02 líneas.

PROPIETARIOS NETOS DE LA ZONA = 3, 000 habitantes
TURISTAS VISITANTES A LA ZONA= 15, 0000 habitantes aprox.



II. RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

Con la pavimentación de las vías mencionadas se logra mantener un ingreso fluido a los visitantes del distrito de Quilcas, Casacancha e Ingenio logrando complementar de esta forma el atractivo turístico e ingreso al circuito Catalina Huanca y a la vez contribuir al desarrollo propio de los residentes



FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA I AUDIENCIA PÚBLICA REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017

(Debe considerar un formato por cada actividad y/o por cada proyecto. Esta información deberá enviarse en físico y digital CD)

UNIDAD ORGÁNICA SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. **TIPO:** PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐


1) **NOMBRE DE LA ACTIVIDAD:**

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN"

2) **ES UN PROGRAMA PRESUPUESTAL:** SI ☐ NO ☐

3) **LOCALIZACION:**

REGION: Junín
PROVINCIA: Huancayo.
DISTRITO: Sicaya.
LOCALIDAD: Av. Rodrigo Ruiz

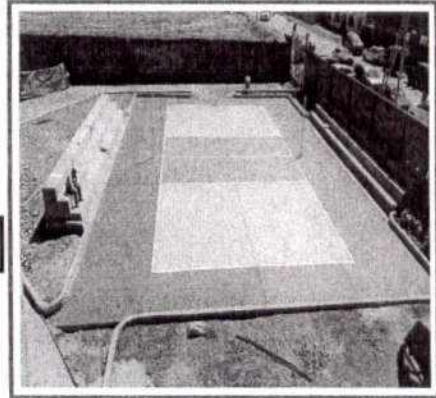

4) **BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD.** Max. 05 líneas

Construcción de una losa de fútbol de grass sintético, con techo de cobertura de calamina, mejoramiento de la losa de basketball y de la losa de volleyball.; construcción de las zonas de área administrativa, espera, oficina administrativa, secretaria, dirección, archivo, zona de oficinas de informes, área de descanso, zona de aeróbicos, zona de stands, zona de depósito, zona de comidas, con piso de cemento pulido, zona de servicios higiénicos, zona de recreación infantil.

5) **COSTO TOTAL DEL PROYECTO:** S/. 2 024,971.51

6) **META FISICA 2017:** Programada: 100.00% Ejecutada: 40.38 % Avance (%): 40.38

7) **PRESUPUESTO 2017:** Programada: S/. 2 024,971.51 Ejecutada: S/. 812,441.48 Avance (%): 40.38

8) **AVANCE FISICO ACUMULADO TOTAL A LA FECHA (%) :** 40.38

9) **AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO TOTAL A LA FECHA(S/.):** 812,441.48 (%): 40.38

10) **NÚMERO Y TIPO BENEFICIARIOS** Max 02 líneas.

Se beneficiará a un total de 6,096 pobladores del Distrito de Sicaya.

II. **RESUMEN DE LOS LOGROS OBTENIDOS:**

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS
ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEPORTIVOS EN EL COMPLEJO MULTIDEPORTIVO RODRIGO RUIZ DE LA CIUDAD DE SICAYA, DISTRITO SICAYA, HUANCAYO-JUNÍN.

SGCTP.



**FORMATO DE INFORMACIÓN PARA LA AUDIENCIA PÚBLICA
REGIONAL DE RENDICION DE CUENTAS 2017**

UNIDAD ORGÁNICA: SUB GERENCIA DE OBRAS DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN.

I. TIPO: PROYECTO: ☒ ACTIVIDAD: ☐

1) NOMBRE :

"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LA UGEL
HUANCAYO, HUANCAYO - JUNIN"

2) LOCALIZACIÓN:

REGION: Junin

PROVINCIA: Huancaayo

DISTRITO: El Tambo

LOCALIDAD: URB. CESAR VALLEJO (CIVICENTRO)

3) BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO O ACTIVIDAD Max 05 líneas

1. *Sejarah, Perkembangan, dan Fungsi Organisasi Administrasi*
 2. *Teori Organisasi*
 3. *Struktur Organisasi*
 4. *Manajemen Sumber Daya Manusia*
 5. *Manajemen Keuangan*
 6. *Manajemen Marketing*
 7. *Manajemen Produksi*
 8. *Manajemen Operasi*
 9. *Manajemen Teknologi*
 10. *Manajemen Lingkungan*
 11. *Manajemen Hukum*
 12. *Manajemen Komunikasi*
 13. *Manajemen Perilaku*
 14. *Manajemen Sistem*
 15. *Manajemen Perubahan*
 16. *Manajemen Risiko*
 17. *Manajemen Kualitas*
 18. *Manajemen Inovasi*
 19. *Manajemen Keberlanjutan*
 20. *Manajemen Global*

4) META Y PRESUPUESTO

META	PROGRAMADA	EJECUTADA	AVANCE (%)
FISICA	S/. 4'099,248.88	S/. 1'651,866.02	40.30 %
PRESUPUESTO	S/. 4'098,248.88	S/. 3'328,531.79	81.20 %

5) NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS

Beneficiarios. - Son beneficiarios directos del proyecto los 9,986 usuarios de los servicios de atención administrativo que presta la UGEL Huancayo. Estas son básicamente docentes, alumnos y padres de familia de las instituciones educativas de la provincia de Huancayo

Beneficios esperados.- El propósito de esta investigación es evaluar el efecto de la implementación de la metodología de la resolución de problemas en el aprendizaje de la matemática en los estudiantes de la Institución Educativa “El Valle de la Esperanza” de la ciudad de Bogotá, D.C., en el año 2017.





6) PRODUCTO O RESULTADO OBTENIDO

Bienestar para los pobladores de la zona, así como transitabilidad en todo momento y disminución del peligro ante el delito.

II. RESUMEN DE LOGROS OBTENIDOS

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS LOGROS OBTENIDOS

- A la fecha se culminó la componente de estructuras en su totalidad se culminó con la partida de tarrajeo en interiores como exteriores, se viene realizando el movimiento de tierra para el área de estacionamiento además se viene culminado con la pintura en exteriores como interiores, además se tiene comprometido los servicios de instalación de vidrios templados de 8mm para fachada, instalación eléctrica a todo costo incluido la sub estación, mano de obra para la instalación del porcelanato, instalación de grifería y accesorios para la instalación sanitaria, como la instalación de mamparas pasamanos y barandas y puertas de batientes, instalación del ascensor; siendo todos estos servicios por terceros, para la culminación de la obra
- Se aprobó un adicional MODIFICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO POR MAYORES METRADOS Y PARTIDAS NUEVAS N° 01 Y DEDUCTIVOS N°01 DE LA OBRA "CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE UGEL HUANCAYO – HUANCAYO – JUNIN", RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N°175-2017-GR-JUNIN//GRI, De Fecha Huancayo 25 de Abril del 2017 por un monto de S/. 852,997.97 NUEVOS SOLES.
