




Gobierno Regional Junín



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



## RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Nº 073 -2021-G.R.-JUNÍN/GRI

Huancayo, 24 MAR 2021

### EL GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

#### VISTO:

El Informe Técnico N° 57-2021-GRJ/GRI, de fecha 08 de marzo del 2021; el Informe Técnico N° 152-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de marzo del 2021; el Informe N° 008-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO/CAPR-SHAURIATO, de fecha 24 de febrero del 2021; el Informe Técnico N° 44-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 22 de febrero del 2021; copia del cuaderno de obra; la Memoria Descriptiva referente a la ampliación de plazo N° 02; el listado de precipitaciones SENAMHI del mes de diciembre del 2020; paneles fotográficos de la obra; el Informe Legal N° 81- 2021-GRJ/ORAJ, de fecha 10 de marzo del 2021.

#### CONSIDERANDO:

Que, estando al artículo 191 de la Constitución Política del Estado el cual declara: *"Los gobiernos regionales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. Coordinan con las municipalidades sin interferir sus funciones y atribuciones"*, asimismo el artículo 192 de la Constitución Política antes mencionada declara que *"Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía regional, fomentan las inversiones, actividades y servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de desarrollo"*; por otro lado, el apartado d) del artículo 35 de la Ley de Bases de la Descentralización - Ley N° 27783, por el que declara: *"Promover y ejecutar las inversiones públicas de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energética, de comunicaciones y de servicios básicos de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades."*; asimismo, el artículo 4 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales - Ley N° 27867, declara que: *"Los gobiernos regionales tienen por finalidad esencial fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes, de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo"*, advirtiendo de lo precedentemente descrito que los Gobiernos Regionales gozan de autonomía, promueven y fomentan el desarrollo sostenible de su sus





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



habitantes dentro de su jurisdicción promoviendo la inversión pública y privada en iguales oportunidades;

Que, con fecha 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha calificado el brote de la COVID-19 como una pandemia al haberse extendido en más de cien países del mundo de manera simultánea. Asimismo, dicha Organización ha informado que la variante del SARS-CoV-2 de Reino Unido se ha detectado en otros 40 países, territorios y áreas en cinco de las seis regiones de la OMS, siendo que, con fecha 08 de enero de 2021, se ha confirmado la identificación de dicha nueva variante del virus en el Perú. Respecto a la variante P.1 de la COVID-19 (Variante Brasileira), con fecha 04 de febrero, el Instituto Nacional de Salud informó que dicha variante se ha identificado en los departamentos de Loreto, Huánuco y Lima;



Que, mediante Decreto Supremo N° 008-2020-SA, se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el plazo de noventa (90) días calendario y se dictaron medidas para la prevención y control para evitar la propagación del COVID-19, la misma que fue prorrogada por los Decretos Supremos N° 020-2020-SA, N° 027-2020-SA, N° 031-2020-SA y N° 009-2021-SA, hasta el 02 de setiembre de 2021;

Que, mediante Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, se declara prorrogar el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM y Decreto Supremo N° 008-2021-PCM, por el plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del lunes 01 de marzo de 2021, por las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19;

Que, mediante Resolución Gerencial Regional de Infraestructura N° 181-2020-G.R.-JUNIN/GRI, mediante el cual se resolvió aprobar la modificación del Expediente Técnico de saldo e implementación del plan Covid del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNÍN", con Código Único de Inversiones N° 2160390, por la modalidad ADMINISTRACION DIRECTA, con un plazo de ejecución de 90 días calendarios



Que, mediante el Informe Técnico N° 44-2021-GRJ/GRI/SGO, de fecha 22 de febrero del 2021, suscrito por el Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, en su calidad de Sub Gerente de Obras, mediante el cual solicitó la aprobación de la ampliación del plazo N° 02, por el plazo de 20 días calendarios, considerando la falta de habilitación presupuestal, por el cual el personal habría dejado de laborar y por las constantes lluvias que han afectado en la zona geográfica donde se viene ejecutando el referido proyecto;





Que, mediante el Informe N° 008-2021-GRJ/GRI/SGSLO/IO/CAPR-SHAURIATO, de fecha 24 de febrero del 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Inspector de Obra, mediante el cual concluye dando la conformidad a la solicitud de ampliación del plazo N° 02, por el plazo de 13 días calendarios, quien consideró solo las causales de las lluvias, que habrían afectado la obra, y no las causales de falta de habilitación presupuestal, dado que éste último no se encuentra regulado como causal de ampliación de plazo en la Directiva N° 005-2009-CR-JUNIN;

Que, por otro lado, del Informe Técnico N° 152-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de marzo del 2021, suscrito por el Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael, en su calidad de Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Obras, mediante el cual opina favorablemente a la ampliación de plazo N° 02, por el plazo de 13 días calendarios, quien consideró solo las causales de las lluvias constantes que han afectado la ejecución de la obra y no la falta de asignación presupuestal para el personal;

Que, por otro lado, del Informe Técnico N° 57-2021-GRJ/GRI, de fecha 08 de marzo del 2021, suscrito por el Ing. Luis Ángel Ruiz Ore, en su calidad de Gerente Regional de Infraestructura, se advierte objetivamente lo siguiente:

#### 4 ANALISIS

##### A. DE LA SOLICITUD PRESENTADA POR EL RESIDENTE DE OBRA

###### a) CAUSAL INVOCADA

- **Informes Sustenta torios de Ampliación de Plazo.** – El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente, las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:

Por atrasos o Paralizaciones Ajenos A La Voluntad Del Ejecutor.

###### b) AMPLIACION DE PLAZO

El Sub Residente de Obras solicita la Ampliación de Plazo N° 02 por **(20) días calendarios**, por la causal con la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS- 6.5 PRESENTACION DE INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.- otros informes eventuales, Informes Sustenta por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor (Efectos Causados Por Lluvias)

REINICIO DE OBRA	TÉRMINO DE OBRA	AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02	RESUMEN AMPLIACION DE PLAZO
10 de febrero de 2021.	25 de febrero de 2021	➤ Causal 01 (07 días calendario).	Del 26 de febrero de 2021 al 17 de marzo de 2021.



Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



- Causal 02 (13 días calendario).

TOTAL

20 DÍAS CALENDARIOS

### c) TIPIFICACION DE LA CAUSAL

Se solicita la Ampliación de Plazo N°02 por 20 días calendarios en conformidad con la **DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNÍN. - VI. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS. - 6.5. PRESENTACIÓN DE INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRA. - 6.5.4. Otros Informes Eventuales. -**

- **Informes Sustentatorios de Ampliación de Plazo.** – El plazo pactado sólo podrá ser prorrogado cuando se justifique documentadamente, las causales y estas modifiquen la ruta crítica del calendario valorizado de avance de obra y PERT-CPM, las causales son:  
... (...)

**Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor (falta de habilitación presupuestal).**

*"Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable)."*

Durante el desarrollo de los trabajos en obra, existieron diversos factores que alteraron el cronograma de ejecución de partidas programadas, entre ellas por factores climáticos (fuertes lluvias), a continuación, se detallan los días con mayor precipitación y las consecuencias ocurridas en obra.

### d) FORMALIDAD DE LA SOLICITUD

El Residente de Obras mediante INFORME TECNICO N° 44-2021-GRJ/GRI/SGO, solicita la aprobación de la AMPLIACION DE PLAZO N° 02, de acuerdo a la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN. Adjunta copia de cuaderno de obra de los asientos:

- Asiento N°12 de Fecha 27-10-2020
- Asiento N°17 de Fecha 30-10-2020
- Asiento N°36 de Fecha 14-11-2020
- Asiento N°40 de Fecha 18-11-2020
- Asiento N°45 de Fecha 21-11-2020
- Asiento N°52 de Fecha 27-11-2020
- Asiento N°60 de Fecha 03-12-2020
- Asiento N°62 de Fecha 04-12-2020
- Asiento N°64 de Fecha 07-12-2020
- Asiento N°69 de Fecha 10-12-2020
- Asiento N°75 de Fecha 16-12-2020
- Asiento N°78 de Fecha 18-12-2020
- Asiento N°81 de Fecha 22-12-2020
- Asiento N°85 de Fecha 26-12-2020
- Asiento N°89 de Fecha 30-12-2020

### e) DE LA DOCUMENTACION PRESENTADA





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



El Residente de Obras mediante INFORME N° 44-2021-GRJ/GRI/SGO, el 22 de febrero de 2021, en el cual el residente de obra sustenta su solicitud en los siguientes considerandos:

- Copias de los asientos del cuaderno de Obra, donde se evidencie el origen, ocurrencia y término de la causal de ampliación de plazo.
- Diagrama Gantt.
- Memoria Descriptiva de las causales de la ampliación de plazo.
- Justificación técnica y legal.
- Otros documentos.
- Panel fotográfico.

## B. DE LA APROBACION DEL INSPECTOR DE OBRA

### ✓ JUSTIFICACIÓN:

#### CAUSAL 01 - SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

##### ○ **POR ATRASOS O PARALIZACIONES AJENOS A LA VOLUNTAD DEL EJECUTOR – FALTA DE HABILITACION PRESUPUESTAL**

La falta de presupuesto para la ejecución de LAS PARTIDAS DE EQUIPAMIENTO CON MOVILIARIO, impide continuar con el desarrollo de partidas comprendidas en el expediente técnico. Se comunicó a la supervisión de la falta de presupuesto y la solicitud de Habilitación Presupuestal, mediante cuaderno de obra Asiento N°86 (del residente de obra)

#### CAUSAL 02 - SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO

##### **POR ATRASOS O PARALIZACIONES AJENOS A LA VOLUNTAD DEL EJECUTOR – EFECTOS CAUSADOS POR LLUVIAS.**

*"Las lluvias normales de la zona no son causales de ampliación de plazo, pero si las consecuencias de éstas, si es que deterioraron el trabajo ejecutado y/o no permiten el normal desarrollo de la obra, lo cual debe estar debidamente sustentado (incluyendo documentos de la entidad responsable)."*

Durante el desarrollo de los trabajos en obra, existieron diversos factores que alteraron el cronograma de ejecución de partidas programadas, entre ellas por factores climáticos (fuertes lluvias),

### ✓ DEL REINICIO DE OBRA

Con fecha de 10 de febrero de 2021, mediante **ACTA DE REINICIO**, suscrita por el residente de obra encargado, Ing. Jorge Luis Crisóstomo Campos, y el Inspector de Obra encargado Ing. Carlos Alberto Pérez Rafael. Ya que a la fecha ya las causas de paralización de obra se han subsanado y/o cesado. Ya que se cuenta con HABILITACION PRESUPUESTAL DE S/. 193,008.00 SOLES, con lo cual se cuenta con el presupuesto para continuar con los trabajos restantes en la





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



ejecución para la culminación del proyecto, permitiendo continuar con los trabajos proyectados para la obra de referencia.

✓ **SUSTENTO DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N°02:**

**CAUSAL 01:**

- Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor – falta de habilitación presupuestal, la presente causal generó la paralización de obra, la misma que ocasionó una primera Ampliación de Plazo, aprobado por esta Inspección. Es así que estas partidas de equipamiento por 7 días ya están consideradas en el Cronograma de reinicio de obra para la primera ampliación de plazo y no procede como causal para una segunda ampliación de plazo, por duplicidad en los plazos de ejecución. **NO PROCEDE.**

**CAUSAL 02:**

- Por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor – efectos causados por lluvias, la presente causal se generó a partir de las consecuencias que ocasionaron las lluvias en el proceso constructivo de la ejecución de la obra, afectando la ruta crítica y en consecuencia retrasos y variaciones en los rendimientos diarios, todos estos justificados conforme a la Directiva N° 005-2009-GR.-JUNIN. Total de 13 días. **SI PROCEDE.**

✓ **DE LAS CONCLUSIONES:**

Conforme a los actuados descrito líneas arriba, así como el INFORME TÉCNICO N°44-2021-GRJ/GRI/SGO presentado por el Residente de Obra, en cumplimiento a la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, esta Inspección da CONFORMIDAD para continuar con la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 para su FORMALIZACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO, por un plazo de 13 días calendarios el mismo que corresponde del 26 de febrero del 2021 al 10 de marzo del 2021.

**C. DEL PRONUNCIAMIENTO DE LA SUB GERENCIA DE SUPERVISIÓN:**

El INFORME TÉCNICO N° 152 -2021-GRJ/GRI/SGSLO de fecha 05 de marzo del 2021, de la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras suscrito por el Ing. Carlos A. Pérez Rafael, concluye lo siguiente:

...(...)

*"Visto y revisado los informes emitidos por el Residente e Inspector de Obra, se ha evidenciado que se ha cumplido con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNIN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, por consiguiente esta Sub Gerencia posterior a la revisión y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y aprobado por la Inspección de Obras **APRUEBA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por (13) días calendarios, los cuales serán contabilizados desde 26 de febrero de 2021 hasta 10 de marzo de 2021"***

**D. DEL PRONUNCIAMIENTO DE ESTA GERENCIA:**

**DEL PLAZO SOLICITADO POR LA RESIDENCIA DE OBRA:**







Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



El Sub Residente de Obras solicita la Ampliación de Plazo N° 02 por **(20) días calendarios**, por la causal con la DIRECTIVA N° 005-2009-GR-JUNIN, VI DISPOSICIONES ESPECIFICAS- 6.5 PRESENTACION DE INFORMES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA.- otros informes eventuales, Informes Sustenta por atrasos o paralizaciones ajenos a la voluntad del ejecutor (Efectos Causados Por Lluvias)

REINICIO DE OBRA	TÉRMINO DE OBRA	AMPLIACION DE PLAZO N° 02	RESUMEN AMPLIACION DE PLAZO
10 de febrero de 2021.	25 de febrero de 2021	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Causal 01 (07 días calendario).</li><li>➤ Causal 02 (13 días calendario).</li></ul>	Del 26 de febrero de 2021 al 17 de marzo de 2021.
TOTAL			<b>20 DÍAS CALENDARIOS</b>

#### DEL PLAZO OTORGADO POR LA INSPECCION

La Inspección de Obra conforme a los actuados descrito líneas arriba, así como el INFORME TÉCNICO N°44-2021-GRJ/GRI/SGO presentado por el Residente de Obra, en cumplimiento a la DIRECTIVA N°005-2009-GR-JUNIN, esta Inspección da CONFORMIDAD para continuar con la solicitud de AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02 para su FORMALIZACIÓN VÍA ACTO RESOLUTIVO, por un plazo de 13 días calendarios el mismo que corresponde del 26 de febrero del 2021 al 10 de marzo del 2021.

#### DE LA EVALUACIÓN DE ESTA GERENCIA:


Visto y revisado los informes emitidos por el Residente, Inspector de Obra y la Sub Gerencia de Supervisión de Obras, se ha evidenciado que se ha cumplido con lo establecido en la DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNIN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, por consiguiente esta Gerencia posterior a la revisión y evaluación de lo solicitado por la Sub Gerencia de Obras y aprobado por la Inspección de Obras, se opina **PROCEDENTE TECNICAMENTE** la **SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 02 por 13 días calendarios**, los cuales serán contabilizados desde **26 de febrero de 2021 hasta 10 de marzo de 2021**, así como se detalla a continuación:





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

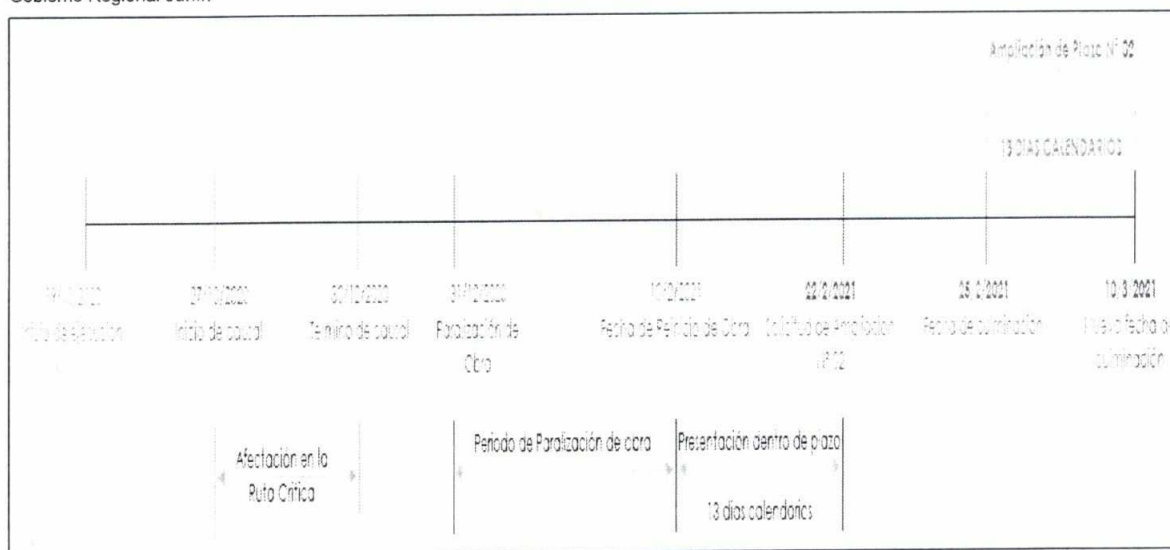

## 5 CONCLUSIONES

En merito a lo expuesto en el **INFORME TÉCNICO N° 152 -2021-GRJ/GRI/SGSLO**, presentado por la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras (área técnica especializada), esta **GERENCIA** concluye **PROCEDENTE TECNICAMENTE**, la solicitud de **AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02** de la obra: "**MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN**"- **SALDO DE OBRA**, por **13 días calendario**, el cual se contabilizará desde el 26 de febrero del 2021 hasta 10 de marzo de 2021.

Visto y revisado los informes emitidos por el Residente, Inspector de Obra y la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, se ha evidenciado que se ha cumplido con lo establecido en la **DIRECTIVA N° 005 - 2009 - GR - JUNIN - NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS POR EJECUCION PRESUPUESTARIA DIRECTA EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**.

Que, de lo expuesto precedentemente se advierte que se analizó técnicamente la ampliación de plazo y como resultado se tiene que efectivamente la falta de presupuesto para el pago del personal que viene laborando en el proyecto no se encuentra regulado en la Directiva N° 05-2009-GR-JUNIN, el cual regula el procedimiento para la ejecución de obras públicas mediante la modalidad de administración directa, y que respecto a las lluvias constantes en la zona geográfica donde se encuentra el proyecto, ésta última si se encuentra regulada, y ello se puede corroborar con los datos de SENAMHI, obrante a fojas 18 al 20, del expediente administrativo. Asimismo, de las copias del cuaderno de obra se advierte que efectivamente hubo días en que las fuertes lluvias han perjudicado la obra, como es de verse del asiento N° 12, 17 y 18 del cuaderno de obra,





Gobierno Regional Junín

"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"



donde refiere que las fuertes lluvias han ocasionado inundaciones en las excavaciones de las zanjas y que ello ha requerido su limpieza;

Que, estando en uso de las facultades y atribuciones conferidas por la Resolución Ejecutiva Regional N° 065-2021-GR-JUNÍN/GR, de fecha 19 de marzo del 2021, por el que se delega facultades al Gerente Regional de Infraestructura de aprobar las ampliaciones de plazo para la ejecución presupuestaria directa, y contando con la visación de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y las áreas competentes;

### SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO.- PROCEDENTE** la solicitud de ampliación del plazo N° 02, solicitado por el Inspector de Obra, y aprobado mediante Informe Técnico N° 152-2021-GRJ/GRI/SGSLO, de fecha 05 de marzo del 2021, y por el Informe Técnico N° 57-2021-GRJ/GRI, de fecha 08 de marzo del 2021, referente a la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA I.E. 1033 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SHAURIATO DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO, JUNIN"- SALDO DE OBRA", por 13 días calendarios, el cual se contabilizará desde el 26 de febrero del 2021 hasta el 10 de marzo del 2021.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR**, la presente Resolución al Inspector de Obra, Residente de Obra, Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras, Gerencia Regional de Infraestructura, y a los órganos competentes del Gobierno Regional Junín, para su conocimiento y fines respectivos.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.**

  
Ing. LUIS ANGEL RUIZ ORE  
Gerente Regional de Infraestructura  
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN  
Lo que transcribe a Ud para su  
conocimiento y fines pertinentes

HYO. 25 MAR. 2021

  
Abog. Helen S. Díaz Herrera  
SECRETARÍA GENERAL
